

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Septiembre 08 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos

18 de obra

Ejecución

18

% en Perfeccionamiento ejecución

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones



Total de contratos

13 de obra

Ejecución

13

% en Perfeccionamiento ejecución

100%

4 de interventoría

4

100%

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



*De las 18 obras, 10 van por encima del porcentaje ejecutado

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
Fecha de terminación: 12 - AGO – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 24
Total Projectado: 26

Local 24
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 14

58%

No Calificados 10

42%

Calificados 0

0%

No Calificados 0

0%

35%

Avance
Financiero

63,86%

Programado

63,87%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 063 del 2019
Valor: \$ 3.841.235.901

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-261-2019
Valor: \$ 360.589.960

Nombre del Contratista:
Virgilio Bravo Sosa

Nombre de la Interventoría:
Yahara Maritza Viveros Ortiz

Supervisor UNGRD

Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Excavación para Drenes



Compactación Talud

ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
 Fecha de terminación: 14 - JUN - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 109 Total Projectado: 140	Local 83 76%	Calificados 39 47%
		No Calificados 44 53%
	Foráneo 26 24%	Calificados 19 73%
		No Calificados 7 27%

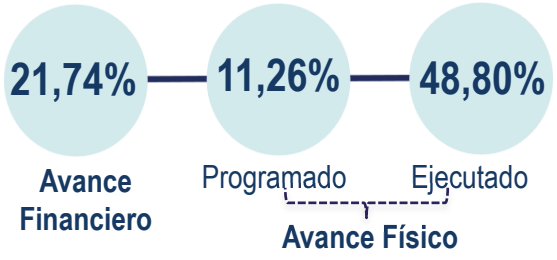

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
 Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
 Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 31 Total Projectado: 34	Local 26 84%	Calificados 17 65%
		No Calificados 9 35%
	Foráneo 5 16%	Calificados 5 100%
		No Calificados 0 0%

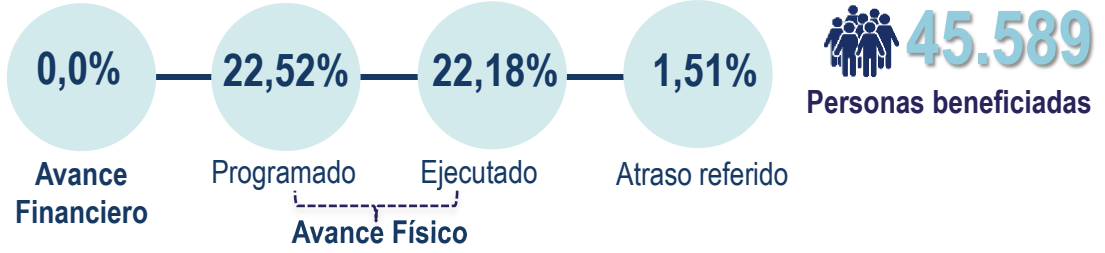

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Excavación mecánica para localización de gaviones cimentación del muro de protección 6



Construcción de gavión de cimentación para muro de protección 6

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ALCANCE

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

**PERSONAL EN
OBRA**

Total Obra: 19
Total Projectado: 22

**Local 11
58%**

**Foráneo 8
42%**

Calificados 6

55%

No Calificados 5


45%

Calificados 1

13%

No Calificados 7

87%

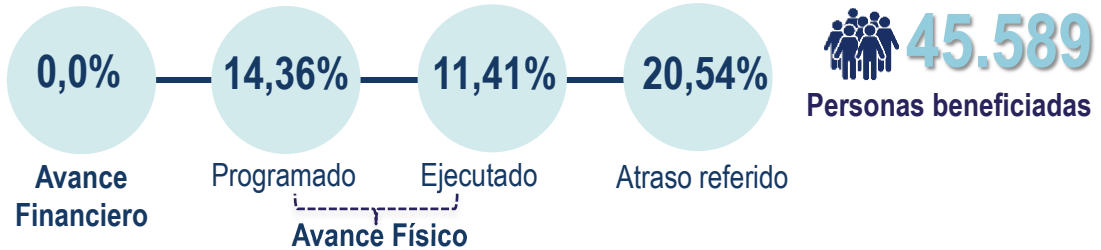

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-980-2020 Valor: \$ 5.710.699.339,98</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: HAROLD MUÑOZ MUÑOZ</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de geotextil para el muro de protección 7



Construcción de colcha gaviones para el Muro de protección 7

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26
Total Projectado: 35

Local 18
69%


Foráneo 8
31%

Calificados 14
78%

No Calificados 4
22%

Calificados 8
100%

No Calificados 0
0%

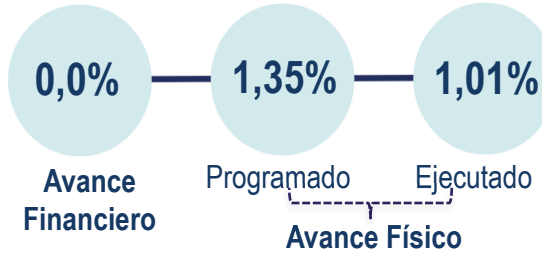

45.589
Personas beneficiadas

*Se avanza preliminares, en espera de Hidroconsulta S.A.S

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.924.254.899,43</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 564.222.640,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO MULATO.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 14
Total Projectado: 40

Local 12
86%

Foráneo 2
14%

Calificados 8
67%

No Calificados 4
33%

Calificados 2
100%

No Calificados 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

15,27%

Programado

14,80%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-988-2020
Valor: \$ 10.192.609.812,85

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-116-2021
Valor: \$ 823.179.153,00

Nombre del Contratista:
CDF INGENIERIA SAS

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERDIQUE
2020

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Dique Abierto 3
- Muro 1
- Azud 05
- Muro 2
- Azud 04
- Muro 3



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

7 CONSTRUCCIÓN DE AZUD 06, MURO 4, AZUD 07 Y MURO 5, MURO 09, AZUD 11, MURO 8 Y MURO 10, AZUD 12 Y OBRAS DE DRENAJE, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 16
Total Projectado: 45

Local 12
75%


Foráneo 4
25%

Calificados 6
50%

No Calificados 6
50%

Calificados 4
100%

No Calificados
0%

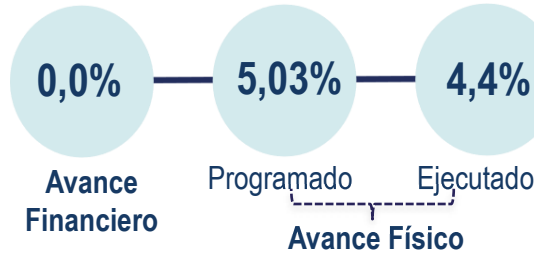

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOA</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 27
Total Projectado: 35

Local 20
74%


Foráneo 7
26%

Calificados 7
35%

No Calificados 13
65%

Calificados 5
71%

No Calificados 2
29%



45.589
Personas beneficiadas



Armado de Acero



Armado de Acero

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%

Foráneo 10
48%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 6
60%

No Calificados 4
40%

0,0%

Avance
Financiero

10,27%

Programado

19,80%

Ejecutado

Avance Físico

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 508.303.365,8033
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Formaleta módulo 3 zarpa



Vaciado de concreto módulo 3

ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5
Total Projectado: 35

Local: 3
60%


Foráneo: 2
40%

Calificados: 3
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 2
100%

No Calificados 0
0%

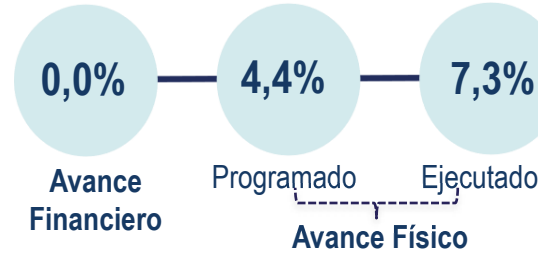

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1119-2020 Valor: \$ 5.280.966.838,95</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 426.384.755,43 (para este contrato)</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa</p>	



Inicio Excavaciones Azud 11



Labores Topografía y Ambiental en obra



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
 Total Projectado: 45

Local: 4
50%

Foráneo: 4
50%

Calificados: 4

100%

No Calificados 0


0%

Calificados : 3

75%

No Calificados 1

25%

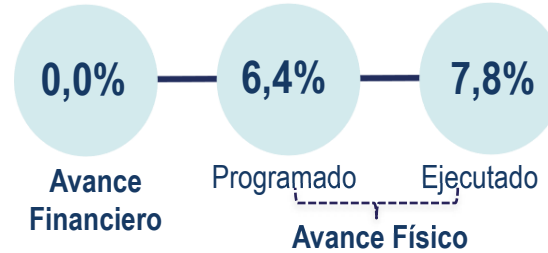

45.589
 Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato)</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa</p>	



Gaviones Anclaje Muro 06



Visitas Entes Control



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 17
Total Projectado: 61

Local 6
35%


Foráneo 11
65%

Calificados 3
50%

No Calificados 3
50%

Calificados 9
82%

No Calificados 2
18%

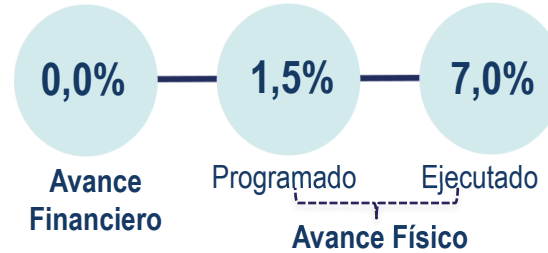

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1382-2020 Valor: \$ 24.574.127.979,39</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO DRAGADO MOCOA 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-205-2021 Valor: \$ 1.962.647.743,00</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDRAGADOS MOCOA</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021
 Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 34
 Total Projectado: 37

Local: 19
50%


Foráneo: 19
50%

Calificados: 11
58%

No Calificados 8
42%

Calificados : 18
95%

No Calificados 1
5%

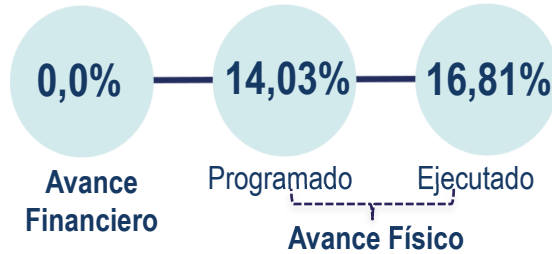

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-311-2021
 Valor: \$ 2.723.478.287,36

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-110-2021
 Valor: \$ 219.807.563,26
 (para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Excavaciones ribera izquierda

ALCANCE

- Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12

Total Projectado: 30

Local: 6
50%

Foráneo: 6
50%

Calificados: 6
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 6
100%

No Calificados 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

8,2%

Programado

5,3%

Ejecutado

35,3%

Atraso referido

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas



Orden y aseo Campamento



Capacitación Ambiental

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1330-2020
Valor: \$ 1.938.876.092,45

Nombre del Contratista:
CONSORCIO OBRAS POR
COLOMBIA

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-133-2021
Valor: \$ 157.336.269,67

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER –
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
 Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.

Estado Actual:

El proyecto a la fecha se encuentra suspendido desde el **19/07/21** hasta el **19/10/21** por modificación en el diseño, redimensionamiento de la estructura, toda vez que esto está afectando el terminal de transporte de la ciudad.

45.589
 Personas beneficiadas



Pausadas Actividades Campo por PREDIAL



Modificación a diseños por prediales

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127



EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: Pendiente por definir
Fecha acta de inicio: Pendiente por definir

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO


Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

Estado Actual:

En trámite de aprobación de pólizas por parte de Fiduprevisora.

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.027</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOCA 520</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOCA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	

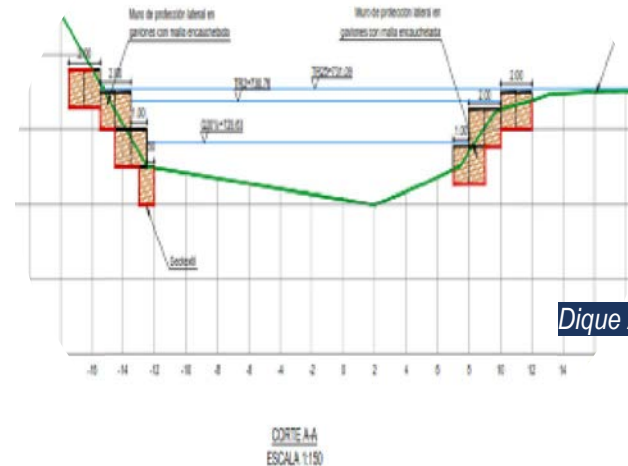

Dique Azud 03 Quebrada Taruca



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

Estado Actual:

Inventario Forestal para trámite de permiso forestal ante
 Corpoamazonia.

45.589
 Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <p>-----</p> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <p>-----</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Inventario Forestal

ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.



**El futuro
 es de todos**

Presidencia
 de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES
Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: Pendiente por definir.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Revisión de estudios y diseños por parte del contratista e interventoría, se han adelantado visitas técnicas para coordinar actividades con otros contratistas que intervienen sobre el río Sangoyaco. Pendiente perfeccionamiento de contrato de obra por parte de Fiduprevisora.

 **45.589**
Personas beneficiadas



Visita técnica río Sangoyaco



Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-183-2021
Valor: \$ 4.452.771.492,00

Nombre del Contratista:
CONSTRUVAL
INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-743-2021
Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INGENIERÍA DE
MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos



El futuro es de todos

Presidencia de la República

1.2

SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021
Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 11
Total Projectado: 26

**Local 5
45%**


**Foráneo 6
55%**

Calificados 4
80%

No Calificados 1
20%

Calificados 6
100%

No Calificados 0
0%

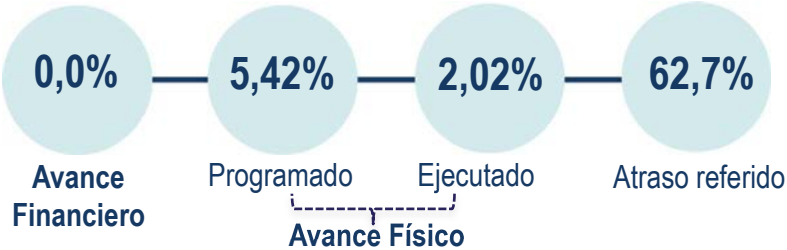

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-366-2021
Valor: \$ 8.272.681.997

Nombre del Contratista:
CONSORCIO VIAS MOCOCA 040

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-555-2021
Valor: \$ 567.850.150

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER VIAS

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.
- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.



Armado Cámara



Instalación Tubería

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES
Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 18 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA


Total Obra: 24
Total Projectado: 25

Local 22
92%

Foráneo 2
8%

Calificados 12
17%
No Calificados 10
83%

Calificados 0
0%
No Calificados 2
100%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-378-2021
Valor: \$ 1.258.851.707

Nombre del Contratista:
JAVIER GUSTAVO OSPINA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.396.558

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Excavación para instalación de tubería red sanitaria barrio El Carmen



Instalación de formaleta para cámaras barrios Prado Norte – Bajo Cañaverál

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaverál y Prado Norte.



ALCANCE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021

Fecha de terminación: 18 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

Estado Actual:
Se realizó instalación de la valla informativa en el barrio Piñayaco. Se recibió por parte de Secretaría de Tránsito la resolución de PMT el día **03/09/2021**.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de valla informativa en el barrio Piñayaco

 **45.589**
Personas beneficiadas



 **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
 - Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
 - Barrio Piñayaco Z4 – 3.
 - Barrio Piñayaco Z4 – 4.
 - Barrio Peñón Z5 – 1.
 - Barrio Peñón Z5 - 2B.
 - Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021
Fecha de terminación: 26 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 10
Total Projectado: 25

**Local 8
80%**

**Foráneo 2
20%**

Calificados 3
38%

No Calificados 5
62%

Calificados 2
100%

No Calificados 0
0%



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-407-2021 Valor: \$ 1.017.658.395</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 72.268.367</p>
<p>Nombre del Contratista: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de sub-base y toma densidades

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL - 2021
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 25

Local 12
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 8

66%

No Calificados 4


34%

Calificados 0

0%

No Calificados 0

0%

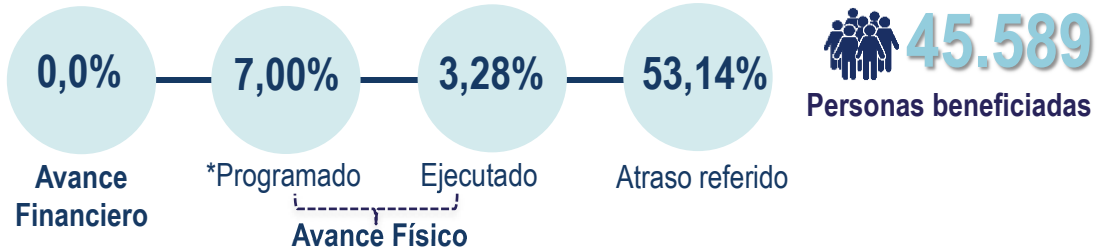

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-492-2021
Valor: \$ 2.824.604.874

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 200.587.530

Nombre del Contratista:
CONSORCIO VIAS DE MOCOA

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.



Toma de densidades en la capa de sub-base



Fundición de placas en concreto



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 18 - NOV - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25
Total Projectado: 25

Local 24
96%


Foráneo 1
4%

Calificados 7
29%

No Calificados 17
71%

Calificados 1
100%

No Calificados 0
0%



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-518-2021
Valor: \$ 1.206.210.066

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 85.658.245

Nombre del Contratista:
UNION TEMPORAL
CAIMARON

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Fundición de placas en concreto

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

ALCANCE

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 18 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas


IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 25

Local 7 83%	Calificados 3 43%
	No Calificados 4 57%
Foráneo 1 17%	Calificados 1 100%
	No Calificados 0 0%

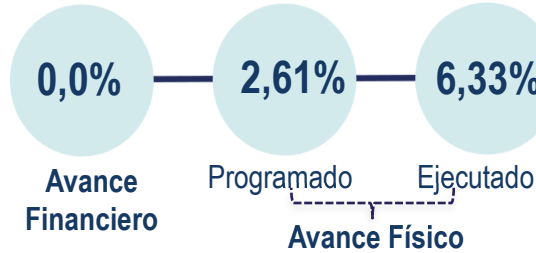

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Cajeo de vía



Toma de densidades en la capa de sub-base



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 09 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de 1 vía

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 14
Total Projectado: 25

Local 14
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 7
50%

No Calificados 7
50%

Calificados 0
0%

No Calificados 0
0%

0,0%

Avance Financiero

14,44%

Programado

18,45%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-636-2021
Valor: \$ 1.253.593.696

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.085.329

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Toma de densidades en la capa de sub-base



Fundición de placas en concreto

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 07 – MAR -2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 37

Local: 27
90%


Foráneo: 3
10%

Calificados: 15
56%

No Calificados 12
44%

Calificados: 3
100%

No Calificados 0
0%

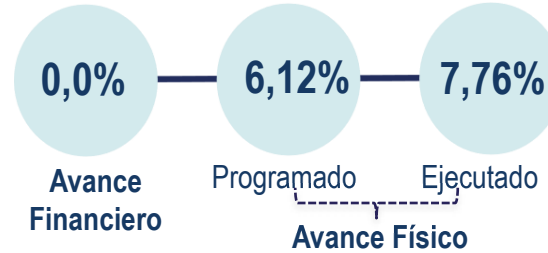

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 05 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 11

Total Projectado: 25

Local 11
100%


Foráneo 0
0%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 0
0%

No Calificados 0
0%

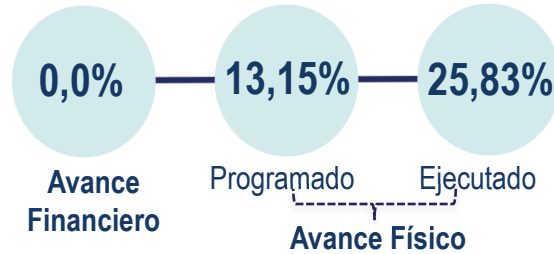

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-549-2021

Valor: \$1.830.025.649

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS
MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 130.312.324

(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza



Instalación y compactación de sub-base



ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 21 – JUL - 2021
Fecha de terminación: 20 - MAR - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Se realizan actividades preliminares correspondientes a replanteo con acompañamiento de personal de la alcaldía para determinar líneas de paramentos. Contratista solicita a empresas de servicio público información de las redes existentes en el sector a intervenir.

45.589
Personas beneficiadas



Localización y replanteo



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato)</p>
<p>Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	

ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

En la revisión de estudios, diseños y presupuesto se determina que el tramo a intervenir no cuenta con alcantarillado sanitario por lo que se adelanta la búsqueda de recursos adicionales. Se realizaron reuniones en conjunto con UNGRD – alcaldía para revisar las obras de acueducto y alcantarillado adicionales que se necesiten para poder pavimentar el sector.

 **45.589**
Personas beneficiadas



Trazado de la vía a intervenir



Sección transversal de la estructura de pavimento

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897</p>	<p>Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.435.104.449

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
Fecha acta de inicio: Modificación de pólizas



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

En trámite de aprobación cronograma de actividades por parte de interventoría

 **45.589**
Personas beneficiadas



Sector a Pavimentar Quinta
de las colinas.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 2.435.104.449</p> <p>-----</p> <p>Nombre del Contratista: MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p> <p>-----</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

Informe corte 27 de agosto de 2021

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

NO. VIVIENDAS



436

CONTRATISTA

CONSORCIO MOCOA 2019

VALOR

\$25.732 millones

*AVANCE



30,25%

AVANCE FINANCIERO



5%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%



5%

TOTAL DE
VIVIENDAS



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

Estudios y diseños 99.20%, Movimiento de tierras 154 terrazas listas. Reunión socialización plan de choque con comunidad. Continúa figuración de hierro, construcción campamento, cuadrilla mano de obra excavaciones para 24 viviendas. 1 cuadrillas de movimientos de tierras. Pagado hito 1 contrato 243 de 2018 por \$1,286 mil.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$7.049.420.065

Avance financiero

20,05%

CRONOGRAMA

FECHA DE TERMINACIÓN



DIC 2021

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



220



JUL 2022



689

PERSONAL
PROYECTADO



82

TOTAL

909

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa movimiento de tierras 31.509 m3 de tierra (incluido expansión).
- Continúa actividad de construcción de cimentación manzana T, 6 terrazas fundidos los ciclópeos, 6 terrazas con excavación.
- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal.
- Se espera para semana del 6 al 10 de septiembre llegada de formaleta, instalación de concretera, llegada de contenedores.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	6	1	7
No calificado	39	0	39
Total	45	1	46





N° DE
VIVIENDAS



87

Aportes de
FONVIVIENDA



5.764 millones

Valor otorgado por FONVIVIENDA
a través del Convenio No. 9677-
PPAL001-783-2018



AVANCES

- Se cuenta con la estructuración técnica, jurídica y financiera de las versiones del Anexo Técnico y de la justificación para las invitaciones a cotizar. Pendiente la aprobación de la implantación de las 909 unidades de vivienda.

AVANCES

VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



- **Mocoa Disperso:** Se realiza publicación en **SECOP** del proceso No. **FNGRD-LP-002-2021**, cuyo título es: **“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”**, <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>

UNGRD

Precio estimado total: 2.406.425.590,81 COP

Número del proceso FNGRD-LP-002-2021

Título: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Fase: Presentación de observaciones

Estado: Publicado

Descripción: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y SU ANEXO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO 9677 – PPAL001 – 668 – 2017, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A., Y EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública)

PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS	90 (DÍAS)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	13/08/2021
Publicación del aviso de convocatoria pública	13/08/2021
Publicación de estudios previos	13/08/2021
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	13/08/2021
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	25/08/2021
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	27/08/2021
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	30/08/2021
Audiencia de asignación de Riesgos	01/09/2021
Presentación de observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	02/09/2021
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	03/09/2021
Plazo máximo para expedir adendas	06/09/2021
Presentación de Ofertas	10/09/2021
Apertura del sobre 1	10/09/2021
Informe de presentación de Ofertas	10/09/2021
Publicación del informe de verificación o evaluación	13/09/2021
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	20/09/2021
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	22/09/2021
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	22/09/2021
Firma del Contrato	27/09/2021 10:00:00 a. m.
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	28/09/2021 6:00:00 p. m.

AVANCES

VIVIENDA RURAL NUCLEADA

N° DE VIVIENDAS



216

INVERSIÓN



Urbanismo **6.453 mill**
 Vivienda **13.500 mill**
 PTAR: **1.500 mill**
 Subestación eléctrica: **3.500 mill**
 Total: **\$ 24.953 millones**

\$ 9.516.549.300 En convenio con **Banco Agrario**

\$15.436.450.700 Recursos faltantes

- **Mocoa Nucleada:** A la fecha se cuenta con el aval técnico del **BAC** para iniciar la ejecución del proyecto de vivienda, quedando pendiente la aprobación del prototipo de acuerdo a los ajustes que realiza la consultoría a cargo de SPIA.

Adicionalmente se cuenta con la estructuración técnica del proyecto para la apertura del proceso de licitación, donde está pendiente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La UNGRD en conjunto con la alcaldía adelantó el proceso de desenglobe del predio para trasladar la propiedad individual a cada uno de los beneficiarios. De los 216 hogares postulados potenciales para el proyecto de vivienda rural nucleada en la vereda las Planadas de Mocoa, se ha tramitado la documentación del 97% de los potenciales (209 familias) para revisión y validación por parte del **Banco Agrario de Colombia**. (*) y únicamente se encuentra pendiente por parte de la **Alcaldía de Mocoa** la documentación de 7 familias (representan el 3% del total de potenciales), que corresponde a 5 familias de la comunidad Musumurrinakuna que no están de acuerdo en la firma del Formulario No. 7 y familias por 2 subsanaciones.

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018

Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018

Fecha de finalización: 01 - NOV – 2021 (Según trámite de prórroga).



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 56

Local 37

66%

Calificados 22

59%

No Calificados 15

41%

Foráneo 19

34%

Calificados 16

84%

No Calificados 3

16%

54%

Avance
Financiero

90,00%

Programado

87,00%

Ejecutado

Avance Físico



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consortio Colegio Mocoá

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

Supervisor UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo



BLOQUE PRIMARIA:

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Cubierta metálica (50%)
- Enchape de pisos (100%)
- Instalaciones sanitarias (100%)
- Instalaciones hidráulicas (100%)
- Instalaciones eléctricas (100%)
- Instalación RCI (100%)
- Carpintería metálica (100%)
- Estampado de pisos (100%)
- Instalación de ventanería (95%)



BLOQUE PREESCOLAR

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Cubierta metálica (50%)
- Enchape de pisos (100%)
- Instalaciones sanitarias (100%)
- Instalaciones hidráulicas (100%)
- Instalaciones eléctricas (5%)
- Instalación RCI (100%)
- Carpintería metálica (10%)
- Construcción muro contención (100%)



BLOQUE DE PORTERÍA

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (80%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Construcción muro contención (100%)



BLOQUE DE BIBLIOTECA

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (80%)
- Estructura metálica cubierta (100%)



TANQUE DE ALMACENAMIENTO

- Estructura concreto (100%)
- Relleno perimetral (100%)



RAMPA

- Baranda metálica (100%)
- Fundición placa (100%)



BLOQUE BACHILLERATO

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Cubierta metálica (50%)
- Enchape de pisos (100%)
- Instalaciones sanitarias (100%)
- Instalaciones hidráulicas (100%)
- Instalaciones eléctricas (30%)
- Instalación RCI (100%)
- Carpintería metálica (90%)
- Estampado de pisos (20%)
- Instalación de ventanería (50%)
- Construcción muro contención (100%)



BLOQUE DE LABORATORIOS

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Cubierta metálica (0%)
- Enchape de pisos (70%)
- Instalaciones sanitarias (90%)
- Instalaciones hidráulicas (30%)
- Instalaciones eléctricas (5%)
- Instalación RCI (100%)



OBRAS EXTERIORES

- Instalación de tubería para red contraincendios. **Por culminar**
- Instalación de tubería principal de red hidrosanitaria. **Por culminar**
- Instalación de tubería principal de presión. **Por culminar**
- Instalación de tubería principal de red eléctrica. **Por culminar**
- Construcción de cajas sanitarias. **Por culminar.**



PROYECTO PLAZA DE MERCADO

INVERSIÓN
\$6.000.000.000

*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.




PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56



AVANCES

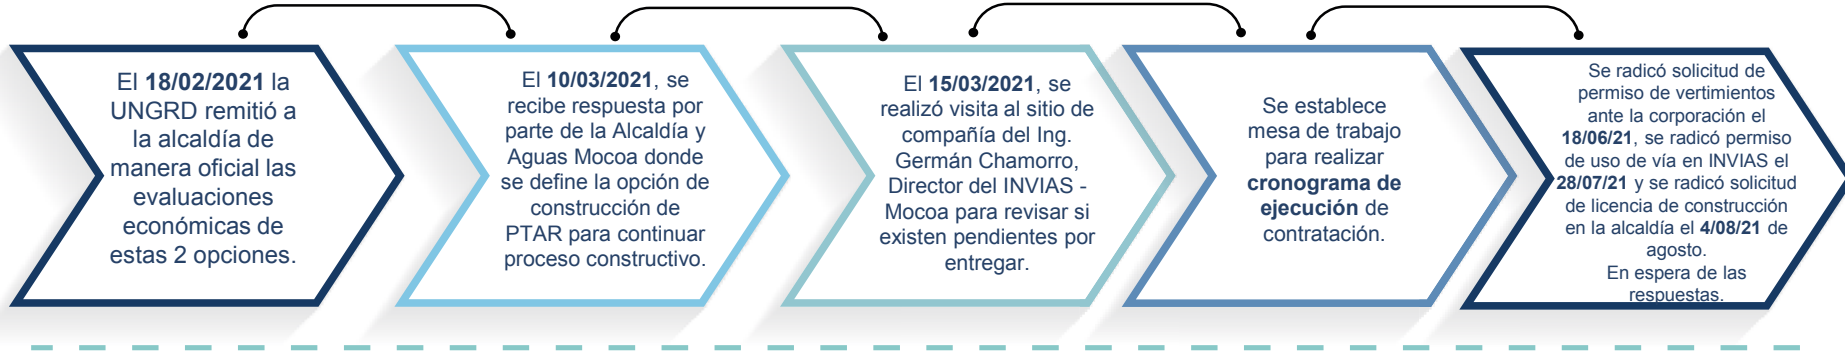


CRONOGRAMA



COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO

AVANCES

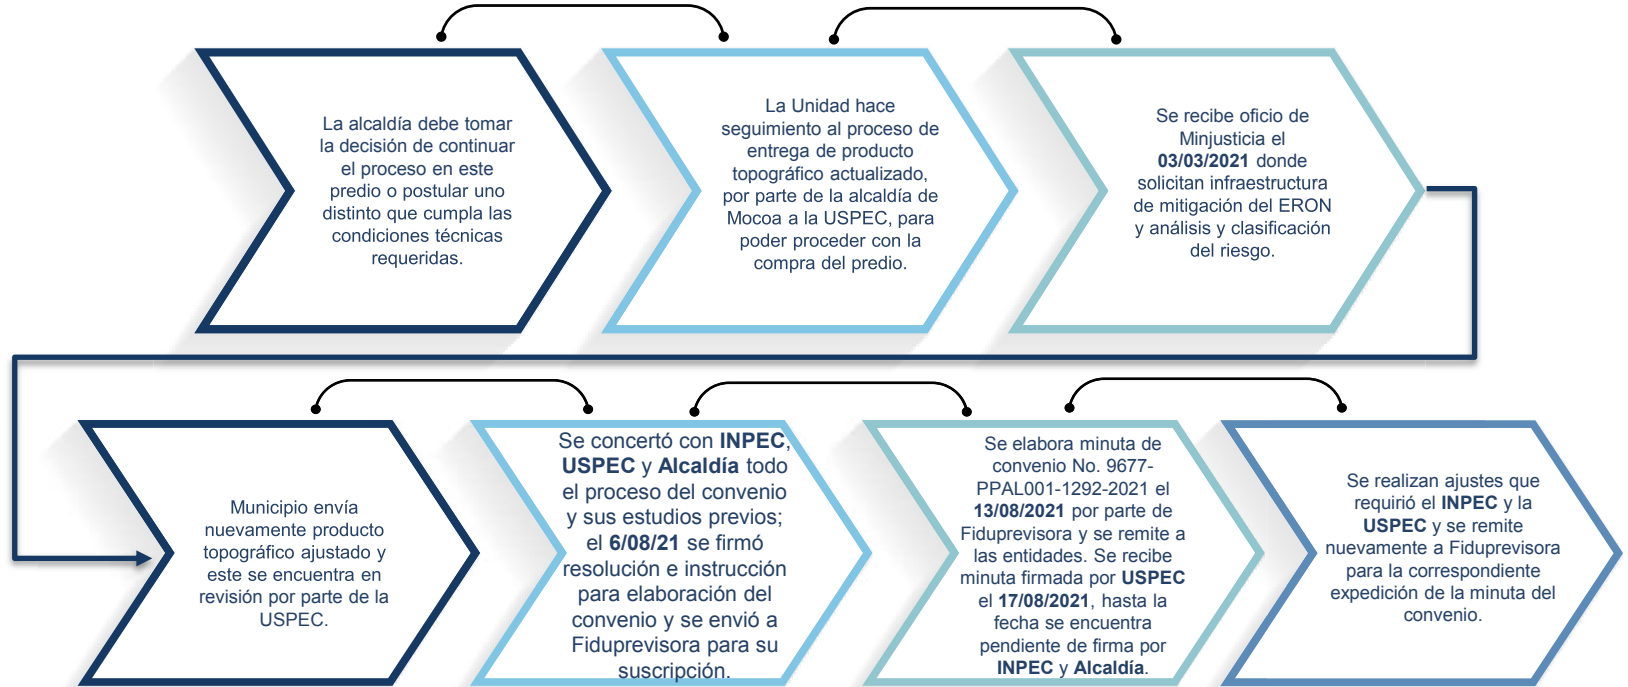

INVERSIÓN

\$ 1.310.921.000* lote

\$ 80.000.000.000,00 Construcción

* Estos recursos serán gestionados por el FNGRD para su adquisición.



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ETAPA

2

ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.




CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	6,5%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	5%
ESTADO	Proyecto en ejecución. Se adelantan actividades de socialización de instalación de micromedidores, así como la ejecución del cambio de tubería de asbesto cemento a PVC y empalmes en redes de distribución del proyecto.



4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

	CONTRATOS EN EJECUCIÓN	57
	EMPLEO GENERADO A LA FECHA	636
	PERSONAL PROYECTADO	1.029

	25/08/21	08/09/21		25/08/21	08/09/21
MANO DE OBRA LOCAL	453	488	MANO DE OBRA FORÁNEA	139	148
CALIFICADOS	238	245	CALIFICADOS	116	119
NO CALIFICADOS	215	243	NO CALIFICADOS	23	29
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	77%	77%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	23%	23%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.145	1.852
EMPLEOS INDUCIDOS	254	412
TOTAL EMPLEOS	1.399	2.264

GRACIAS
