

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Febrero 09 de 2022



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

18 de obra

18

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$43.778 millones



Total de contratos

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

13 de obra

13

100%

4 de interventoría

4

100%

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.844.159.281,86	21.74%	32.47%	\$ 10,664,498,518.82	83.80%	\$ 27,523,405,478.20	+ 51.33%
3	\$ 4.706.751.939,00	0%	40.00%	\$ 1,882,700,775.60	31.80%	\$ 1,496,747,116.60	- 8.20%
4	\$ 6.115.409.901,98	0%	46.95%	\$ 2,871,184,948.98	41.30%	\$ 2,525,664,289.52	-5.65%
5	\$ 7.488.477.539,43	0%	24.06%	\$ 1,801,727,695.99	19.07%	\$ 1,428,052,666.77	-4.99%
6	\$ 11.015.788.965,85	0%	35.00%	\$ 3,855,526,138.05	32.01%	\$ 3,526,154,047.97	-2.99%
7	\$ 12.263.393.477,06	0%	27.04%	\$ 3,316,021,596.20	23.25%	\$ 2,851,238,983.42	-3.79%
8	\$ 7.204.019.704,53	35.40%	43.62%	\$ 3,142,393,395.12	43.89%	\$ 3,161,844,248.32	+ 0.27%
9	\$ 6.827.896.668,28	36.37%	40.31%	\$ 2,752,325,146.98	42.86%	\$ 2,926,436,512.02	+ 2.55%
10	\$ 5.707.351.594,38	20%	38.30%	\$ 2,185,915,660.65	43.67%	\$ 2,492,400,441.27	+ 5.37%
11	\$ 16.651.641.771,25	15%	31.10%	\$ 5,178,660,590.86	43.02%	\$ 7,163,536,289.99	+ 11.92%
12	\$ 26.536.775.722,39	25.79%	30.64%	\$ 8,130,868,081.34	29.92%	\$ 7,939,803,296.14	-0.72%
13	\$ 2.943.285.850,62	19.19%	56.84%	\$ 1,672,963,677.49	42.11%	\$ 1,239,417,671.70	-14.73%
14	\$ 2.096.212.362,12	0%	26.65%	\$ 558,640,594.50	10.42%	\$ 218,425,328.13	-16.23%
15	\$ 6.705.288.187,44	0%	2.70%	\$ 181,042,781.06	1.66%	\$ 111,307,783.91	-1.04%
16	\$ 8.981.109.127,00	0%	1.80%	\$ 161,659,964.29	0.93%	\$ 83,524,314.88	-0.87%
17	\$ 8.470.387.014,00	0%	24.60%	\$ 2,083,715,205.44	7.88%	\$ 667,466,496.70	-16.72%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	2.01%	\$ 96,807,393.56	1.02%	\$ 49,126,140.02	-0.99%
TOTAL	\$ 171.374.237.344,19			\$50.536.652.164,93		\$65.404.551.105,55	
				29.49%		38,16%	

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
 Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
 Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
 Fecha de terminación: 28 - DIC – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

Estado Actual:

Obra finalizada el 28/DIC/2021



45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960
Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa	Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020

Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020

Fecha de terminación: 14 - JUN - 2022

Fecha de Inicio suspensión: 24-DIC-2021




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

Estado Actual:
El 20 de diciembre del 2021 se radicó trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría, por un tiempo de 4 meses.

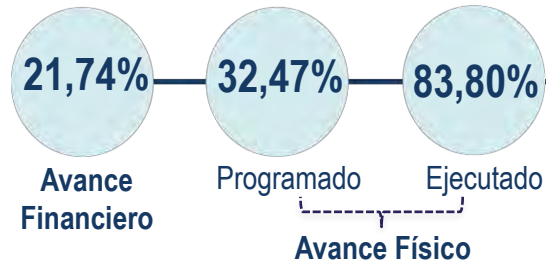

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00</p>
<p>Nombre del Contratista: INGECON SA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra:28
Total Projectado:30

Local: 23
82%


Foráneo: 5
18%

Calificados: 9
39%

No Calificados: 14
61%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

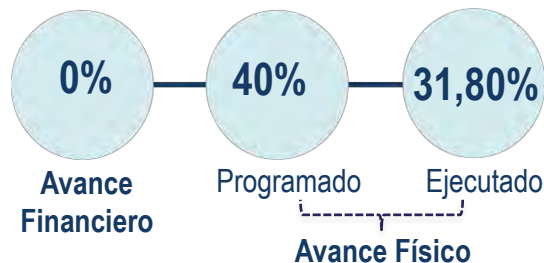

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOCA LH 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



Armado de Colchagión



Fundición de concreto ciclópeo Espolón 2



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

**PERSONAL EN
OBRA**

Total Obra: 19
Total Projectado: 25

Local: 16
84%


Foráneo: 3
16%

Calificados: 5
31%

No Calificados: 11
69%

Calificados: 3
100%

No Calificados: 0
0%

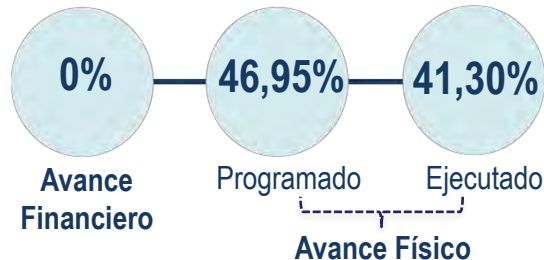

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-980-2020
Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre del Contratista:
HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD
Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



Instalación de filtros de tubería



Instalación de bolsacretos



ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 30 Total Projectado: 35	Local: 22	Calificados: 14
	73%	64%
		No Calificados: 8
		36%
	Foráneo: 8	Calificados: 8
	27%	100%
		No Calificados: 0
		0%

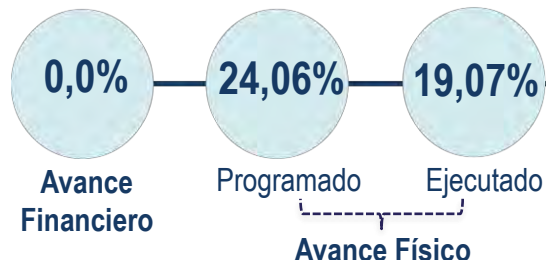

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.924.254.899,43	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 564.222.640,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO MULATO.	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Vaciado de concreto del dique 2 y se continua con el armado de acero en módulos



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local: 30 79%	Calificados: 14 47%
		No Calificados: 16 53%
	Foráneo: 8 21%	Calificados: 8 100%
		No Calificados: 0 0%

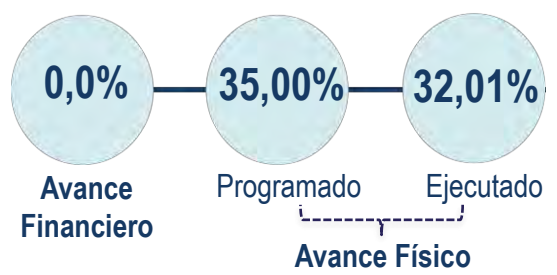


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Revestimiento de colchogación en muro 1



Excavación y armado de gaviones en el muro 3

- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 22
Total Projectado: 45

Local: 18
82%


Foráneo: 4
18%

Calificados: 6
33%

No Calificados: 12
67%

Calificados: 4
100%

No Calificados: 0
0%

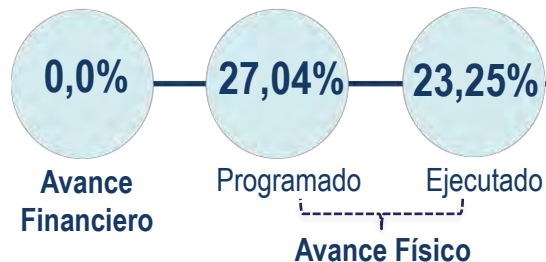

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOCA</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Excavación en el azud 6



Vaciado de concreto en azud 12



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención **CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 25 Total Proyectado: 35	Local: 18 72%	Calificados: 7 39%
		No Calificados: 11 61%
	Foráneo: 7 28%	Calificados: 5 71%
		No Calificados: 2 29%

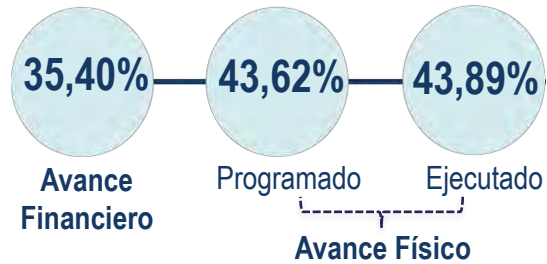

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE** • Dique Abierto 1 - Q. Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
 Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 21 Total Projectado: 35	Local: 11 52%	Calificados: 6 55%
		No Calificados: 5 45%
	Foráneo: 10 48%	Calificados: 6 60%
		No Calificados: 4 40%

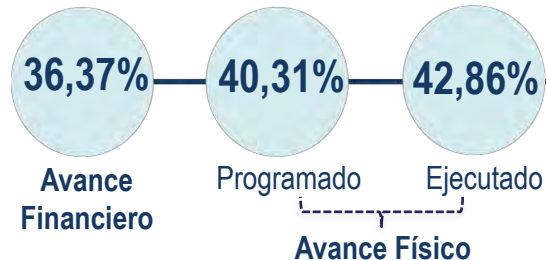

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.319.593.302,48	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.303.365,8033 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO MURO RIO MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Fundición aleta izquierda



3 feb. 2022

ALCANCE • Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
Total Projectado: 35

Local: 14
74%


Foráneo: 5
26%

Calificados: 6
43%

No Calificados: 8
57%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

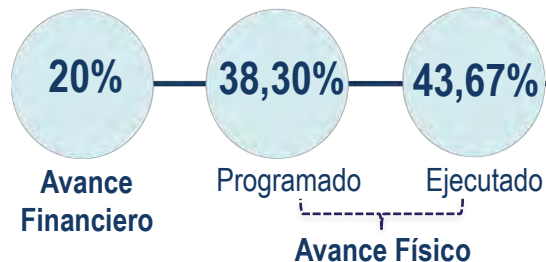

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.384.755,43
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORES DDA
MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Protección lateral Izquierda
Dique 11



Laboratorios de Concretos Dique 11



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 52
Total Projectado: 45

Local: 32
62%

Foráneo: 20
38%

Calificados: 6

19%

No Calificados: 26
81%

Calificados: 8

40%

No Calificados: 12
60%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1064-2020
Valor: \$ 15.407.631.114,68

Nombre del Contratista:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS
RIO SANGOYACO 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 1.244.010.656,57
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORES
DDA MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Excavaciones Jarillón 02



Construcción muro 07



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 59 Total Projectado: 61	Local: 45 76%	Calificados: 21 47%
		No Calificados: 24 53%
	Foráneo: 14 24%	Calificados: 12 86%
		No Calificados: 2 14%

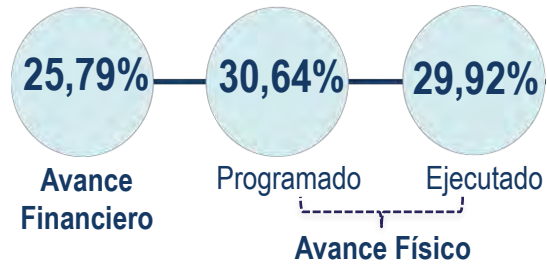

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1382-2020 Valor: \$ 24.574.127.979,39	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-205-2021 Valor: \$ 1.962.647.743,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO DRAGADO MOCOA 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDRAGADOS MOCOA
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa	



Conformación de colchogavión y arena



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 09 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 03 – MAY – 2021
Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 38

Total Projectado: 37

Local: 19
50%


Foráneo: 19
50%

Calificados: 11
58%

No Calificados: 8
42%

Calificados: 18
95%

No Calificados: 1
5%

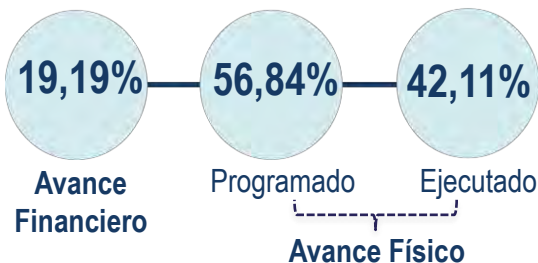

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-311-2021
Valor: \$ 2.723.478.287,36

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-110-2021
Valor: \$ 219.807.563,26
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORIA
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Armado de gaviones.



ALCANCE

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020
Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 15 Total Projectado:30	Local: 10 67%	Calificados: 10 100%
		No Calificados: 0 0%
	Foráneo: 5 33%	Calificados: 5 100%
		No Calificados: 0 0%

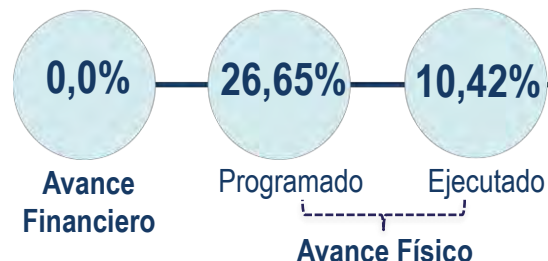

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Fundición Dentellón Azud 15



Trabajos Ambiental Azud 15



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021
 Fecha acta de reinicio: 19 – OCT - 2021
 Fecha de terminación actualizada: 14 - MAR – 2023




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	

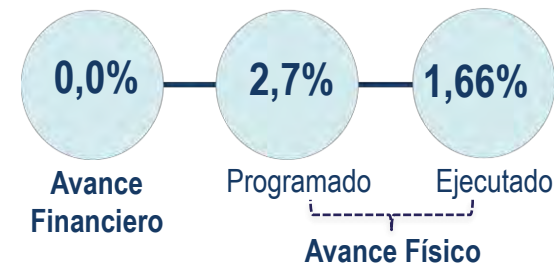


45.589
 Personas beneficiadas



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

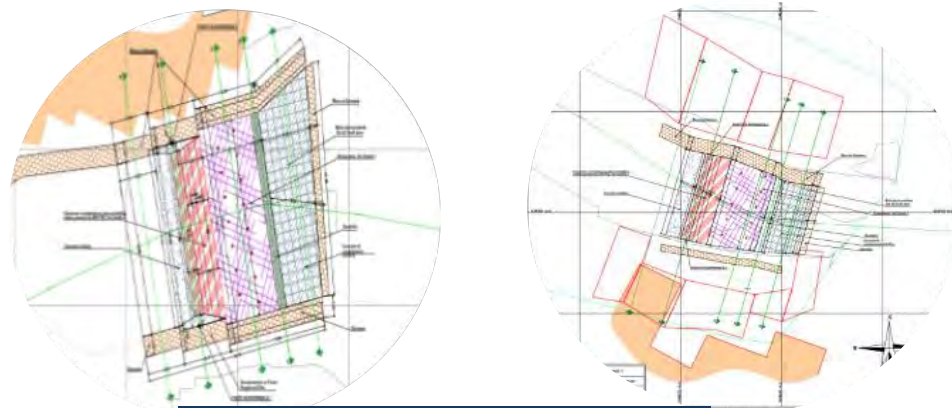

Diseños Nuevos, Aprobados por Interventoría



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021
Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021
Fecha de terminación: 10 - MAY -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 37

Local: 13
87%

Foráneo: 2
13%

Calificados: 9
69%

No Calificados: 4
31%

Calificados: 2
100%

No Calificados: 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

1,80%

Programado

0,93%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1342-2020
Valor: \$ 8.307.462.027

Nombre del Contratista:
CONSORCIO AZUD
MOCOA 520

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-098-2021
Valor: \$ 673.647.100

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORIA MUROS
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Visita técnica con especialista geotécnico.



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 40

Local: 7
58%

Foráneo: 5
42%

Calificados: 7

100%

No Calificados: 0


0%

Calificados: 5

100%

No Calificados: 0

0%

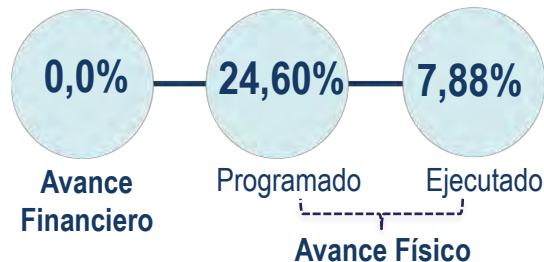

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Gaviones Azud 6-Q taruca.



Excavaciones e instalación Muro 2-Q taruca.



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES
Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 05- ENE – 2022
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Se aprueba enrocado y la interventoría revisa diseño presentado para evaluación.

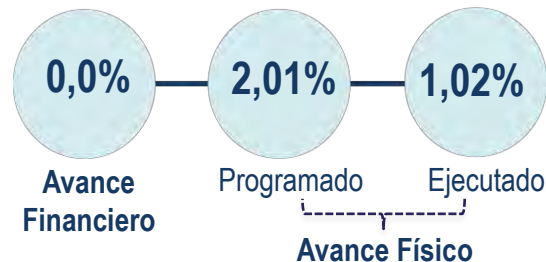

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-183-2021 Valor: \$ 4.452.771.492,00</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-743-2021 Valor: \$ 363.516.745,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mococa</p>	



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.2

SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$10.716.744.930,19	0.00%	61.31%	\$ 6,570,436,316.70	34.13%	\$ 3,657,625,044.67	-27.18%
2	\$1.348.270.441,00	89.01%	100.00%	\$ 1,348,270,441.00	100.00%	\$ 1,348,270,441.00	Finalizado*
3	\$2.561.992.020,00	0.00%	70.20%	\$ 1,798,518,398.04	61.50%	\$ 1,575,625,092.30	-8.70%
4	\$1.089.926.762,00	49.41%	100.00%	\$ 1,089,926,762.00	100.00%	\$ 1,089,926,762.00	Finalizado*
5	\$3.648.087.137,12	0.00%	100.00%	\$ 3,648,087,137.12	100.00%	\$ 3,648,087,137.12	Finalizado*
6	\$1.291.868.311,00	90.00%	100.00%	\$ 1,291,868,311.00	100.00%	\$ 1,291,868,311.00	Finalizado*
7	\$2.887.755.648,00	0.00%	23.62%	\$ 682,087,884.06	18.60%	\$ 537,122,550.53	-5.02%
8	\$1.492.702.508,00	69.75%	88.00%	\$ 1,313,578,207.04	79.00%	\$ 1,179,234,981.32	-9.00%
9	\$4.979.678.330,00	7.09%	55.45%	\$ 2,761,231,633.99	27.48%	\$ 1,368,415,605.08	-27.97%
10	\$1.960.337.973,00	38.37%	61.80%	\$ 1,211,488,867.31	61.12%	\$ 1,198,158,569.10	-0.68%
11	\$1.365.747.660,00	0.00%	18.99%	\$ 259,355,480.63	19.55%	\$ 267,003,667.53	+ 0.56%
12	\$6.644.038.095,94	0.00%	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
13	\$3.791.334.750,00	0.00%	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL	\$43.778.484.566,25			\$ 21.974.849.438,89		\$ 17.161.338.161,65	
				50.19%		39,2%	

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 10.716.744.930,19

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021

Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local: 5 45%	Calificados: 4 80%
		No Calificados: 1 20%
	Foráneo: 6 55%	Calificados: 6 100%
		No Calificados: 0 0%

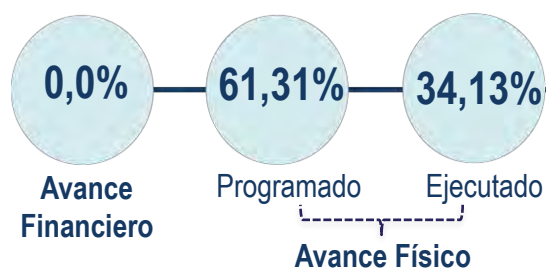


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 9.978.894.780	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 737.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Excavación para alcantarillado

ALCANCE

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.
 - Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
 - Barrio Primero de Enero.
 - Barrio Venecia.
 - Barrio Obrero II Etapa.
 - Barrio San Andrés.
 - Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 18 - ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:
Obra finalizada el 18/01/2022



45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Canalización de aguas lluvias



Fundición de placa

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaverl y Prado Norte.

 **ALCANCE**

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$2.561.992.020,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 18 – ABR – 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 8 Total Projectado: 25	Local 8 100%	Calificados 5 62.5%
		No Calificados 3 37.5%
	Foráneo 0 0%	Calificados 0 0%
		No Calificados 0 0%

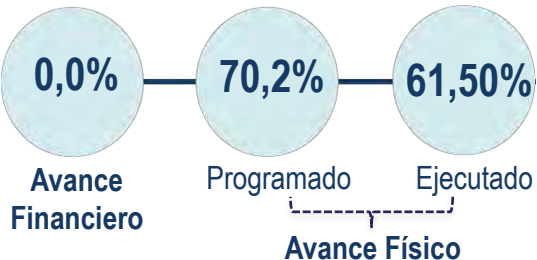


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.397.174.750	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Formaleta para bordillos



Actividad de Cajeo

 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021
Fecha de finalización: 18 - ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

Estado Actual:

Obra finalizada el 18/01/2022



45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-407-2021 Valor: \$ 1.017.658.395</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 72.268.367</p>
<p>Nombre del Contratista: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 3.648.087.137,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
 Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
 Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
 Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación 7 VÍAS en 2 SECTORES

Estado Actual:

Obra finalizada el 05/01/2022



45.589
 Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 3.447.499.607,12</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.



Tramos IV y VI

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 18 - NOV - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Obra finalizada el 18/11/2021

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-518-2021 Valor: \$ 1.206.210.066</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 85.658.245</p>
<p>Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL CAIMARON</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



45.589
Personas beneficiadas



Vía pavimentada



Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.



ALCANCE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización: 18 - MAY - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 23 Total Projectado: 25	Local: 22	Calificados: 3
	96%	14%
		No Calificados: 19
		86%
	Foráneo: 1	Calificados: 1
	4%	100%
		No Calificados: 0
		0%

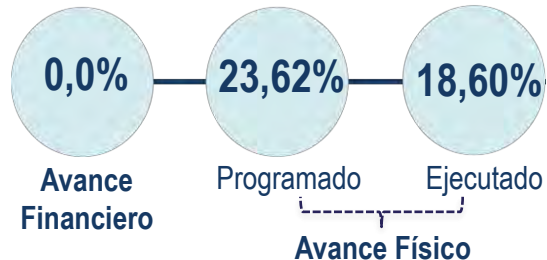

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
 - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.492.702.508,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de finalización: 09 - MAR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Proyectado: 25

Local: 12
100%


Foráneo: 0
0%

Calificados: 5
42%

No Calificados: 7
58%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%

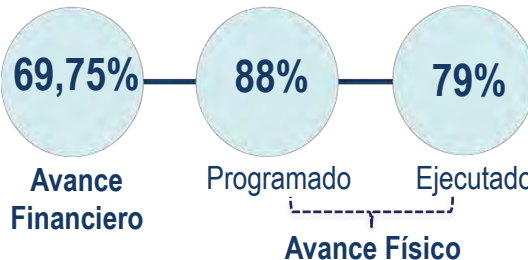

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-636-2021
Valor: \$ 1.403.617.179

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.085.329

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Fundición de placa de concreto intersección



Fundición de andes margen izquierdo



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.979.678.330,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 07 – JUN -2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 37

Local: 27
90%


Foráneo: 3
10%

Calificados: 15
56%

No Calificados: 12
44%

Calificados: 3
100%

No Calificados: 0
0%

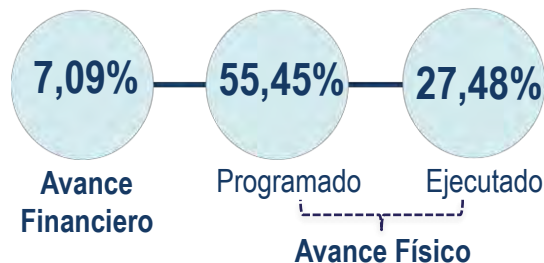

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.484.295.610</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Quinta paredes-Tramos 10 y 02



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión:

24 - FEB - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20

Total Projectado: 37

Local: 18
90%

Foráneo: 2
10%

Calificados: 4

22%

No Calificados: 14


78%

Calificados: 2

100%

No Calificados: 0

0%

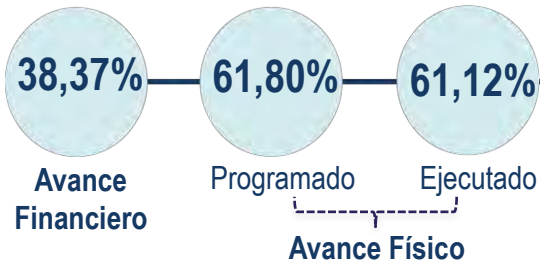

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-549-2021

Valor: \$1.830.025.649

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS
MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 130.312.324

(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021

Fecha de terminación: 16 - AGO - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 25 Total Projectado: 20	Local: 18 72%	Calificados: 11 61%
		No Calificados: 7 39%
	Foráneo: 7 28%	Calificados: 7 100%
		No Calificados: 0 0%

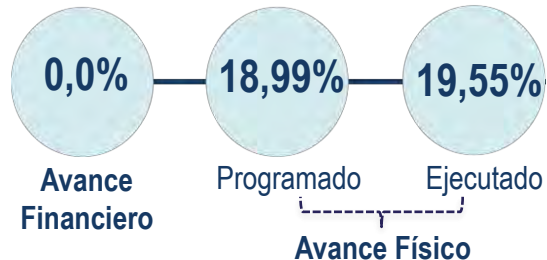


45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



Vaciado de concreto para cámara No. 1



Excavación para tubería sanitaria PVC 8"

 **ALCANCE**

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

La UNGRD ya dio los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario, en trámite para incorporarlos al contrato de obra y en aprobación ante la Alcaldía de Mocoa el ajuste del proyecto.

45.589
 Personas beneficiadas



Toma de topografía



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897</p>	<p>Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$3.791.334.750,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
Fecha acta de inicio: Pendiente



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Respuesta de interventoría enviada el 02/02/2022 para ajustes por parte de contratista de obra.

 **45.589**
Personas beneficiadas



Respuesta Interventoría -Ajuste

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1113-2021
Valor: \$ 3.295.952.030

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-774-2021
Valor: \$ 495.382.720

Nombre del Contratista:
MEGACONSTRUCCIONES
S.A.S

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERPAVIMENTOS
EDUPAC

Supervisor UNGRD
Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocóa



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II

TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

NO. VIVIENDAS	CONTRATISTA	VALOR (Millones)	VALOR ADICIONAL ASIGNADO 31/DIC/2021	*AVANCE	AVANCE FINANCIERO
436	CONSORCIO MOCOA 2019	\$25.731.568.960,00	\$40.900.781.303,18	33,29%	20%
473	CONSORCIO MOCOA 2019	\$27.915.211.280,00		30,89%	5%
TOTAL DE VIVIENDAS	909	VALOR TOTAL \$ 53.646.780.240,00	\$ 94.547.561.543,18		

Estudios y diseños 98,23% (244), movimiento de tierras 226 terrazas para igual número de viviendas, manzanas intervenidas: T(24), U(24), I(24), J(24), K(24), V(24), W(24), X(24), AE(28), AF(28), AH(12), AG(16), No se reintegran completas las 4 cuadrillas de mano de obra y Cuadrillas mano de obra instalaciones, No se reinician los trabajos con los 4 frentes de movimiento de tierras. Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, dos proveedores de concreto. Consorcio radicó cuenta en interventoría pago estudios y diseños contrato 244 \$3,400 millones, pendiente por cobrar aprox \$640 millones (48 cimentaciones fundidas). Consorcio entregó reprogramación de metas entrega de viviendas hasta 31/07/2022. Interventoría revisó y devolvió con observaciones, en ajuste por consorcio. Solicitud del consorcio de adición de recursos \$38.000 millones. Consorcio adeuda a subcontratistas y proveedores corte del 28/12/21.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	CONTRATISTA HMV INGENIEROS LTDA
	VALOR \$7.049.420.065
	AVANCE FINANCIERO 30,00%

META JULIO 2022

La totalidad de las viviendas se entregarán antes de **finalizar el periodo de gobierno.**

La fecha de culminación no se altera.

 **Julio 31 / 2022**

909



Viviendas terminadas y entregadas en total

42



El futuro es de todos

Presidencia de la República



ACTIVIDADES RELEVANTES



Avance movimiento de tierras

Movimiento de tierras 49,885 m3 de tierra (incluido expansión). 226 terrazas

Obra **NO** reinicia actividades con cantidad de personal esperado, **BAJO RENDIMIENTO**. Se realizaron dos reuniones extraordinarias de seguimiento, participaron Vicepresidencia, Minvivienda, UNGRD, Consorcio e Interventoría. Consorcio entregó reprogramación, UNGRD realizó 2 reuniones con Consorcio e Interventoría para orientación trámites ambientales. Se realizó ejercicio para identificar número de viviendas que posiblemente no se podrían construir al continuar esas afectaciones: 200 unds, consorcio insiste en que son 315 unidades.

Consorcio se comprometió a entregar 272 viviendas en mayo y la totalidad de las viviendas en julio 31 de 2022.

Se espera que las gestiones del consorcio ante Corpoamazonía confirmen lo prescrito en la licencia de urbanismo en el sentido de poder construir las 909 viviendas en el predio. Consorcio debe terminar gestiones ambientales en febrero.



En proceso de **cobro** 48 cimentaciones **\$640 millones** aprox y radicado cobro por estudios y diseños contrato 244 **\$3.400 millones** aprox



VIVIENDA URBANA SAUCES II



COMPROMISOS REUNIÓN 12 DE ENERO 2022

VICEPRESIDENCIA-MINVIVIENDA-UNGRD.

1

Inventario de materiales para adelantarnos a los posibles problemas, insumos y otros.

Entregado 28 de enero, en revisión por interventoría.

2

Mano de obra en todos los frentes a más tardar en una semana.

Aun no se normaliza el pago a subcontratistas de mano de obra, movimiento de tierras y proveedores. No se cumplió el reinicio de actividades en la semana del 31 de enero al 4 de febrero.

3

Reunión con Corpoamazonía
26 de enero Consorcio, Interventoría, MINVIVIENDA, Gobernación, UNGRD

Temas ambientales:

Ocupación de cause costado occidental del predio, posible nacedero en costado sur del predio y captación de agua de un afluente local para proveer insumo hídrico en obra. Se realizó reunión de seguimiento, UNGRD presentó orientaciones a consorcio para el debido trámite de los permisos ante la Corporación. Consorcio informó que una vez tenga los estudios los presentará a Interventoría para recibir el respectivo acompañamiento. Aun no presenta info.

4

A 30 de enero
4 formaletas en obra y 200 obreros activos.

Consortio mantiene el compromiso para el 30 de enero de 2022 de tener la formaleta y los 200 obreros, la programación aún no la entregan. NO SE CUMPLE AÚN.

5

Reporte diario de gestión

Incluir gestiones ante corporación y aspectos financieros a través de Informe diario de personal. Mantener informado a contratante del estado técnico y financiero de los contratistas de obra. CUMPLIDO.

VIVIENDA URBANA SAUCES II

PROYECTO SAUCES II CONTROL DIARIO PERSONAL		F-SST-67 Versión I 11/03/2019							
SEMANA I DEL 31 DE ENERO al 7 DE FEBRERO DE 2022		TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
CONSORCIO MOCOA 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	8	0	8	8	8			6
CONSORCIO MOCOA 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	2	0	2	2	2			2
INTERVENTORIA HMV	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	8	8	8	8	8			8
TOTAL		18	8	18	18	18	0		16

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
		L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MOCOA 2019	2	0	0	0	0			0
SEGURIDAD PRIVADA	CELADURIA OBRA	2	1	2	2	2			2
CONSTRUCTORA EYJ SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	12	0	0	0	0			2
CASTAÑEDA CONSTRUCTORA SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
SINIESTERRA CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
ELECTROSERVIG	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	0	0	0	0	0			0
YENI CONSTANZA MIGUEZ	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	0	0	0	0	0			0
BCH HIDROSANITARIAS SAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	6	6	7	7	7			7
TEJA CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2	0	2	2	2			2
DAVID FRANCISCO ALVAREZ	APROVECHAMIENTO FORESTAL	0	0	2	2	2			1
SEBCO SAS	BOMBA MOVIL DE CONCRETO	0	0	1	0	0			0
TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		24	7	14	13	13	0	0	14
JVC CONSTRUCCIONES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
JVC CONSTRUCCIONES	OPERADORES, PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	OPERADORES	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
LEONEL OJEDA	OPERADORES, PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
WILSON PUENTES	OPERADORES, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA		0	0	0	0	0	0		0
TOTAL PERSONAL EN EL DIA		24	7	14	13	13	0		14

VIVIENDAS CON EXCAVACION MECANICA										TOTAL	
										226	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0	0	0	0					88
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	SINIESTERRA CONSTRUCTORES S.A.S	0	0	0	0	0					
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0	0	0	0					
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	CONSTRUCTORA E&J SAS	0	0	0	0	0					30
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	SINIESTERRA CONSTRUCTORA S.A.S	0	0	0	0	0					
VIVIENDAS FUNDIDAS MURO SEGUNDO PISO	CONSTRUCTORA E&J SAS	0	0	0	0	0					4
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	0	0	0	0	0					18
VIVIENDAS MODULADAS (ACERO-INSTALACIONES) PARA CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO										TOTAL	
VIVIENDAS MODULADAS PARA(ACERO-INSTALACIONES) CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	0	0	0	0	0					2
TRAMITES ANTE ENTIDADES PUBLICAS										OBSERVACIONES	
CORPOAMAZONIA	OCUPACION DE CAUCE	JORGE FAJARDO		En preparacion de informes							
CORPOAMAZONIA	SOLICITUD PRORROGA REFORESTACION Y EPIFITAS	JORGE FAJARDO		Se envia carta a Corpomazonial dia 14 de Enero solicitando prorroga para reforestacion y recepcion de de epifitas							
ALCALDIA	SOLICITUD PERMISO ABSTECIMIENTO DE AGUA, SOCIALIZACION VIA DE ACCESO Y PONTON DE INGRESO AL PREDIO	ING MAURICIO FLOREZ		Se envia carta a Alcaldia, haciendo solicitud de tramites mencionados anteriormente							

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 32	Local: 16 50%	Calificados: 5 31%
		No Calificados: 11 69%
	Foráneo: 16 50%	Calificados: 5 31%
		No Calificados: 11 69%



AVANCES

MOCOA DISPERSO:

- **Proceso - Contrato de obra:** El 28/09/2021, se adjudicó el proceso No. **FNGRD-LP-002-2021** al CONSORCIO OTES MOCOA 1.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>,

Se firmó por parte del contratista acta de inicio con fecha 26 de enero de 2022 y con fecha de finalización el 25 de septiembre de 2022.

- **Proceso - Contrato de Interventoría:** El día 03/12/21 se adjudicó el proceso N° **FNGRD-CMA-001-2021** al CONSORCIO APOYOS 2022.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376922&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Se firmó por parte del contratista acta de inicio con fecha 26 de enero de 2022 y con fecha de finalización el 25 de septiembre de 2022.

- Desde ese mismo día por parte del contratista de obra se adelanta las visitas diagnóstico a las 36 predios.



Contrato de obra consorcio Otes Mocoa 1	\$ 2.406.425.590,00
Contrato de interventoría consorcio apoyos 2022	\$ 220.276.140,00
TOTAL	\$ 2.626.701.730,00

UNGRD	
Precio estimado total:	240.667.980 COP
Número del proceso	FNGRD-CMA-001-2021
Título:	INTERVENTORIA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
Fase:	Presentación de observaciones
Estado:	Publicado
Descripción:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y SU ANEXO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO 9677 PPA001 668 2017, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto



3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$19.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 19.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018
Fecha de finalización: 30 - JUN - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 38

Local: 31
82%

Foráneo: 7
18%

Calificados: 4
13%

No Calificados: 27
87%

Calificados: 4
57%

No Calificados: 3
43%

39,97%

Avance
Financiero


66,88%

Programado

67,07%

Ejecutado

Avance Físico

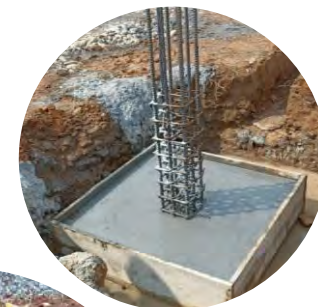

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consorcio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

SUPERVISOR UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello -
Subdirección para la Reducción del Riesgo



ENTIDADES PARTICIPANTES:
 USPEC - INPEC - ALCALDIA DE
 MOCOA - UNGRD

ALCANCE:
 Compra de predio de 11 hectáreas
 para la construcción de nuevo
 ERON y su escrituración y registro.

ESTADO:
 La UNGRD cumplió con su compromiso de
 financiación al **100%**

En proceso de adquisición por parte de la
 Alcaldía de Mocoa.

RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ETAPA

2

ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	13-FEB-2022
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	92 %
% EJECUTADO ETAPA I Y II	89%
ESTADO	Proyecto en ejecución, se adelanta actividades de instalación de micromedidores, empalmes en redes de distribución y líneas de conducción, así como empalmes de Valvulas Regulatoras de Presión.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

4.

PROYECTOS EN CONTRATACIÓN

Impacto

33 Intervenciones – obras de estabilización y recuperación



Actores e inversión

\$206.257 Millones

FNGRD - UNGRD

AVANCES

- Estudios y diseños de obras de mitigación para los sectores medio y alto de las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y parte alta de la quebrada Taruca.
- Se asignaron los recursos para la ejecución de las obras de mitigación.
- Estructuración de 11 procesos de obra y 11 de interventoría en etapa precontractual.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

2023

Mes:

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN -DIC

ENE - OCT

1

Estructuración de los procesos (Precontractual).

2

semanas

2

Proceso de contratación.

1.5

mes

3

Ejecución de obras.

18



AVANCES

Impacto **87 Familias**



Actores e inversión

\$ 9.309 Millones

- \$ 5.763 millones: Fonvivienda
- \$ 3.545 millones: FNGRD - UNGRD

- Se adelantan los trámites para la incorporación de los recursos al convenio.
- Equipo de trabajo de la UNGRD realizó desplazamiento al municipio de Mocoa para realizar visita al predio. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la UNGRD y la alcaldía con el fin de verificar los requisitos de postulación del predio.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración	2022												2023		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP-DIC	ENE-MAY	Mes:	Mes:			
1 Incorporación recursos al convenio	2 semanas															
2 Postulación y adquisición predio	4 meses															
3 Proceso precontractual contratación obra	3 semanas															
4 Proceso precontractual contratación interventoría	2 semanas															
5 Ejecución fase I contratos de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	3 meses															
6 Ejecución fase II contratos de obra - construcción proyecto 87 viviendas y obras de urbanismo	9 meses															

NOTA: Los tiempos anteriores dependerán de la postulación del predio por parte de la Alcaldía de Mocoa.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



AVANCES

Impacto **216 Familias**

Actores e inversión

\$ 32.107 Millones

- \$ 22.590 millones: FNGRD - UNGRD
- \$ 9.517 millones: BAC

- A la fecha se cuenta con el aval técnico del BAC para iniciar la ejecución del proyecto de vivienda.
- De las 216 viviendas presentadas al BAC se encuentran avaladas **211**. Pendientes por viabilizar 5 correspondiente a la comunidad indígena.

El día 28 de enero mediante comunicación interna N° 2022IE00693, se radicó en el área de Gestión Contractual solicitud de información a proveedores a través del SECOP II. Esta a su vez fue cargada a la plataforma del SECOP II el día 01 de febrero de 2021.

Link de la publicación:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2806008&isFromPublicArea=True&isModal=False>

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración
(meses)

2022
Mes:

2023
Mes:

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL - DIC

ENE-MAY

	Duración (meses)	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-MAY
1 Proceso para la contratación de las obras de vivienda VISR.	2	■	■					
2 Proceso para la contratación de la interventoría de vivienda VISR.	2			■	■			
3 Ejecución fase I contrato de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	1					■		
4 Ejecución fase II contrato de obra - construcción proyecto 216 viviendas y obras de urbanismo (20 viviendas por mes)	10						■	■



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO

Impacto

435 Comerciantes beneficiados de forma directa



Actores e inversión

\$18.976 Millones

FNGRD - UNGRD

• FNGRD – UNGRD y Municipio de Mocoa



AVANCES

- El 28 de enero de 2022 se suscribió el convenio 9677-PPAL001-522-2022, con el municipio de Mocoa.
- Se realizó la solicitud de licencia de construcción.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022						2023	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-NOV
1 Estructurar Convenio con Municipio de Mocoa	2	■	■						
2 Estructurar proceso licitatorio de obra e interventoría	2	■	■						
3 Publicación y adjudicación contrato de obra (Ley 80)	2			■	■				
4 Publicación y adjudicación contrato de Interventoría (Ley 80)	2				■	■			
5 Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	5 días					▬			
6 Ejecución fase I contrato de obra - revision estudios y diseños	1					▬	■		
7 Ejecución fase II contrato de obra - construcción de la galería de la plaza de mercado	17						▬	■	■



REHABILITACIÓN BOCATOMA PALMERAS Y OBRAS DE MITIGACIÓN

Impacto

16 barrios **2.522** usuarios

Actores e inversión

\$7.500 Millones

FNGRD - UNGRD

- Viceministerio de agua y Saneamiento Básico, Findeter y FNGRD – UNGRD.



AVANCES

- Se suscribió convenio No. 9677-PPAL001-463-2022, entre el FNGRD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Se remitió invitación a contratar a Findeter para la prestación de los servicios de asistencia técnica y administración de recursos para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de la bocatoma Palmeras y sus obras de mitigación.

CRONOGRAMA


ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



*NOTA: De los 10 meses de ejecución de Findeter, 2 meses están programados para adelantar los procesos derivados de consultoría, obra e interventoría .

Impacto

45.589 Personas beneficiadas



Actores e inversión

\$524 Millones

FNGRD - UNGRD



AVANCES

- Se asignaron los recursos para el fortalecimiento del SAT.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración
(meses)

2022

Mes:

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

1


Proceso contratación

2

2

Ejecución de actividades

3




El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

5.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

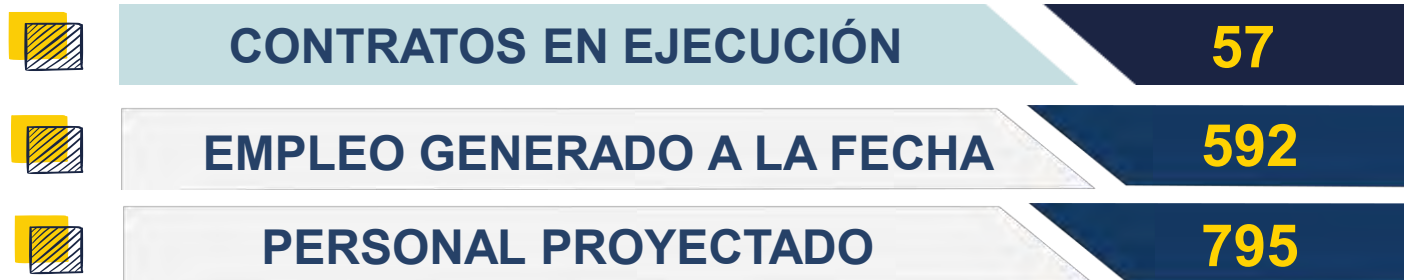

	3/02/22	9/02/22		3/02/22	9/02/22
MANO DE OBRA LOCAL	378	435	MANO DE OBRA FORÁNEA	165	157
CALIFICADOS	179	186	CALIFICADOS	119	122
NO CALIFICADOS	199	249	NO CALIFICADOS	46	35
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	70%	73%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	30%	27%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.066	1.431
EMPLEOS INDUCIDOS	237	318
TOTAL EMPLEOS	1.303	1.749

GRACIAS
