

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOCHA

Marzo 09 de 2022



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento ejecución
18 de obra	18	100%
13 de interventoría	13	100%
Estamos ejecutando 57 intervenciones en total		

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$43.778 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento ejecución
13 de obra	13	100%
4 de interventoría	4	100%

1.1

PROYECTOS FINALIZADOS

CONSTRUCCIÓN MURO DE ESTABILIZACIÓN BARRIO MODELO.

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Proyecto finalizado

Obras de control de protección y/o estabilización

En **desarrollo del proyecto** se construyeron 2569,88 m2 de pantallas ancladas para la mitigación, estabilización y consolidación de los taludes aferentes al hospital psiquiátrico San Camilo, barrio Villa del Prado.
 Empleos Generados: **26**

Contrato de Obra
 No. 063 del 2019
 Valor: \$ 3.841.235.901

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-261-2019
 Valor: \$ 360.589.960

Nombre del Contratista:
 Virgilio Bravo Sosa

Nombre de la Interventoría:
 Yahara Maritza Viveros Ortiz

Antes

INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 4.201.825.861,00

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589 

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
 Fecha de terminación: 28- DIC- 2021
 Avance financiero: 35%
 Avance físico: 100%



El futuro
 es de todos

Presidencia
 de la República

Proyecto finalizado

Obras de Pavimentación

En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 349 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes y una longitud de 436,7 metros lineales de alcantarillado pluvial.

Empleos Generados: **38**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-407-2021

Valor: \$ 1.017.658.395

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 72.268.367

Nombre del Contratista:

CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG.

Antes

INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589



ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 27 - ABR - 2021

Fecha de terminación: 18- ENE- 2022

Avance financiero: 49,41%

Avance físico: 100%



El futuro
de todos

Presidencia
de la República

Obras de Pavimentación



En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 318,65 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes.

Empleos Generados: **40**

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-518-2021
 Valor: \$ 1.206.210.066

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 85.658.245

Nombre del Contratista:
 UNIÓN TEMPORAL CAIMARON

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER 5HG.

INVERSIÓN
 Valor total del proyecto
\$ 1.291.868.311

POBLACIÓN BENEFICIADA
45.589

ESTADO TERMINADO
 Fecha acta de inicio: 19 - ABR - 2021
 Fecha de terminación: 18- NOV- 2022
 Avance financiero: 90%
 Avance físico: 100%

1.2

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.844.159.281,86	21,74%	32,47%	\$ 10.664.498.518,82	83,80%	\$ 27.523.405.478,20	+ 51,33%
3	\$ 4.706.751.939,00	11,96%	43,68%	\$ 2.055.909.246,96	33,56%	\$ 1.579.585.950,73	-10,12%
4	\$ 6.115.409.901,98	0%	48,01%	\$ 2.936.008.293,94	42,04%	\$ 2.570.918.322,79	-5,97%
5	\$ 7.488.477.539,43	6,22%	26,65%	\$ 1.995.679.264,26	23,05%	\$ 1.726.094.072,84	-3,60%
6	\$ 11.015.788.965,85	20,83%	38,20%	\$ 4.208.031.384,95	36,70%	\$ 4.042.794.550,47	-1,50%
7	\$ 12.263.393.477,06	20,67%	34,22%	\$ 4.196.533.247,85	25,82%	\$ 3.166.408.195,78	-8,40%
8	\$ 7.204.019.704,53	35,40%	48,57%	\$ 3.498.992.370,49	46,04%	\$ 3.316.730.671,97	-2,53%
9	\$ 6.827.896.668,28	36,37%	50,35%	\$ 3.437.845.972,48	43,39%	\$ 2.962.624.364,37	-6,96%
10	\$ 5.707.351.594,38	27,32%	56,00%	\$ 3.196.116.892,85	60,71%	\$ 3.464.933.152,95	+ 4,71%
11	\$ 16.651.641.771,25	20,49%	40,83%	\$ 6.798.865.335,20	52,94%	\$ 8.815.379.153,70	+ 12,11%
12	\$ 26.536.775.722,39	25,79%	34,04%	\$ 9.033.118.455,90	41,32%	\$ 10.964.995.728,49	+ 7,28%
13	\$ 2.943.285.850,62	19,19%	66,52%	\$ 1.957.873.747,83	54,05%	\$ 1.590.846.002,26	-12,47%
14	\$ 2.096.212.362,12	0%	31,02%	\$ 650.245.074,73	11,63%	\$ 243.789.497,71	-19,39%
15	\$ 6.705.288.187,44	0%	2,70%	\$ 181.042.781,06	1,66%	\$ 111.307.783,91	-1,04%
16	\$ 8.981.109.127,00	0%	1,39%	\$ 124.837.416,87	0,95%	\$ 85.320.536,71	-0,44%
17	\$ 8.470.387.014,00	0%	27,27%	\$ 2.309.874.538,72	15,98%	\$ 1.353.567.844,84	-11,29%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	2,01%	\$ 96.807.393,56	1,02%	\$ 49.126.140,02	-0,99%
TOTAL	\$ 171.374.237.344,19			\$ 57.342.279.936,47		\$73.567.827.447,72	
				33,46%		42,93%	

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020

Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020

Fecha de terminación: 14 - JUN - 2022

Fecha de Inicio suspensión: 24-DIC-2021




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

Estado Actual:
El 20 de diciembre del 2021 se radicó trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría, por un tiempo de 4 meses.

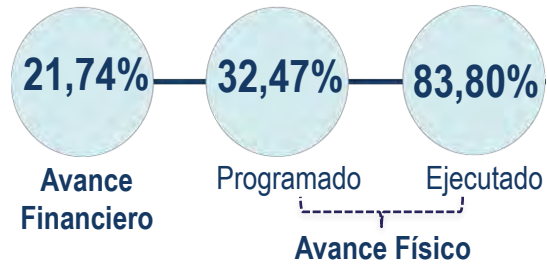

 **45.589**
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: INGECON SA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	




ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra:28
Total Projectado:30

Local: 23
82%


Foráneo: 5
18%

Calificados: 9
39%

No Calificados: 14
61%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

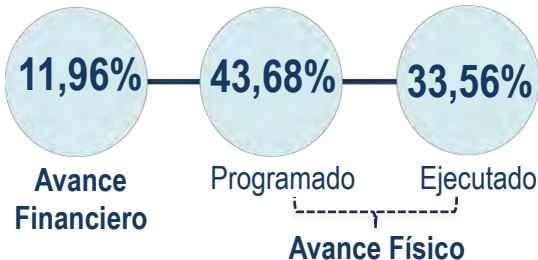

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1025-2020
Valor: \$4.302.041.377,00

Nombre del Contratista:
CONSORCIO RECUPERACIÓN
MOCOCA LH 2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
Total Projectado: 25

Local: 16
84%


Foráneo: 3
16%

Calificados: 5
31%

No Calificados: 11
69%

Calificados: 3
100%

No Calificados: 0
0%

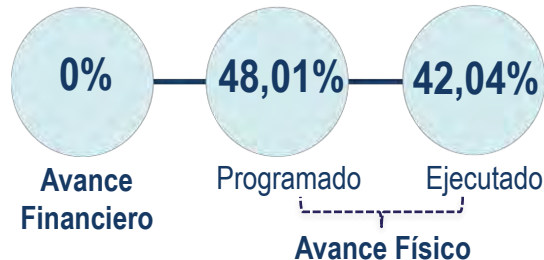

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-980-2020
Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre del Contratista:
HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD
Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



Fundición de Azud



Construcción colcha gavión de protección



ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 30 Total Projectado: 35	Local: 22 73%	Calificados: 14 64%
		No Calificados: 8 36%
	Foráneo: 8 27%	Calificados: 8 100%
		No Calificados: 0 0%

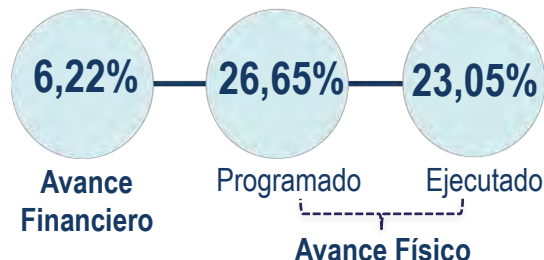

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.924.254.899,43	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 564.222.640,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO MULATO.	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Vaciado de concreto en los tabiques del dique 2 y armado de acero en la aleta



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local: 30 79%	Calificados: 14 47%
		No Calificados: 16 53%
	Foráneo: 8 21%	Calificados: 8 100%
		No Calificados: 0 0%

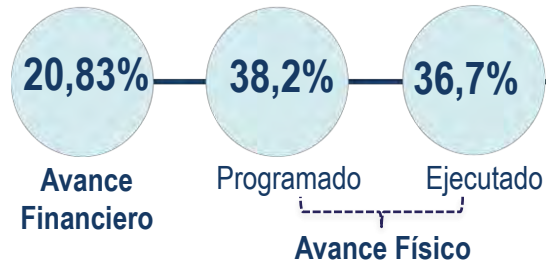


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 22
Total Projectado: 45

Local: 18
82%


Foráneo: 4
18%

Calificados: 6
33%

No Calificados: 12
67%

Calificados: 4
100%

No Calificados: 0
0%

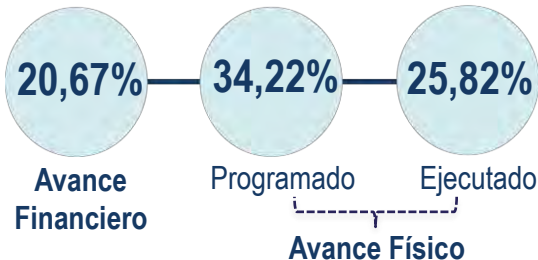

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOA</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Vaciado de concreto muro 4



Excavaciones azud 6



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021
 Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención **CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 25 Total Projectado: 35	Local: 18 72%	Calificados: 7 39%
		No Calificados: 11 61%
	Foráneo: 7 28%	Calificados: 5 71%
		No Calificados: 2 29%

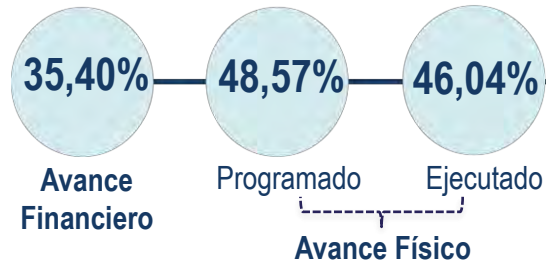

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Movimiento de Jarillón temporal



ALCANCE • Dique Abierto 1 - Q. Taruca

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 21 Total Proyectado: 35	Local: 11 52%	Calificados: 6 55%
		No Calificados: 5 45%
	Foráneo: 10 48%	Calificados: 6 60%
		No Calificados: 4 40%

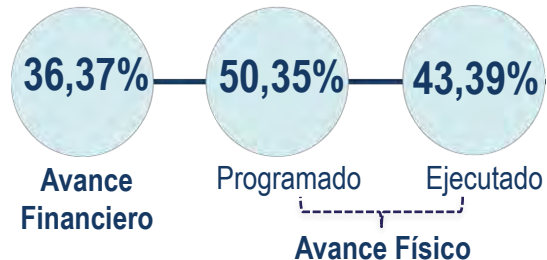


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.319.593.302,48 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO MURO RIO MOCOA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.303.365,8033 (para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Desencofrado aleta izquierda



Fundición tabique

✓ **ALCANCE** • Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
Total Projectado: 35

Local: 14
74%


Foráneo: 5
26%

Calificados: 6
43%

No Calificados: 8
57%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

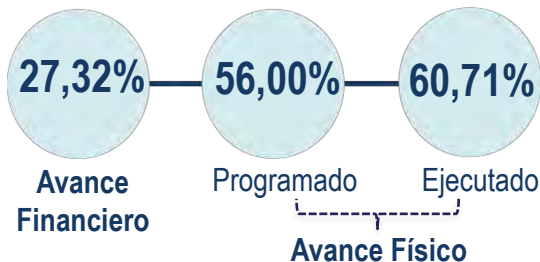

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.384.755,43
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORES DDA
MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Fundida Protección lateral Izquierda
Dique 11



Recorrido con Veeduría
Proyecto



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 52
 Total Projectado: 45

Local: 32
62%


Foráneo: 20
38%

Calificados: 6
19%

No Calificados: 26
81%

Calificados: 8
40%

No Calificados: 12
60%

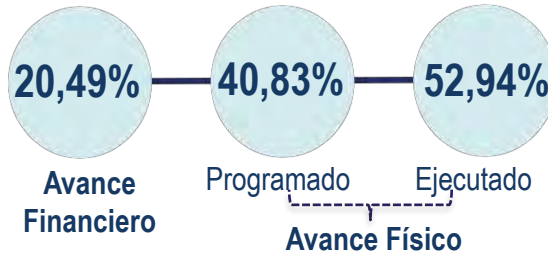

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1064-2020
 Valor: \$ 15.407.631.114,68

Nombre del Contratista:
 UNIÓN TEMPORAL OBRAS
 RIO SANGOYACO 2020

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-154-2021
 Valor: \$ 1.244.010.656,57
 (para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO
 INTERVENTORES
 DDA MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Construcción Jarillon 02



Construcción Azud 14



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 68
Total Projectado: 68

Local: 54
79%


Foráneo: 14
21%

Calificados: 21
39%

No Calificados: 33
61%

Calificados: 12
86%

No Calificados: 2
14%

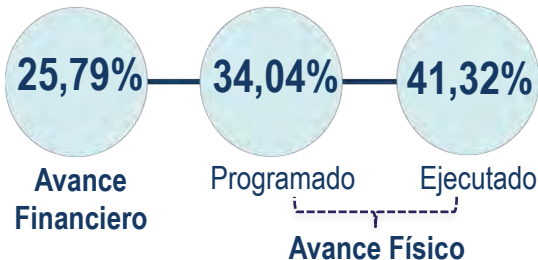

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO MOCOA 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD
Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



Conformación de colchogavión y arena



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021
Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 38

Total Projectado: 37

Local: 19
50%


Foráneo: 19
50%

Calificados: 11
58%

No Calificados: 8
42%

Calificados: 18
95%

No Calificados: 1
5%

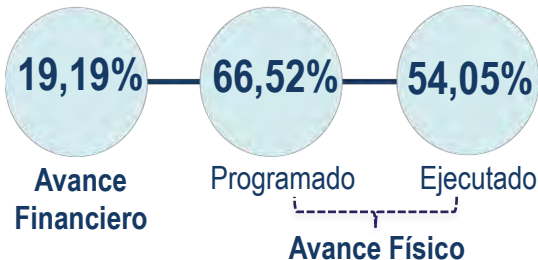

45.589

Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.478.287,36</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.807.563,26 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Culminación de fundición cuerpo dique azud segundo tercio
Segundo tercio Azud 10- Río Sangoyaco.



ALCANCE

- Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 30

Local: 10
67%

Foráneo: 5
33%

Calificados: 10
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

31,02%

Programado

11,63%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1330-2020
Valor: \$ 1.938.876.092,45

Nombre del Contratista:
CONSORCIO OBRAS POR
COLOMBIA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-133-2021
Valor: \$ 157.336.269,67
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER – MOCOCA
2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



Construcción Azud 15



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021
 Fecha acta de reinicio: 19 – OCT - 2021
 Fecha de terminación actualizada: 14 - MAR – 2023




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO


Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 5 Total Projectado:30	Local: 0 0%	Calificados: 0 0%
		No Calificados: 0 0%
	Foráneo: 5 100%	Calificados: 5 100%
		No Calificados: 0 0%

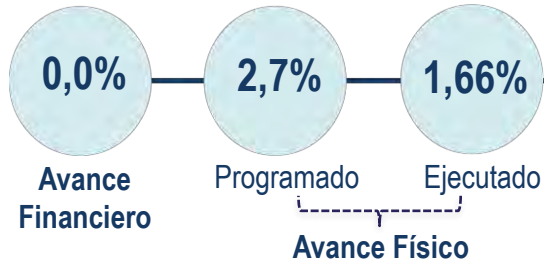

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	

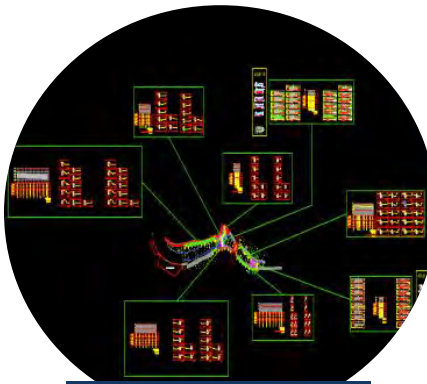

Aprobación de cantidades
Azud 16 – Muro 10



Apiques sobre muros existente
verificar TR diseño



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021
Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021
Fecha de terminación: 10 - MAY -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 37

Local: 13
87%

Foráneo: 2
13%

Calificados: 9
69%

No Calificados: 4
31%

Calificados: 2
100%

No Calificados: 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

1,39%

Programado

0,95%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1342-2020
Valor: \$ 8.307.462.027

Nombre del Contratista:
CONSORCIO AZUD
MOCOA 520

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-098-2021
Valor: \$ 673.647.100

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORIA MUROS
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



Excavaciones Dique Azud 4-Quebrada Taruca



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 40

Local: 7
58%

Foráneo: 5
42%

Calificados: 7

100%

No Calificados: 0


0%

Calificados: 5

100%

No Calificados: 0

0%

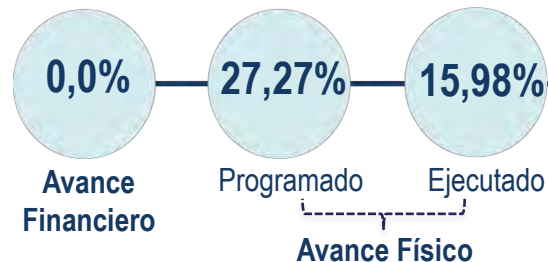

45.589

Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición dentellones y base de cemento Azud 6-Q taruca.



Armado Muro 2- Q. Taruca.



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES
 Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 05- ENE – 2022
 Fecha de terminación: 05 - ENE - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Se aprueba enrocado y la interventoría revisa diseño presentado para evaluación.

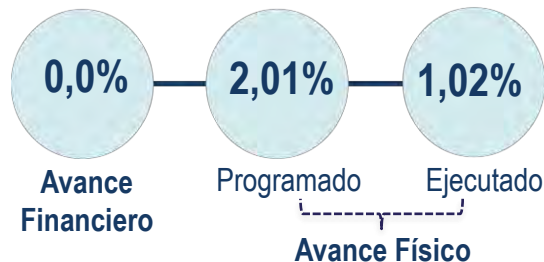

45.589
 Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-183-2021 Valor: \$ 4.452.771.492,00</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-743-2021 Valor: \$ 363.516.745,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.3

SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$10.716.744.930,19	0,00%	69,28%	\$ 7.424.560.887,63	48,00%	\$ 5.144.037.566,49	-21,28%
2	\$1.348.270.441,00	89,01%	100,00%	\$ 1.348.270.441,00	100,00%	\$ 1.348.270.441,00	Finalizado*
3	\$2.561.992.020,00	0,00%	88,70%	\$ 2.272.486.921,74	63,21%	\$ 1.619.435.155,84	-25,49%
4	\$1.089.926.762,00	49,41%	100,00%	\$ 1.089.926.762,00	100,00%	\$ 1.089.926.762,00	Finalizado*
5	\$3.648.087.137,12	0,00%	100,00%	\$ 3.648.087.137,12	100,00%	\$ 3.648.087.137,12	Finalizado*
6	\$1.291.868.311,00	90,00%	100,00%	\$ 1.291.868.311,00	100,00%	\$ 1.291.868.311,00	Finalizado*
7	\$2.887.755.648,00	0,00%	40,55%	\$ 1.170.984.915,26	25,47%	\$ 735.511.363,55	-15,08%
8	\$1.492.702.508,00	69,75%	96,22%	\$ 1.436.278.353,20	89,90%	\$ 1.341.939.554,69	-6,32%
9	\$4.979.678.330,00	17,84%	60,23%	\$ 2.999.260.258,16	34,63%	\$ 1.724.462.605,68	-25,60%
10	\$1.960.337.973,00	38,37%	85,09%	\$ 1.668.051.581,23	77,71%	\$ 1.523.378.638,82	-7,38%
11	\$1.365.747.660,00	0,00%	25,82%	\$ 352.636.045,81	26,66%	\$ 364.108.326,16	0,84%
12	\$6.644.038.095,94	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$3.791.334.750,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL	\$43.778.484.566,25			\$ 24.702.411.614,15		\$ 19.831.025.862,34	
				56,43%		45,30%	

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 10.716.744.930,19

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021
Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local: 5 45%	Calificados: 4 80%
		No Calificados: 1 20%
	Foráneo: 6 55%	Calificados: 6 100%
		No Calificados: 0 0%

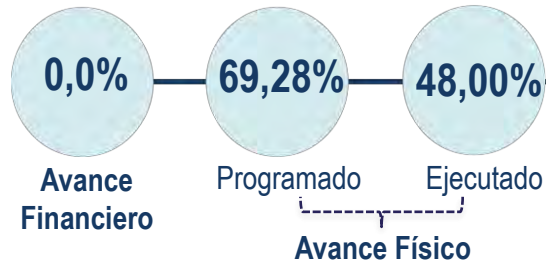


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 9.978.894.780	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 737.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 18 - ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:
Obra finalizada el 18/01/2022



45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558</p>
<p>Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	



Canalización de aguas lluvias



Fundición de placa

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

 **ALCANCE**

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$2.561.992.020,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 18 – ABR – 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 19 Total Projectado: 25	Local 19 100%	Calificados 5 26%
		No Calificados 14 74%
	Foráneo 0 0%	Calificados 0 0%
		No Calificados 0 0%

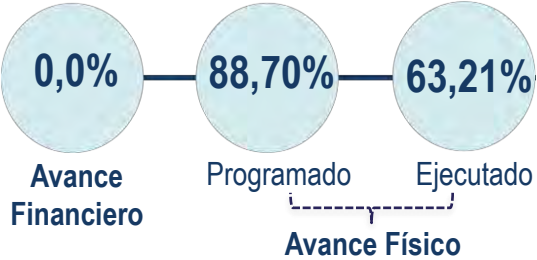


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.397.174.750	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	




ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 3.648.087.137,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación 7 VÍAS en 2 SECTORES


Estado Actual:

Obra finalizada el 05/01/2022



45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 3.447.499.607,12</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	

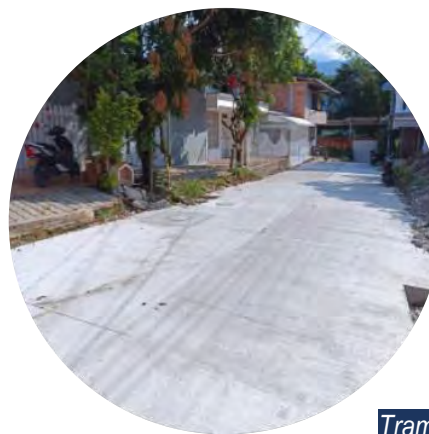

Tramos IV y VI



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización: 18 - MAY - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 23 Total Projectado: 25	Local: 22 96%	Calificados: 3 14%
		No Calificados: 19 86%
	Foráneo: 1 4%	Calificados: 1 100%
		No Calificados: 0 0%

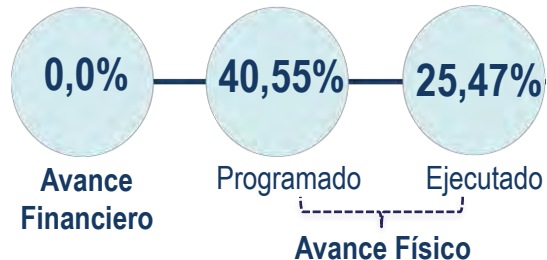

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
 - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$1.492.702.508,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de finalización: 09 - MAR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Proyectado: 25

Local: 12
100%


Foráneo: 0
0%

Calificados: 5
42%

No Calificados: 7
58%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%

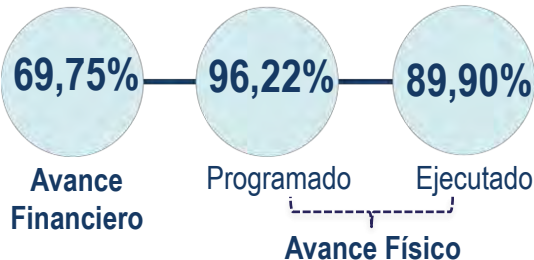

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-636-2021
Valor: \$ 1.403.617.179

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.085.329

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.979.678.330,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 07 – JUN -2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 37

Local: 27
90%


Foráneo: 3
10%

Calificados: 15
56%

No Calificados: 12
44%

Calificados: 3
100%

No Calificados: 0
0%

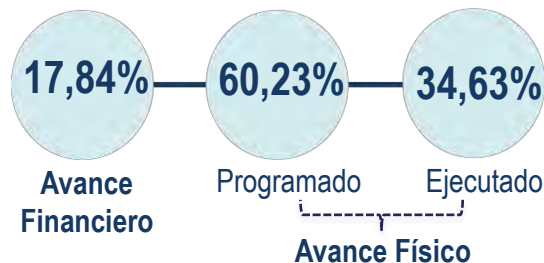

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.484.295.610</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOCA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Piso cámara pluvial tramo 7 quinta paredes



Construcción de andenes Ciudadela Deportiva



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de finalización actualizada: 03 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 14

Total Projectado: 37

Local: 14

100%

Foráneo: 0

0%

Calificados: 6

43%

No Calificados: 8


57%

Calificados: 0

0%

No Calificados: 0

0%

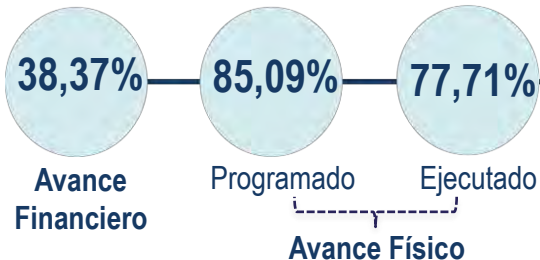

45.589

Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-549-2021 Valor: \$1.830.025.649</p> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOAC CONSTRUCCIONES</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 130.312.324 (Para este contrato)</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz Castro– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021
Fecha de terminación: 16 - AGO - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26
Total Projectado: 20

Local: 19
73%


Foráneo: 7
27%

Calificados: 11
58%

No Calificados: 8
42%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%

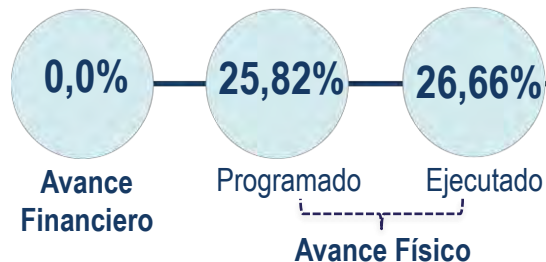

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-550-2021
Valor: \$ 1.282.799.166

Nombre del Contratista:
DIEGO DAVID
MELO CAMPIÑO

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-969-2021
Valor: \$ 82.948.494
(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORIA
PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD
Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)



Revisión de niveles de subbase desde k0+272 hasta k0+230, con topografía de interventoría y obra.



Seriado de subbase con motoniveladora

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

La UNGRD ya dio los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario, en trámite para incorporarlos al contrato de obra y en aprobación ante la Alcaldía de Mocoa el ajuste del proyecto.

45.589
 Personas beneficiadas



Toma de topografía



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897</p>	<p>Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$3.791.334.750,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
Fecha acta de inicio: Pendiente



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Mesas técnicas de revisión entre Contratistas de obra e interventoría. Reunión con comunidad, contratistas de obra e interventoría, supervisión.

45.589
Personas beneficiadas



Reunión con comunidad



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 3.295.952.030</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II

TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

NO. VIVIENDAS	CONTRATISTA	VALOR (Millones)	VALOR ADICIONAL FEBRERO 2022	*AVANCE	AVANCE FINANCIERO
436	CONSORCIO MOCOA 2019	\$25.731.568.960,00	\$ 17.868.431.040,00	33,29%	20%
473	CONSORCIO MOCOA 2019	\$27.915.211.280,00	\$ 19.384.788.720,00	30,89%	17,4%
		\$ 53.646.780.240,00	\$ 37.253.219.760,00		
TOTAL DE VIVIENDAS	909	VALOR TOTAL	\$ 90.900.000.000,00		

Estudios y diseños 98,23% (244), movimiento de tierras 226 terrazas para igual número de viviendas, manzanas intervenidas: T(24), U(24), I(24), J(24), K(24), V(24), W(24), X(24), AE(28), AF(28), AH(12), AG(16), 2 cuadrillas de mano de obra, 1 cuadrilla de movimiento de tierras, Se espera reinicio con los 4 frentes de movimiento de tierras para 09/03/22. Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, dos proveedores de concreto. Pendiente de cobro aprox \$640 millones (48 cimentaciones fundidas). Interventoría realizó observaciones a reprogramación de metas e insumos para 31/07/2022, en ajuste por consorcio. En proceso de elaboración y perfeccionamiento otrosíes de adición Convenio 217 y contratos 243 y 244. Consorcio continúa pagos a subcontratistas y proveedores corte del 05/03/22. Continúa procesos de declaratoria de posible incumplimiento, contratos 243 y 244 de 2018.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	CONTRATISTA HMV INGENIEROS LTDA
	VALOR \$7.049.420.065
	AVANCE FINANCIERO 30,00%

META JULIO 2022

La totalidad de las viviendas se entregarán antes de **finalizar el periodo de gobierno.**

La fecha de culminación no se altera.

 **Julio 31 / 2022**

909



Viviendas terminadas y entregadas en total

43



El futuro es de todos

Presidencia de la República




ACTIVIDADES RELEVANTES



Movimiento de tierras 49,885 m3 de tierra (incluido expansión). 226 terrazas

Consortio informó que Obra reinicia actividades el 21 de febrero de 2022, con cuadrillas de movimiento de tierras y mano de obra para cimentaciones, estructura, instalaciones, se espera lograr ALTO RENDIMIENTO lo antes posible. Se espera para principios de marzo la llegada de otra formaleta. Se realizaron dos reuniones extraordinarias de seguimiento, participaron Vicepresidencia, Minvivienda, UNGRD, Consortio e Interventoría. Consortio entregó reprogramación, UNGRD realizó 2 reuniones con Consortio e Interventoría para orientación trámites ambientales. Se realizó ejercicio para identificar número de viviendas que posiblemente no se podrían construir al continuar esas afectaciones: 200 unds, consorcio sugiere que son 315 unidades. Consortio se comprometió a entregar 272 viviendas en mayo y la totalidad de las viviendas en julio 31 de 2022. Se espera que las gestiones del consorcio ante Corpoamazonía confirmen lo prescrito en la licencia de urbanismo en el sentido de poder construir las 909 viviendas en el predio. Consortio debe terminar gestiones ambientales en febrero.

En proceso de cobro 48 cimentaciones \$640 millones aprox
UNGRD pagó hito estudios y diseños contrato 244 \$3.400 millones aprox

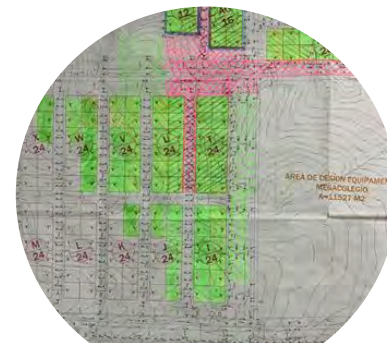

Avance movimiento de tierras



VIVIENDA URBANA SAUCES II



COMPROMISOS REUNIONES 12/25/28 DE ENERO 2022

VICEPRESIDENCIA-MINVIVIENDA-UNGRD.

1

Inventario de materiales para adelantarnos a los posibles problemas, insumos y otros.

Entregado 28 de enero, Interventoría emitió observaciones, en ajuste por Consorcio.

2

Mano de obra en todos los frentes a más tardar en una semana.

Consorcio informó que se normaliza el pago a subcontratistas de mano de obra, movimiento de tierras y proveedores. Reinicio de actividades en la semana del 21 al 25 de febrero. **Se espera ALTO RENDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS.**

3

Reunión con Corpoamazonía
26 de enero Consorcio, Interventoría, MINVIVIENDA, Gobernación, UNGRD

Temas ambientales:

Ocupación de cause costado occidental del predio, posible nacedero en costado sur del predio y captación de agua de un afluente local para proveer insumo hídrico en obra. Se realizó reunión de seguimiento, UNGRD presentó orientaciones a consorcio para el debido trámite de los permisos ante la Corporación. Consorcio presentó borrador a UNGRD e Interventoría para solicitud ante Corpoamazonía, en espera de los estudios para continuar el respectivo acompañamiento de UNGRD e INTERVENTORÍA.

4

A 30 de enero
4 formaletas en obra y 200 obreros activos.

Consorcio informa que para primera semana de marzo de 2022 completa las 4 formaletas en obra y los 200 obreros, las observaciones a la programación aún no la entregan.

5

Reporte diario de gestión

Incluir gestiones ante corporación y aspectos financieros a través de Informe diario de personal. Mantener informado a contratante del estado técnico y financiero de los contratistas de obra. **CUMPLIDO.**

VIVIENDA URBANA SAUCES II

SEMANA I DEL 28 AL 05 DE MARZO DE 2022		TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
CONSORCIO MOCO A 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	8	8	8	8	8			8
CONSORCIO MOCO A 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	2	2	2	2	2			2
INTERVENTORIA HMV	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	8	8	8	8	8			8
TOTAL		18	18	18	18	18	0		18

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
		L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MOCO A 2019	1	2	1	1	2			1
VIGILANCIA CM 2019	CELADURIA OBRA	2	2	2	2	2			2
CONSTRUCTORA EYJ SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	0	6	8	8	8			6
CASTAÑEDA COSNTRUCTORA SAS	CIMENTACION	0	0	0	4	5			2
SINIESTERRA CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	5	7	8	14	15			10
ELECTROSERVIG	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	0	0	0	0	0			0
YENI CONSTANZA MIGUEZ	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	0	0	0	0	0			0
BCH HIDROSANITARIAS SAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	7	5	5	5	5			5
TEJA CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1	1	1	1	1			1
DAVID FRANCISCO ALVAREZ	APROVECHAMIENTO FORESTAL	0	0	0	0	0			0
SEBCO SAS	BOMBA MOVIL DE CONCRETO	0	0	0	0	0			0
TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		16	23	25	35	38	0	0	27
JVC CONSTRUCCIONES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
JVC CONSTRUCCIONES	OPERADORES, PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	OPERADORES	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
LEONEL OJEDA	OPERADORES, PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	1	1	1	1	1			1
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	2	0	2			1
WILSON PUENTES	OPERADORES, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	1	0	0	0			0
TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA		1	2	3	1	3	0	0	2
TOTAL PERSONAL EN EL DIA		17	25	28	54	59	0		29

VIVIENDAS CON EXCAVACION MECANICA										TOTAL	
										226	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0		88
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	SINIESTERRA CONSTRUCTORES S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	CONSTRUCTORA E&j SAS	0	0	0	0	0	0	0	0		30
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	SINIESTERRA CONSTRUCTORA S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIVIENDAS FUNDIDAS MURO SEGUNDO PISO	CONSTRUCTORA E&j SAS	0	0	0	0	0	0	0	0		4
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	0	0	0	0	0	0	0	0		18
										0	
VIVIENDAS MODULADAS (ACERO-INSTALACIONES) PARA CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO										TOTAL	
VIVIENDAS MODULADAS PARA(ACERO-INSTALACIONES) CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	0	0	0	0	0	0	0	0		2

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 50	Local: 25 50%	Calificados: 10 40%
		No Calificados: 15 60%
	Foráneo: 25 50%	Calificados: 10 40%
		No Calificados: 15 60%

36

**VIVIENDAS RURALES
EN SITIO PROPIO**



PROCESO CONTRATO DE OBRA

El 28/09/2021 se adjudicó el proceso N° FNGRD-LP-002-2021 al CONSORCIO OTES MOCOYA 1.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>,

PROCESO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El 03/12/21 se adjudicó el proceso N° FNGRD-CMA-001-2021 al CONSORCIO APOYOS 2022.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376922&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Contrato de obra consorcio Otes Mocoa 1	\$ 2.406.425.590,00
Contrato de interventoría consorcio apoyos 2022	\$ 220.276.140,00
TOTAL INVERSIÓN	\$ 2.626.701.730,00

Nota: Se firmó por parte los contratistas acta de inicio con fecha 26/01/2022 y con fecha de finalización el 25/09/2022.

El contratista de obra presentó los 36 informes diagnóstico de los predios rurales correspondientes a las visitas realizadas. Se adelanta logística y compra de materiales para el inicio de las obras.



3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$19.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 19.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018
Fecha de finalización: 30 - JUN - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 46

Local: 30
65%

Foráneo: 16
35%

Calificados: 6
20%

No Calificados: 24
80%

Calificados: 13
81%

No Calificados: 3
19%

39,97%

Avance
Financiero

70,91%

Programado

69,97%

Ejecutado

Avance Físico



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consorcio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

SUPERVISOR UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello -
Subdirección para la Reducción del Riesgo



ENTIDADES PARTICIPANTES:
 USPEC - INPEC - ALCALDIA DE MOCOA - UNGRD

ALCANCE:
 Compra de predio de 11 hectáreas para la construcción de nuevo ERON y su escrituración y registro.

ESTADO:
 La UNGRD cumplió con su compromiso de financiación al **100%**

La Alcaldía de Mocoa se encuentra en proceso de adquisición del predio.

RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ETAPA

2

ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	31-MAY-2022
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	94 %
% EJECUTADO ETAPA I Y II	90%
ESTADO	Proyecto en ejecución, se adelanta actividades de instalación de micromedidores, así como empalmes de válvulas Reguladoras de Presión. Se encuentran culminados y en funcionamiento los componentes de planta de tratamiento de agua potable, empalmes en líneas de conducción y redes de distribución.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

4.

PROYECTOS EN CONTRATACIÓN

Impacto

33 Intervenciones – obras de estabilización y recuperación



Actores e inversión

\$206.257 Millones

FNGRD - UNGRD



AVANCES

- Estudios y diseños de obras de mitigación para los sectores medio y alto de las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y parte alta de la quebrada Taruca.
- Se asignaron los recursos para la ejecución de las obras de mitigación.
- Estructuración de 11 procesos de obra y 11 de interventoría en etapa precontractual.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

2023

Mes:

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN -DIC

ENE - OCT

1

Estructuración de los procesos (Precontractual).

1

mes

2

Proceso de contratación.

1.5

mes

3

Ejecución de obras.

18





AVANCES

Impacto **87 Familias**



Actores e inversión

\$ 9.309 Millones

- \$ 5.763 millones: Fonvivienda
- \$ 3.545 millones: FNGRD - UNGRD

- Se adelantan los trámites para la incorporación de los recursos al convenio.
- Equipo de trabajo de la UNGRD realizó desplazamiento al municipio de Mocoa para realizar visita al predio. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la UNGRD y la alcaldía con el fin de verificar los requisitos de postulación del predio.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración	2022												2023		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP-DIC	ENE-MAY	Mes:	Mes:			
1 Incorporación recursos al convenio	2 semanas															
2 Postulación y adquisición predio	4 meses															
3 Proceso precontractual contratación obra	3 semanas															
4 Proceso precontractual contratación interventoría	2 semanas															
5 Ejecución fase I contratos de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	3 meses															
6 Ejecución fase II contratos de obra - construcción proyecto 87 viviendas y obras de urbanismo	9 meses															

NOTA: Los tiempos anteriores dependerán de la postulación del predio por parte de la Alcaldía de Mocoa.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



AVANCES

- A la fecha se cuenta con el aval técnico del BAC para iniciar la ejecución del proyecto de vivienda.
- De las 216 viviendas presentadas al BAC se encuentran avaladas **211**. Pendientes por viabilizar 5 correspondiente a la comunidad indígena.

El 28 de enero mediante comunicación interna N° 2022IE00693, se radicó en el área de Gestión Contractual solicitud de información a proveedores a través del SECOP II. Esta a su vez fue cargada a la plataforma del SECOP II el 01/02/2022. Link de la publicación:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2806008&isFromPublicArea=True&isModal=False>.

Así mismo, el 10/02/2022 se recibieron 6 cotizaciones y teniendo en cuenta la metodología de la guía para la elaboración de estudios de sector de Colombia compra eficiente (media podada) el proyecto se calculó en veinticinco mil seiscientos veintiocho millones ciento cuarenta mil doscientos diez pesos M/CTE (\$25.628.140.210).

Impacto **216 Familias**

Actores e inversión

\$ 32.107 Millones

- \$ 22.590 millones: FNGRD - UNGRD
- \$ 9.517 millones: BAC

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración
(meses)

2022
Mes:

2023
Mes:

FEB MAR ABR MAY JUN JUL - DIC ENE-MAY

ACTIVIDAD	Duración (meses)	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-MAY
1 Proceso para la contratación de las obras de vivienda VISR.	2	■	■	□	□	□	□	□
2 Proceso para la contratación de la interventoría de vivienda VISR.	2	□	□	■	■	□	□	□
3 Ejecución fase I contrato de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	1	□	□	□	□	■	□	□
4 Ejecución fase II contrato de obra - construcción proyecto 216 viviendas y obras de urbanismo (20 viviendas por mes)	10	□	□	□	□	□	■	■



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO

Impacto

435 Comerciantes beneficiados de forma directa

Actores e inversión

\$18.976 Millones

FNGRD - UNGRD

• FNGRD – UNGRD y Municipio de Mocoa



AVANCES

- El 28 de enero de 2022 se suscribió el convenio 9677-PPAL001-522-2022, con el municipio de Mocoa.
- El 01 de marzo de 2022 se recibieron 2 cotizaciones, se están revisando y ajustando valores de acuerdo a lo propuesto y los precios del mercado para iniciar proceso de contratación.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022						2023	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-NOV
1 Estructurar Convenio con Municipio de Mocoa	2	■	■						
2 Estructurar proceso licitatorio de obra e interventoría	2	■	■						
3 Publicación y adjudicación contrato de obra (Ley 80)	2			■	■				
4 Publicación y adjudicación contrato de Interventoría (Ley 80)	2				■	■			
5 Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	5 días					■			
6 Ejecución fase I contrato de obra - revision estudios y diseños	1					■	■		
7 Ejecución fase II contrato de obra - construcción de la galería de la plaza de mercado	17						■	■	



Impacto

16 barrios **2.522** usuarios

Actores e inversión

\$7.500 Millones

FNGRD - UNGRD

- Viceministerio de agua y Saneamiento Básico, Findeter y FNGRD – UNGRD.



AVANCES

- Se suscribió convenio No. 9677-PPAL001-463-2022, entre el FNGRD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El 16/02//2022 se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos No. 9677-PPAL001-609-2022, celebrado con Findeter.
- Se encuentra en trámite los procesos de contratación de estudios y diseños, obra e interventoría, por parte de Findeter.

ACTIVIDAD

2022

Mes:

Duración

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY-NOV

DIC

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY-NOV	DIC
1	Suscripción del convenio con el Viceministerio de agua y saneamiento básico	2 semanas					
2	Suscripción del contrato con Findeter para la ejecución del proyecto	2 semanas					
3	Creación del patrimonio autónomo y trámites precontractuales	2 semanas					
4	Proceso de contratación obra e interventoría	5 semanas					
5	Legalización de los contratos de obra e interventoría	1 semana					
6	Ejecución	8 meses					



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN SAT MOCOA



Impacto **45.589** Personas beneficiadas

Actores e inversión
\$553 Millones
FNGRD - UNGRD



AVANCES

- Se asignaron los recursos para el fortalecimiento del SAT.
- Proceso radicado en el GGC para revisión e iniciar proceso de invitación a presentar propuestas.


CRONOGRAMA

ACTIVIDAD		Duración (meses)	2022 Mes:				
			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
1	Proceso contratación	2	■	■	□	□	□
2	Ejecución de actividades	3	□	□	■	■	■

5.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

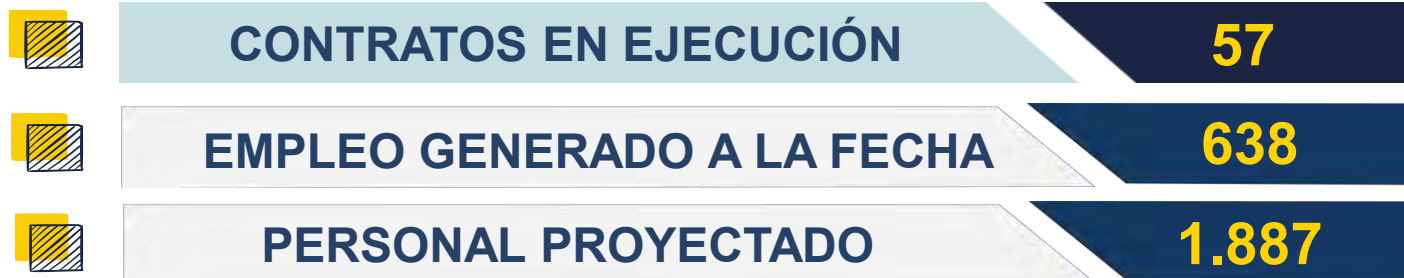

	22/02/22	9/03/22		22/02/22	09/03/22
MANO DE OBRA LOCAL	435	460	MANO DE OBRA FORÁNEA	168	178
CALIFICADOS	186	196	CALIFICADOS	133	139
NO CALIFICADOS	246	264	NO CALIFICADOS	35	39
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	72%	72%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	28%	28%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.148	1.544
EMPLEOS INDUCIDOS	255	343
TOTAL EMPLEOS	1.403	1.887

GRACIAS
