

# SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Enero 12 de 2022



# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**1.**

# SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

## OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

**\$175.603 millones**



Total de contratos

**18 de obra**

Ejecución

**18**

% en Perfeccionamiento ejecución

**100%**

**13 de interventoría**

**13**

**100%**

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

## OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y  
ALCANTARILLADO

**\$39.525 millones**



Total de contratos

**13 de obra**

Ejecución

**13**

% en Perfeccionamiento ejecución

**100%**

**4 de interventoría**

**4**

**100%**

**1.1**

# SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

# AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



# CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.844.159.281,86	21,74%	32,47%	\$ 10.664.498.518,82	81,80%	\$ 26.866.522.292,56	+ 49,33%
3	\$ 4.706.751.939,00	0%	74,92%	\$ 3.526.298.552,70	66,95%	\$ 3.151.170.423,16	-7,97%
4	\$ 6.115.409.901,98	0%	51,00%	\$ 3.118.859.050,01	39,00%	\$ 2.385.009.861,77	-12,00%
5	\$ 7.488.477.539,43	0%	21,00%	\$ 1.572.580.283,28	19,03%	\$ 1.425.057.275,75	-1,97%
6	\$ 11.015.788.965,85	0%	33,00%	\$ 3.635.210.358,73	31,00%	\$ 3.414.894.579,41	-2,00%
7	\$ 12.263.393.477,06	0%	36,50%	\$ 4.476.138.619,13	22,02%	\$ 2.700.399.243,65	-14,48%
8	\$ 7.204.019.704,53	28,06%	39,31%	\$ 2.831.900.145,85	42,65%	\$ 3.072.514.403,98	+ 3,34%
9	\$ 6.827.896.668,28	36,37%	27,75%	\$ 1.894.741.325,45	39,05%	\$ 2.666.293.648,96	+ 11,30%
10	\$ 5.707.351.594,38	0%	29,29%	\$ 1.671.683.281,99	34,03%	\$ 1.942.211.747,57	+ 4,74%
11	\$ 16.651.641.771,25	0%	21,37%	\$ 3.558.455.846,52	29,36%	\$ 4.888.922.024,04	+ 7,99%
12	\$ 26.536.775.722,39	0%	40,20%	\$ 10.667.783.840,40	26,80%	\$ 7.111.855.893,60	-13,40%
13	\$ 2.943.285.850,62	0%	46,81%	\$ 1.377.752.106,68	37,03%	\$ 1.089.898.750,48	-9,78%
14	\$ 2.096.212.362,12	0%	18,45%	\$ 386.751.180,81	9,31%	\$ 195.157.370,91	-9,14%
15	\$ 6.705.288.187,44	0%	2,70%	\$ 181.042.781,06	1,66%	\$ 111.307.783,91	-1,04%
16	\$ 8.981.109.127,00	0%	1,78%	\$ 159.863.742,46	0,93%	\$ 83.524.314,88	-0,85%
17	\$ 8.470.387.014,00	0%	18,87%	\$ 1.598.362.029,54	3,07%	\$ 260.040.881,33	-15,80%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	2,01%	\$ 96.807.393,56	1,02%	\$ 49.126.140,02	-0,99%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 171.374.237.344,19</b>			<b>\$ 51.418.729.056,99</b>		<b>\$ 61.413.906.636,00</b>	
				<b>30,00%</b>		<b>35,83%</b>	

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 4.201.825.861**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES  
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019  
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019  
Fecha de terminación: 28 - DIC – 2021



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

**CONSTRUCCIÓN** de muro de contención  
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

### Estado Actual:

Obra finalizada el 28/DIC/2021



**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960
<b>Nombre del Contratista:</b> Virgilio Bravo Sosa	<b>Nombre de la Interventoría:</b> Yahara Maritza Viveros Ortiz
<b>Supervisor UNGRD</b> Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Pantalla



Instalación baranda

## ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto  
**\$ 32.844.159.281,86**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020  
 Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020  
 Fecha de terminación: 14 - JUN - 2022  
 Fecha de Inicio suspensión: 24-DIC-2021




**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de 1050 ml

**Estado Actual:**  
 El 20 de diciembre del presente año se radicó trámite de suspensión del contrato de obra e interventoria, por un tiempo de 4 meses.

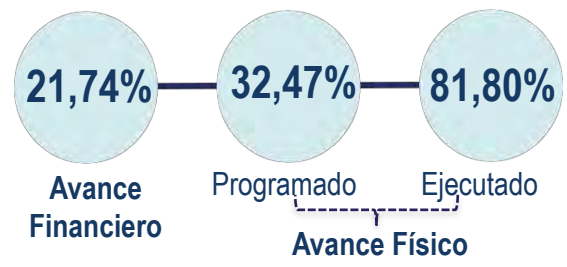

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-977-2020                  Valor: \$ 30.418.456.852,86</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-1365-2020                  Valor: \$ 2.425.702.429,00</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b>                  INGECON SA</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTER JARILLON 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 4.706.751.939,00**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES  
 Fecha de suscripción: 01 - OCT - 2020  
 Fecha acta de inicio: 12 - FEB - 2021  
 Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra:8  
 Total Projectado:30

Local: 3  
**37,5%**


Foráneo: 5  
**62,5%**

Calificados: 3  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**


Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

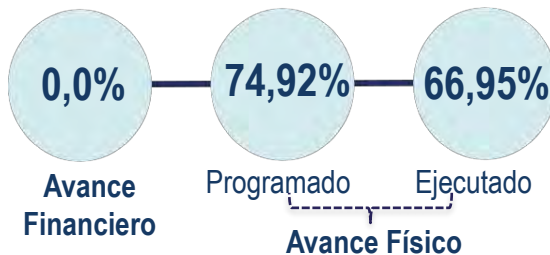

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-1025-2020                  Valor: \$4.302.041.377,00</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b>                  CONSORCIO RECUPERACIÓN                  MOCOCA LH 2020</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-139-2020                  Valor: \$ 404.710.562,00                  (valor para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	

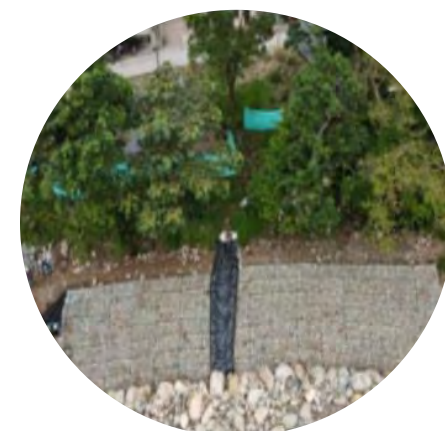

**ALCANCE**

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 6.115.409.901,98**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020  
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021  
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 7  
Total Projectado: 25

Local: 3  
**43%**


Foráneo: 4  
**57%**

Calificados: 3  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

Calificados: 4  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

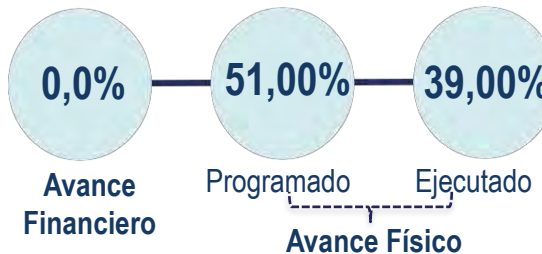

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-980-2020 Valor: \$ 5.710.699.339,98</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> HAROLD MUÑOZ MUÑOZ</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 7.488.477.539,43**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021  
Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

**CONSTRUCCIÓN** de 2 diques

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 30  
Total Projectado: 35

Local: 22  
**73%**

Foráneo: 8  
**27%**

Calificados: 14  
**64%**

No Calificados: 8  
**36%**

Calificados: 8  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**



**45.589**  
Personas beneficiadas

Ya se adelantan los trabajos con Hidroconsulta.

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.924.254.899,43</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO RIO MULATO.</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 564.222.640,00</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



vaciado de concreto dentellón del Dique 2



**ALCANCE**

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto  
**\$ 11.015.788.965,85**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES  
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020  
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local: 30 <b>79%</b>	Calificados: 14 <b>47%</b>
		No Calificados: 16 <b>53%</b>
	Foráneo: 8 <b>21%</b>	Calificados: 8 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

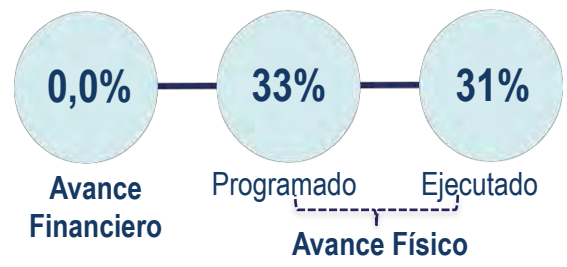


**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
<b>Nombre del Contratista:</b> CDF INGENIERIA SAS	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERDIQUE 2020
<b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Armado de gaviones y colchagaviones sobre el azud 4

- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
  - Muro 1
  - Azud 05
  - Muro 2
  - Azud 04
  - Muro 3

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto  
**\$ 12.263.393.477,06**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021  
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

<b>PERSONAL EN OBRA</b>	Local: 18 <b>82%</b>	Calificados: 6 <b>33%</b>
		No Calificados: 12 <b>67%</b>
	Foráneo: 4 <b>18%</b>	Calificados: 4 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>
Total Obra: 22		
Total Projectado: 45		

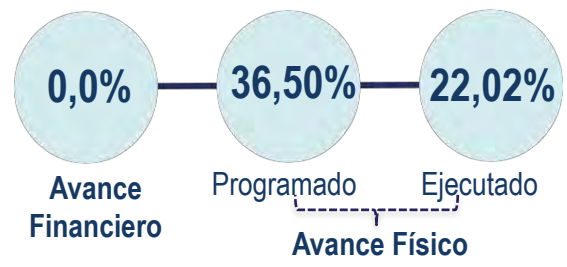

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO MUROS MOCOCA
<b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Visita técnica de evaluación, Azud 12



Visita técnica de evaluación, Muro 4

 **ALCANCE**

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

**\$ 7.204.019.704,53**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25  
Total Projectado: 35

Local: 18  
**72%**


Foráneo: 7  
**28%**

Calificados: 7  
**39%**

No Calificados: 11  
**61%**

Calificados: 5  
**71%**

No Calificados: 2  
**29%**

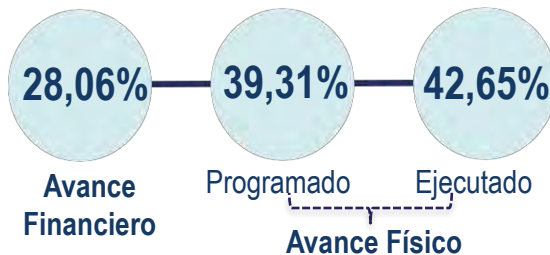

**45.589**  
Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-1388-2020  
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO DIQUE 1

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-345-2021  
Valor: \$ 536.303.878,1967

(para este contrato)  
Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
MOCOCA 2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Fundición tabique



Fundición dentellón 6



**ALCANCE**

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 6.827.896.668,28**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021  
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21  
Total Projectado: 35

Local: 11  
**52%**


Foráneo: 10  
**48%**

Calificados: 6  
**55%**

No Calificados: 5  
**45%**

Calificados: 6  
**60%**

No Calificados: 4  
**40%**

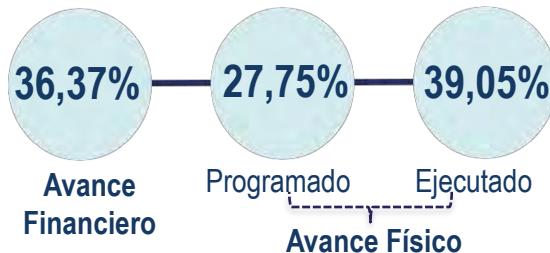

**45.589**  
Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-1023-2020  
Valor: \$ 6.319.593.302,48

**Nombre del Contratista:**  
CONSORCIO MURO RIO  
MOCOA

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-345-2021  
Valor: \$ 508.303.365,8033  
(para este contrato)

**Nombre de la Interventoría:**  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
MOCOA 2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Fundición ciclópeo



Formaletas para ciclópeo de tabiques



### ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 5.707.351.594,38**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020  
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021  
 Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

#### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19  
 Total Projectado: 35

Local: 14  
**74%**


Foráneo: 5  
**26%**

Calificados: 6  
**43%**

No Calificados: 8  
**57%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

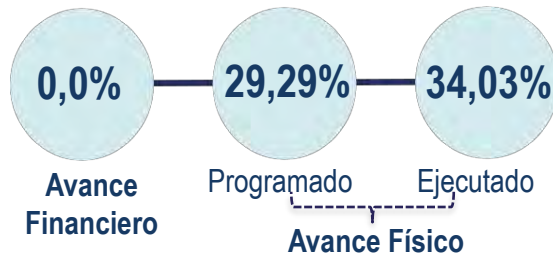

**45.589**  
 Personas beneficiadas

#### Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1119-2020  
 Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:  
 A&A CONSULTORIA E  
 INGENIERIA SAS

#### Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021  
 Valor: \$ 426.384.755,43

(para este contrato)  
 Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO INTERVENTORES  
 DDA MOCOCA

#### Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Protección lateral Derecha Dique 11



Limpeza Vías Acceso Dique 11



**ALCANCE**

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 16.651.641.771,25**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020  
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

#### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 52  
Total Projectado: 45

Local: 32  
**62%**


Foráneo: 20  
**38%**

Calificados: 6  
**19%**

No Calificados: 26  
**81%**

Calificados: 8  
**40%**

No Calificados: 12  
**60%**

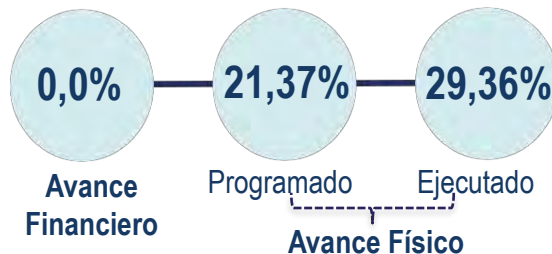

**45.589**  
Personas beneficiadas

#### Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1064-2020  
Valor: \$ 15.407.631.114,68

Nombre del Contratista:  
UNIÓN TEMPORAL OBRAS  
RIO SANGOYACO 2020

#### Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021  
Valor: \$ 1.244.010.656,57  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORES  
DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Excavaciones Jarillón 02



Materiales Construcción



### ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 26.536.775.722,39**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 60  
Total Projectado: 61

Local: 45  
**75%**


Foráneo: 15  
**25%**

Calificados: 21  
**47%**

No Calificados: 24  
**53%**

Calificados: 13  
**87%**

No Calificados: 2  
**13%**

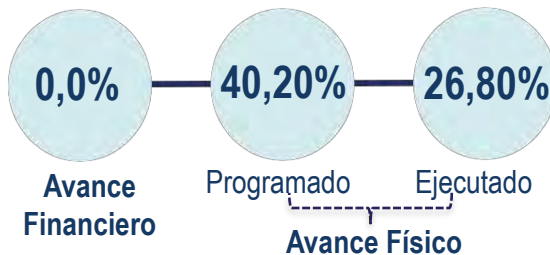

**45.589**  
Personas beneficiadas



#### Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1382-2020  
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO DRAGADO  
MOCOA 2020

#### Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-205-2021  
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO  
INTERDRAGADOS MOCOA

#### Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

- Jarillón
- Espolones



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 2.943.285.850,62**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 09 – MAR – 2021  
 Fecha acta de inicio: 03 – MAY – 2021  
 Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de azud.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 38

Total Projectado: 37

Local: 19  
**50%**


Foráneo: 19  
**50%**

Calificados: 11  
**58%**

No Calificados: 8  
**42%**

Calificados: 18  
**95%**

No Calificados: 1  
**5%**

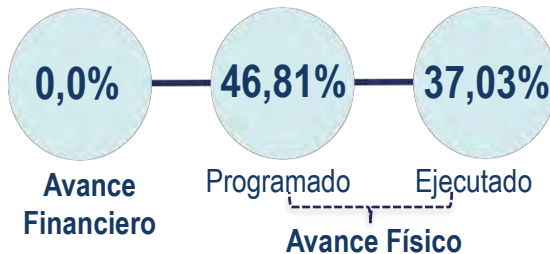

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-311-2021                  Valor: \$ 2.723.478.287,36</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b>                  CONSORCIO MIRAVALLE</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-110-2021                  Valor: \$ 219.807.563,26                  (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTERVENTORIA                  PUTUMAYO 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Formaleta para dentellones



**ALCANCE**

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOÁ

Valor total del proyecto

**\$ 2.096.212.362,12**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones

**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto y muro de protección.

#### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15

Total Projectado: 30

Local: 10

**67%**

Foráneo: 5

**33%**

Calificados: 10

**100%**

No Calificados: 0


**0%**

Calificados: 5

**100%**

No Calificados: 0

**0%**

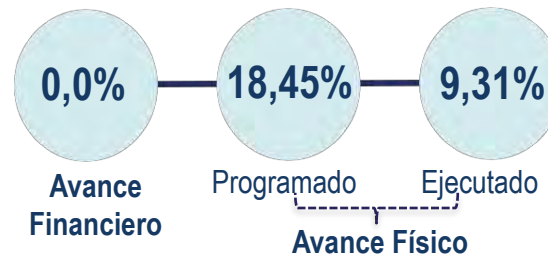

**45.589**  
Personas beneficiadas

Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER – MOCOÁ 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición Dentellón Azud 15



Actividades Ambientales Azud 15



### ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 6.705.288.187,44**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021  
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021  
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021  
 Fecha acta de reinicio: 19 – OCT - 2021  
 Fecha de terminación actualizada: 14 - MAR – 2023



### TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.



#### Estado Actual:

Se tiene ajuste de diseño presentado por Hidroconsulta, se tienen aprobados PMT, PGS, PMA y protocolos de Bioseguridad. Inició obra física el 5 de enero del 2022.

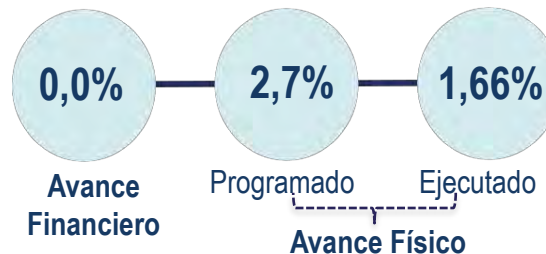

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-323-2021                  Valor: \$ 6.202.006.626,11</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b>                  CONSORCIO EVI5</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-133-2021                  Valor: \$ 503.281.561,33                  (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTER –                  MOCOCA 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	

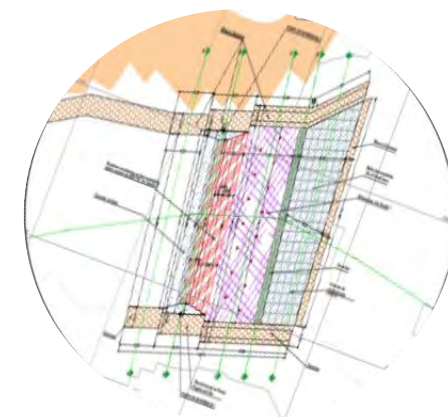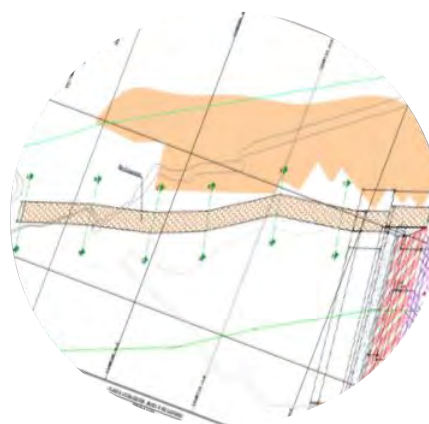

### ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10



### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 8.981.109.127**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra**

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021  
Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021  
Fecha de terminación: 10 - MAY -2023



### TIPO DE INTERVENCIÓN


**Obras estabilización y recuperación**

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

#### Estado Actual:

Tala de árboles autorizados por Corpoamazonia.  
Se tienen aprobados PMA, PMT, PGS y protocolo de bioseguridad. Esta semana se inició la construcción del campamento y ejecución de obra física.

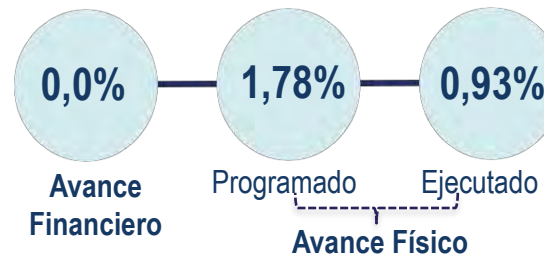

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.027</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO AZUD MOCOA 520</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOA 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



*Tala de individuos autorizados por Corpoamazonia.*



### ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 8.470.387.014**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 12  
 Total Projectado: 40

Local: 7  
**58%**


Foráneo: 5  
**42%**

Calificados: 7  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

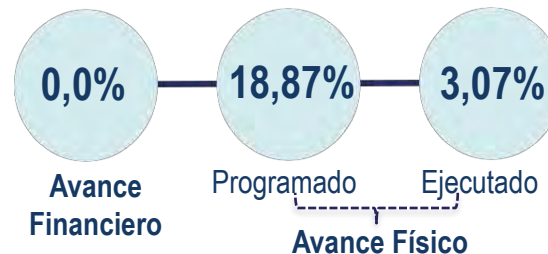

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-639-2021                  Valor: \$ 7.838.331.969</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b>                  CONSORCIO                  CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-110-2021                  Valor: \$ 632.055.045                  (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTERVENTORIA                  PUTUMAYO 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Adecuación vía de acceso Azud 5 Q. Taruca.



**ALCANCE**

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 4.816.288.237,00**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES  
Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021  
Fecha acta de inicio: 05- ENE – 2022  
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2023

**TIPO DE INTERVENCIÓN**


Obras de drenaje

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

**Estado Actual:**

Revisión en campo de los diseños de tres estructuras de drenaje aprobadas por interventoría, para implantarlas en el terreno e iniciar ejecución física.

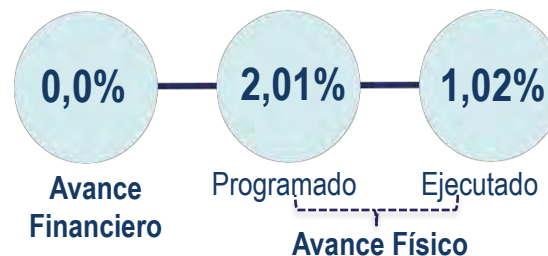

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-183-2021 Valor: \$ 4.452.771.492,00</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-743-2021 Valor: \$ 363.516.745,00</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Visita técnica sobre río Sangoyaco



**ALCANCE**

**Construcción:**

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos



**1.2**

# SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

# AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



# CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$ 8.840.532.147,00	0,00%	44,15%	\$ 3.903.094.942,90	32,74%	\$ 2.894.390.224,93	-11,41%
2	\$ 1.348.270.441,00	89,01%	98,28%	\$ 1.325.080.189,41	95,11%	\$ 1.282.340.016,44	-3,17%
3	\$ 2.485.717.595,00	0,00%	73,60%	\$ 1.829.488.149,92	61,45%	\$ 1.527.473.462,13	-12,15%
4	\$ 1.089.926.762,00	49,41%	91,48%	\$ 997.065.001,88	91,48%	\$ 997.065.001,88	0,00%
5	\$ 3.025.192.404,00	0,00%	100,00%	\$ 3.025.192.404,00	100,00%	\$ 3.025.192.404,00	0,00%
6	\$ 1.291.868.311,00	90,00%	100,00%	\$ 1.291.868.311,00	100,00%	\$ 1.291.868.311,00	0,00%
7	\$ 2.887.755.648,00	0,00%	18,55%	\$ 535.678.672,70	18,55%	\$ 535.678.672,70	0,00%
8	\$ 1.342.679.025,00	69,75%	75,87%	\$ 1.018.690.576,27	71,26%	\$ 956.793.073,22	-4,61%
9	\$ 4.764.101.025,00	0,00%	36,03%	\$ 1.716.505.599,31	25,16%	\$ 1.198.647.817,89	-10,87%
10	\$ 1.960.337.973,00	0,00%	70,07%	\$ 1.373.608.817,68	58,60%	\$ 1.148.758.052,18	Suspendido el 25/12/21 Reinicio 1/02/22
11	\$ 1.365.747.660,00	0,00%	20,84%	\$ 284.621.812,34	12,89%	\$ 176.044.873,37	-7,95%
12	\$ 6.644.038.095,94	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$ 2.435.104.449,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.481.271.535,94</b>			<b>\$ 17.300.894.477,42</b>		<b>\$ 15.034.251.909,73</b>	
				<b>43,82%</b>		<b>38,07%</b>	



### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 8.840.532.147**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES  
 Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021  
 Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021  
 Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

### IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local: 5 <b>45%</b>	Calificados: 4 <b>80%</b>
		No Calificados: 1 <b>20%</b>
	Foráneo: 6 <b>55%</b>	Calificados: 6 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

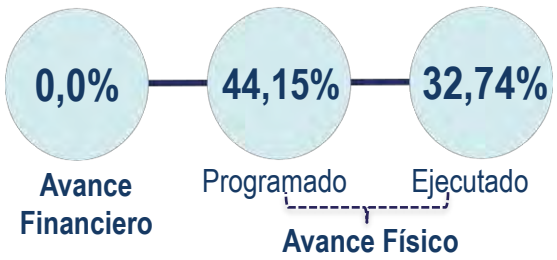

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO VIAS MOCOA 040	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER VIAS
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

# 2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$1.348.270.441**

## EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 18 - ENE – 2022




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

### IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 24 Total Projectado: 25	Local: 22 <b>92%</b>	Calificados: 12 <b>55%</b>
		No Calificados: 10 <b>45%</b>
	Foráneo: 2 <b>8%</b>	Calificados: 0 <b>0%</b>
		No Calificados: 2 <b>100%</b>

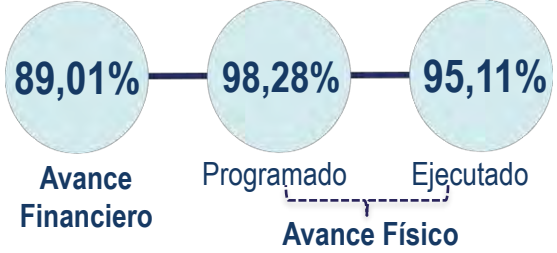

 **45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
<b>Nombre del Contratista:</b> JAVIER GUSTAVO OSPINA	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Relleno con material seleccionado

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

 **ALCANCE**



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 2.485.717.595**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021

Fecha de terminación: 18 – ENE – 2022




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 8 Total Projectado: 25	Local 8 <b>100%</b>	Calificados 5 <b>63%</b>
		No Calificados 3 <b>37%</b>
	Foráneo 0 <b>0%</b>	Calificados 0 <b>0%</b>
		No Calificados 0 <b>0%</b>

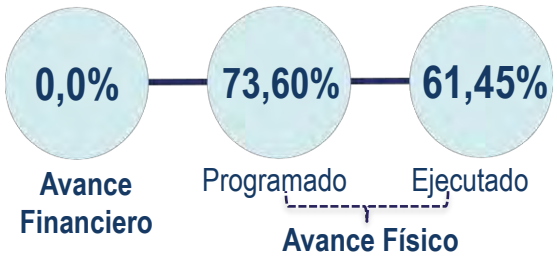


**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Fundición de placas barrio Piñayaco

**✓ ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

### ACTORES E INVERSIÓN


**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**  
**\$ 1.089.926.762**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES  
 Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021  
 Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021  
 Fecha de finalización actualizada por suspensión:  
 18 - ENE - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

### IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

**Estado Actual:**  
 Contrato suspendido desde el 06/12/2021 hasta 13/01/2022, fecha de reinicio 14/01/2022.  
 A la espera de movimiento de postes de energía.

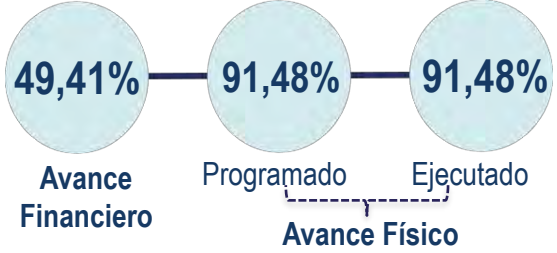

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-407-2021                  Valor: \$ 1.017.658.395</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-551-2021                  Valor: \$ 72.268.367</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b>                  ALEX ALBERTO CALVACHE                  MENA</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTER                  5HG</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto  
**\$ 3.025.192.404**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES  
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021  
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

**Estado Actual:**  
Obra finalizada el 05/01/2022



 **45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO VIAS DE MOCOA	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Diana Tramo I.
  - Barrio Villa Diana Tramo IV.
  - Barrio Villa Diana Tramo VI.

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 1.291.868.311**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 18 - NOV - 2021



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación de **1 vía**

**Estado Actual:**  
 Obra finalizada el 18/11/2021

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-518-2021                  Valor: \$ 1.206.210.066</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-551-2021                  Valor: \$ 85.658.245</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b>                  UNION TEMPORAL                  CAIMARON</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTER                  5HG</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



**45.589**  
 Personas beneficiadas



Vía pavimentada



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.



### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

**\$ 2.887.755.648**

### EJECUTOR


**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión: 18 - MAY - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 8 Total Projectado: 25	Local: 7 <b>88%</b>	Calificados: 3 <b>43%</b>
		No Calificados: 4 <b>57%</b>
	Foráneo: 1 <b>12%</b>	Calificados: 1 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

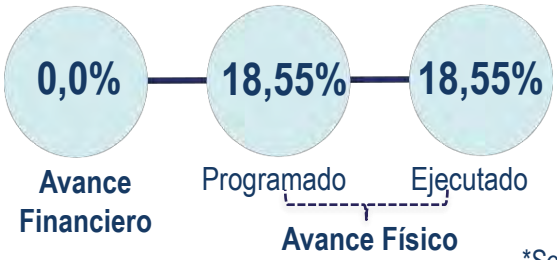

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO ORC 2020	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Fundición de placas



\*Se realizó reprogramación por prórroga

**ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
  - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
  - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
  - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
  - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
  - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
  - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$1.342.679.025**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada por prórroga:

09 - MAR - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

#### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 18

Total Proyectado: 25

Local: 18  
**100%**


Foráneo: 0  
**0%**

Calificados: 7  
**39%**

No Calificados: 11  
**61%**

Calificados: 0  
**0%**

No Calificados: 0  
**0%**

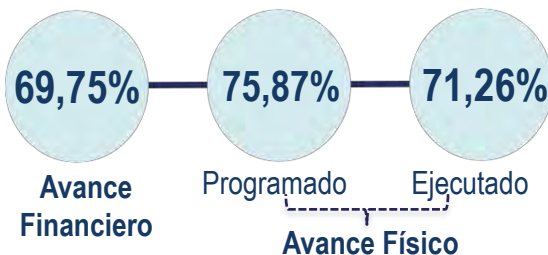

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.329</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de aceros, fundición de bordillos



### ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 4.764.101.025**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra**



Plazo: **OCHO (8) MESES**  
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021  
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021  
Fecha de terminación: 07 – MAR -2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 30  
Total Projectado: 37

Local: 27  
**90%**


Foráneo: 3  
**10%**

Calificados: 15  
**56%**

No Calificados: 12  
**44%**

Calificados: 3  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

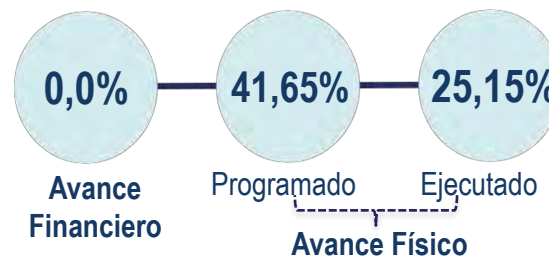

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



*Encamado para instalación de tubería pluvial de 12". Tramo 10. Quinta Paredes.*



*Visita técnica Int. Supervisión (Aparición de grandes rocas)– Tramo 10 Quinta paredes.*



**ALCANCE**

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.



**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 1.960.337.973**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

**Plazo:** CINCO (5) MESES

**Fecha de suscripción:** 29 – ABR – 2021

**Fecha acta de inicio:** 06 – JUL – 2021

**Fecha de finalización actualizada por suspensión:**  
 24 - FEB - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

**Pavimentación de 1 vía**

**Estado Actual:**

Contrato suspendido desde el 25/12/2021 hasta el 31/01/2022, fecha de reinicio 01/02/2022.

Motivo: Interfiere con el acceso al relleno sanitario del municipio de Mocoa y Villagarzón, por solicitud de la empresa EMAS se reanudarán actividades en mes de febrero ya para esta fecha bajaría el volumen de residuos sólidos.



*Fundición de placa huella*

**45.589**

**Personas beneficiadas**



**Contrato de Obra**

No. 9677-PPAL001-549-2021

Valor: \$1.830.025.649

**Nombre del Contratista:**

CONSORCIO PAVIMENTOS  
 MOAC CONSTRUCCIONES

**Contrato de Interventoría**

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 130.312.324

(Para este contrato)

**Nombre de la Interventoría:**

CONSORCIO INTER 5HG

**Supervisor UNGRD**

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 1.365.747.660**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES  
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021  
Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021  
Fecha de terminación: 16 - MAY - 2022

### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR**  
intervenciones de vías urbanas.

#### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25  
Total Projectado: 20

Local: 18  
**72%**


Foráneo: 7  
**28%**

Calificados: 10  
**56%**

No Calificados: 8  
**44%**

Calificados: 7  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

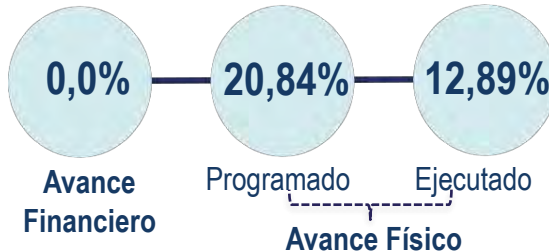

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 6.644.038.095,94**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

#### Estado Actual:

La UNGRD ya dio los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario, en trámite para incorporarlos al contrato de obra y en aprobación ante OCAD municipal del ajuste del proyecto.

**45.589**  
Personas beneficiadas



Evidencia fotográfica de las condiciones actuales del tramo a intervenir

#### Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-900-2021

Valor: \$ 6.240.520.933

#### Nombre del Contratista:

CONSORCIO VIAS 897

#### Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-969-2021

Valor: \$ 403.517.162,94

#### Nombre de la Interventoría

CONSORCIO INTERVENTORIA  
PAVIMENTOS 063

#### Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



### ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 2.435.104.449**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES  
 Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021  
 Fecha acta de inicio: Pendiente



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas


## IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

### Estado Actual:

En revisión de rediseño alcantarillado Pluvial por parte interventoría.

**45.589**  
 Personas beneficiadas

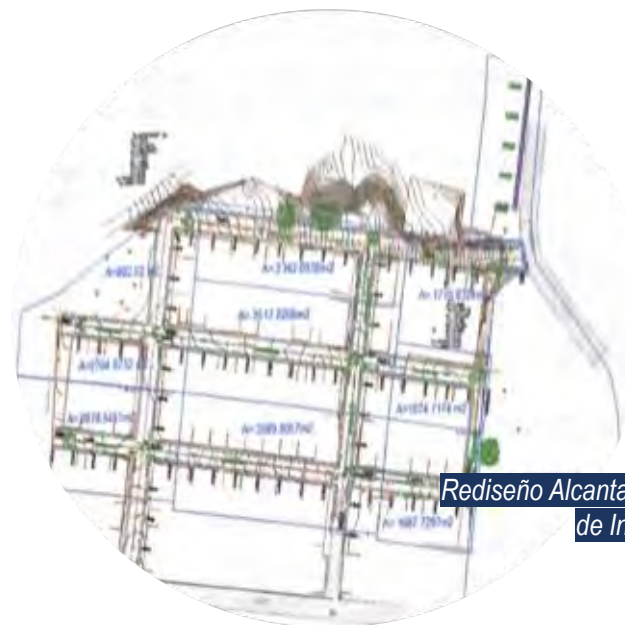

Rediseño Alcantarillado Pluvial en revisión de Interventoría..

**Contrato de Obra**  
 No. 9677-PPAL001-1113-2021  
 Valor: \$ 2.435.104.449

**Nombre del Contratista:**  
 MEGACONSTRUCCIONES  
 S.A.S

**Contrato de Interventoría**  
 No. 9677-PPAL001-774-2021  
 Valor: \$ 495.382.720

**Nombre de la Interventoría:**  
 CONSORCIO  
 INTERPAVIMENTOS EDUPAC

**Supervisor UNGRD**  
 Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa



## ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.



**2.**

# SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL



# VIVIENDA URBANA SAUCES II

Informe corte: 07 de enero de 2022

## CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

NO. VIVIENDAS



436

CONTRATISTA

CONSORCIO MOCOA 2019

VALOR

\$25.732 millones

\*AVANCE



33,27%

AVANCE FINANCIERO

20%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,89%

5%

TOTAL DE  
VIVIENDAS



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

Estudios y diseños 98,23% (244), movimiento de tierras 224 terrazas para igual número de viviendas. Continúa figuración de hierro para cimentaciones, manzanas intervenidas: T(24), U(24), I(24), J(24), K(24), V(24), W(24), X(24), AE(28), AF(28), AH(12), AG(16), 4 cuadrillas de mano de obra, Cuadrillas mano de obra instalaciones, 4 frentes de movimiento de tierras. Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, dos proveedores de concreto. Pronto pago hito 3, 24 cimentaciones fundidas \$318 millones. En perfeccionamiento ajustes contratos 243 y 244, ajuste cumplimiento metas entrega de viviendas hasta 31/07/2022. En trámite quinto pago \$708 millones, contrato 277 interventoría.

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$7.049.420.065

Avance financiero

20,05%

## METAS DICIEMBRE 2021

La totalidad de las viviendas se entregarán antes de finalizar el periodo de gobierno.

La fecha de culminación no se altera (julio 2022).





## ACTIVIDADES RELEVANTES




**Movimiento de tierras**  
**49,885 m<sup>3</sup>** de tierra  
 (incluido expansión).



**Obra cerró el 29/DIC/21**  
 motivo: Incumplimiento pago  
 a contratista Sinisterra.  
 Consorcio realizó pago el  
 30/DIC/21  
 Reinicio actividades de obra:  
 4/ENE/22.



**En comité de obra se**  
**solicitó** al consorcio  
 incrementar el número  
 de personal y acelerar  
 movimiento de tierras  
 para cumplir metas a  
 31/JUL/22.

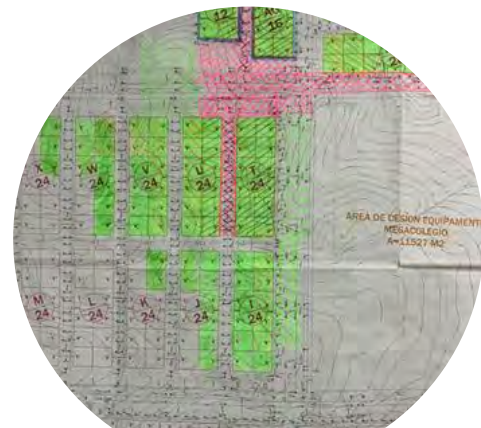

Avance movimiento de tierras



VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION						TOTAL
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	2	0	0		86
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	SINIESTERRA CONSTRUCTORES S.A.S	0	0	0		
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES S.A.S	2	0	0		
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO						TOTAL
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	CONSTRUCTORA E&J SAS	0	0	0		30
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	SINIESTERRA CONSTRUCTORA S.A.S	0	0	0		
VIVIENDAS FUNDIDAS MURO SEGUNDO PISO	CONSTRUCTORA E&J SAS	0	0	0		4
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO						TOTAL
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	0	0	0		18
VIVIENDAS MODULADAS (ACERO-INSTALACIONES) PARA CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO						TOTAL
VIVIENDAS MODULADAS PARA(ACERO-INSTALACIONES) CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	0	0	0		2

# VIVIENDA URBANA SAUCES II

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		PROYECTO SAUCES II							F-SST-67	
		CONTROL DIARIO PERSONAL							Versión I	
SEMANA 3 DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021		TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							11/03/2019	
PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO	
CONSORCIO MCOCA 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	10	10	11	11	11			11	
CONSORCIO MCOCA 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	3	3	4	4	4			4	
INTERVENTORIA HMV	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	8	8	8	8	8			8	
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							PROMEDIO
		L	M	M	J	V	S	D	
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MCOCA 2019	2	2	2	2	2			2
SEGURIDAD PRIVADA AMCOVID	CELADURIA OBRA	2	2	2	2	2			2
CONSTRUCTORA EYJ SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	17	12	12	13	7			12
CASTAÑEDA COSNTRUCTORA SAS	CIMENTACION	12	12	13	14	14			13
SINIESTERRA CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	17	20	20	20	18			19
ELECTROSERVIG	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	6	6	3	3	3			4
YENI CONSTANZA MIGUEZ	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	1	1	1	1	1			1
BCH HIDROSANITARIAS SAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	9	8	6	7	8			8
TEJA CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	6	6	6	4	5			5
<b>TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>		<b>72</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
JVC CONSTRUCCIONES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	9	9			4
JVC CONSTRUCCIONES	OPERADORES, PALETEROS Y LIMPALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	1	3	4			2
EDUARDO MORA	OPERADORES	1	1	1	1	1			1
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	1	0	0			0
LEONEL OJEDA	OPERADORES, PALETEROS Y LIMPALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	1	1	3			1
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	7	13	13	6			8
WILSON PUENTES	OPERADORES, DESPACHADOR	0	1	1	1	1			1
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
<b>TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL PERSONAL EN EL DIA</b>		<b>73</b>	<b>78</b>	<b>83</b>	<b>94</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 82	<b>Local: 55</b> <b>67%</b>	<b>Calificados: 5</b> <b>9%</b>
		<b>No Calificados: 50</b> <b>91%</b>
	<b>Foráneo: 27</b> <b>33%</b>	<b>Calificados: 15</b> <b>56%</b>
		<b>No Calificados: 12</b> <b>44%</b>

\*Cifras semana del 20 al 25 de diciembre. La obra operó a baja marcha del 26 al 28 de diciembre de 2021.



Impacto

**87** Familias

Actores e inversión

**\$ 9.309 Millones**

- \$ 5.763 millones: Fonvivienda
- \$ 3.545 millones: FNGRD - UNGRD



**AVANCES**

- Se adelantan los trámites para la incorporación de los recursos al convenio.
- Se han adelantado gestiones con la Alcaldía para la postulación del predio requerido para la ejecución del proyecto.

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración	2022 Mes:								2023		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP-DIC	ENE-MAY	
1 Incorporación recursos al convenio	2 semanas	█										
2 Postulación y adquisición predio	4 meses	█	█	█	█							
3 Proceso precontractual contratación obra	3 semanas					█						
4 Proceso precontractual contratación interventoría	2 semanas					█						
5 Ejecución fase I contratos de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	3 meses						█	█	█			
6 Ejecución fase II contratos de obra - construcción proyecto 87 viviendas y obras de urbanismo	9 meses									█	█	█

**NOTA:** Los tiempos anteriores dependerán de la postulación del predio por parte de la Alcaldía de Mocoa.







## AVANCES

### MOCOA DISPERSO:

- **Proceso - Contrato de obra:** El día 28/09/2021, se adjudica el proceso No. **FNGRD-LP-002-2021** al CONSORCIO OTES MOCOA 1.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>,

El consorcio realizó las gestiones pendientes ante la DIAN, con base a ello la UNGRD remitió la instrucción para elaboración de contrato a la Fidupervisora. El 13/12/2021, La Fidupervisora realiza otrosí al contrato por ajuste en las garantías y remite el mismo al contratista el día 24/12/21 para la obtención de pólizas. A la fecha el contratista no ha presentado las mismas para su aprobación y legalización.

- **Proceso - Contrato de Interventoría:** El día 03/12/21 se adjudica el proceso N° **FNGRD-CMA-001-2021** al CONSORCIO APOYOS 2022.

El consorcio realizó las gestiones pendientes ante la DIAN, dado a lo anterior el 10/12/2021 la UNGRD remitió la instrucción para elaboración de contrato a la Fidupervisora, quien remite el mismo para firma el día 29/12/2022. El día 30/12/21 el contratista remitió Pólizas actualizadas a fidupervisora para perfeccionamiento de contrato

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2376922&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**Nota:** teniendo en cuenta que los trámites y los términos establecidos para los procesos de selección de los procesos de obra e interventoría, los plazos de ejecución de ambos contratos adjudicados, están establecidos por un término de ocho meses, lo que implica que superan en meses el término de ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 9677-PPAL001-668-2017, que tiene fecha de finalización el 17 de julio de 2022, se adelanto comité de supervisores entre el BAC y la UNGRD en donde se aprobó prórroga de tres meses para el convenio, es decir hasta el 17 de octubre de 2022. El día 27/12/21 se radico en fidupervisora Instrucción para elaboración de Otro si 4 en donde se modifica la fecha de finalización del convenio.



UNGRD	
Precio estimado total:	240 667 980 COP
Número del proceso:	FNGRD-CMA-001-2021
Título:	INTERVENTORIA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
Fase:	Presentación de observaciones
Estado:	Publicado
Descripción:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y SU ANEXO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO 9677 PPAL001 668 2017, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
Tipo de proceso:	Concurso de méritos abierto



Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Publicación del aviso de convocatoria pública	13 días de tiempo transcurrido (9/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos	13 días de tiempo transcurrido (9/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	13 días de tiempo transcurrido (9/11/2021 6:16:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	5 días de tiempo transcurrido (17/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	-
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones	4 días de tiempo transcurrido (18/11/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	4 días de tiempo transcurrido (18/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	3 días de tiempo transcurrido (19/11/2021 7:08:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	4 días de tiempo transcurrido (18/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	16 horas de tiempo transcurrido (22/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	13 minutos para terminar (23/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	2 horas para terminar (23/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	1 día para terminar (25/11/2021 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas	1 día para terminar (25/11/2021 10:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas	1 día para terminar (25/11/2021 10:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	2 días para terminar (25/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	7 días para terminar (30/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta	8 días para terminar (1/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato	9 días para terminar (3/12/2021 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	12 días para terminar (6/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	13 días para terminar (6/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Impacto

**216** Familias

Actores e inversión

**\$ 30.980 Millones**

- \$ 21.463 millones: FNGRD - UNGRD
- \$ 9.516 millones: BAC



**AVANCES**

- A la fecha se cuenta con el aval técnico del BAC para iniciar la ejecución del proyecto de vivienda.
- En total de las 216 viviendas presentadas al BAC se encuentran avaladas 211. Pendientes por viabilizar 5.
- Actualmente se tienen los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda por un valor de \$22.590.611.916

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022						2023
		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-MAY
1 Proceso para la contratación de las obras de vivienda VISR.	2	■	■					
2 Proceso para la contratación de la interventoría de vivienda VISR.	2			■	■			
3 Ejecución fase I contrato de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	1					■		
4 Ejecución fase II contrato de obra - construcción proyecto 216 viviendas y obras de urbanismo (20 viviendas por mes)	10						■	■

**3.**

# SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$18.377 millones  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

**\$ 18.377 millones**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018

Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018

Fecha de finalización: 30 - ENE – 2022 (Según fecha contractual).



## TIPO DE INTERVENCIÓN

**CONSTRUCCIÓN** de infraestructura educativa.

## IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

### Estado Actual:

El 03/ENE/22 se inició con la ejecución de la **fase II** del proyecto el cual contempla: Bloque administrativo, comedores, urbanismo, placa polideportiva con cubierta, cerramiento e iluminación exterior para el proyecto, además de la dotación de amoblamiento requerida para este tipo de infraestructuras cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el manual de dotación del Ministerio de educación Nacional.

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022 Mes:					
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
1 Ejecución de obra de la segunda fase de la institución educativa.	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Suministro e instalación de la dotación.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-225-2018 Valor: \$ 10.462.078.032,00</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> Consorcio Colegio Mocoa</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-228-2018 Valor: \$732.329.530,00</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> INGEVAL S.A.S.</p>	<p><b>SUPERVISOR UNGRD</b> Yineth Arinda Cumplido Botello - Subdirección para la Reducción del Riesgo</p>
--	--	---

# PROYECTO PLAZA DE MERCADO

Impacto **435** Comerciantes beneficiados de forma directa



Actores e inversión

**\$ 18.976 Millones**

FNGRD - UNGRD

• FNGRD - UNGRD y Municipio de Mocoa



## AVANCES

- En estructuración de convenio con el municipio.
- Se realizó la solicitud de licencia de construcción.

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022 Mes:						2023 Mes:	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL-DIC	ENE - NOV
1 Estructurar Convenio con Municipio de Mocoa	2	■	■						
2 Estructurar proceso licitatorio de obra e interventoría	2	■	■						
3 Publicación y adjudicación contrato de obra (Ley 80)	2			■	■				
4 Publicación y adjudicación contrato de Interventoría (Ley 80)	2				■	■			
5 Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	5 días					■			
6 Ejecución fase I contrato de obra - revision estudios y diseños	1					■	■		
7 Ejecución fase II contrato de obra - construcción de la galería de la plaza de mercado	17						■	■	■

# PROYECTO CENTRO PENITENCIARIO



# RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

## OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

### ETAPA

1

#### ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



### ETAPA

2

#### ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	70%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	55%
ESTADO	Se adelanta actividades de instalación de micromedidores, empalmes en redes de distribución y líneas de conducción y culminación de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable existente



El futuro  
es de todos




Presidencia  
de la República



**4.**

**GENERACIÓN DE EMPLEO**

# GENERACIÓN DE EMPLEO

	<b>CONTRATOS EN EJECUCIÓN</b>	<b>57</b>
	<b>EMPLEO GENERADO A LA FECHA</b>	<b>553</b>
	<b>PERSONAL PROYECTADO</b>	<b>758</b>

	29/12/21	12/01/22		29/12/21	12/01/22
<b>MANO DE OBRA LOCAL</b>	<b>424</b>	<b>392</b>	<b>MANO DE OBRA FORÁNEA</b>	<b>160</b>	<b>161</b>
CALIFICADOS	191	175	CALIFICADOS	115	126
NO CALIFICADOS	233	217	NO CALIFICADOS	45	35
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	73%	71%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	27%	29%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	995	1.364
EMPLEOS INDUCIDOS	221	303
<b>TOTAL EMPLEOS</b>	<b>1.216</b>	<b>1.667</b>

**GRACIAS**
