

# SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Abril 13 de 2022



## UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

Sistema Integrado  
de Planeación y  
Gestión de la UNGRD  
certificado en:



**1.**

# SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

## OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

**\$171.294 millones**



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento
<b>18 de obra</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
<b>13 de interventoría</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

## OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

**\$39.480 millones**



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento
<b>13 de obra</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>
<b>4 de interventoría</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Estamos ejecutando **24** sectores en total  
 10,66 Km de pavimento

**1.1**

# PROYECTOS FINALIZADOS

Proyecto finalizado

Obras de control de protección y/o estabilización

En **desarrollo del proyecto** se construyeron 2569,88 m2 de pantallas ancladas para la mitigación, estabilización y consolidación de los taludes aferentes al barrio Modelo en el Municipio de Mocoa.  
 Empleos Generados: **26**

**Contrato de Obra**  
 No. 063 del 2019  
 Valor: \$ 3.841.235.901

**Contrato de Interventoría**  
 No. 9677-PPAL001-261-2019  
 Valor: \$ 453.207.180,00

**Nombre del Contratista:**  
 Virgilio Bravo Sosa

**Nombre de la Interventoría:**  
 Yahara Maritza Viveros Ortiz

Antes

### ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019  
 Fecha de terminación programada: 28 - DIC - 2021  
 Fecha de terminación real: 28- DIC- 2021  
 Avance financiero: 44,31%  
 Avance físico: 100%

### INVERSIÓN

Valor total del proyecto  
**\$ 4.294.443.081**

### POBLACIÓN BENEFICIADA

**45.589** 

Proyecto finalizado

**Obras de Pavimentación**

En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 349 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes y una longitud de 436,7 metros lineales de alcantarillado pluvial.

Empleos Generados: **38**

**Contrato de Obra**

No. 9677-PPAL001-407-2021

Valor: \$ 1.017.658.395

**Contrato de Interventoría**

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 72.318.929,67

**Nombre del Contratista:**

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

**Nombre de la Interventoría:**

CONSORCIO INTER 5HG.

Antes

**ESTADO TERMINADO**

Fecha acta de inicio: 27 - ABR - 2021  
 Fecha de terminación programada: 18- ENE- 2022  
 Fecha de terminación real: 18- ENE- 2022  
 Avance financiero: 49,41%  
 Avance físico: 100%

**INVERSIÓN**

Valor total del proyecto  
**\$ 1.089.977.324,67**

**POBLACIÓN BENEFICIADA**

**45.589** 



El futuro es de todos

Presidencia de la República



**Obras de Pavimentación**



En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 318,65 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes.

Empleos Generados: **40**

**Contrato de Obra**  
 No. 9677-PPAL001-518-2021  
 Valor: \$ 1.206.210.066

**Nombre del Contratista:**  
 UNIÓN TEMPORAL CAIMARON

**Contrato de Interventoría**  
 No. 9677-PPAL001-551-2021  
 Valor: \$ 85.718.175,52

**Nombre de la Interventoría:**  
 CONSORCIO INTER 5HG.

**ESTADO TERMINADO**

Fecha acta de inicio: 19 - ABR – 2021  
 Fecha de terminación programada: 18- NOV- 2021  
 Fecha de terminación real: 18 – NOV – 2021  
 Avance financiero: 90%  
 Avance físico: 100%

**INVERSIÓN**

Valor total del proyecto  
**\$ 1.291.928.241,52**

**POBLACIÓN BENEFICIADA**


**45.589**

# 1.2

## SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN



# AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN

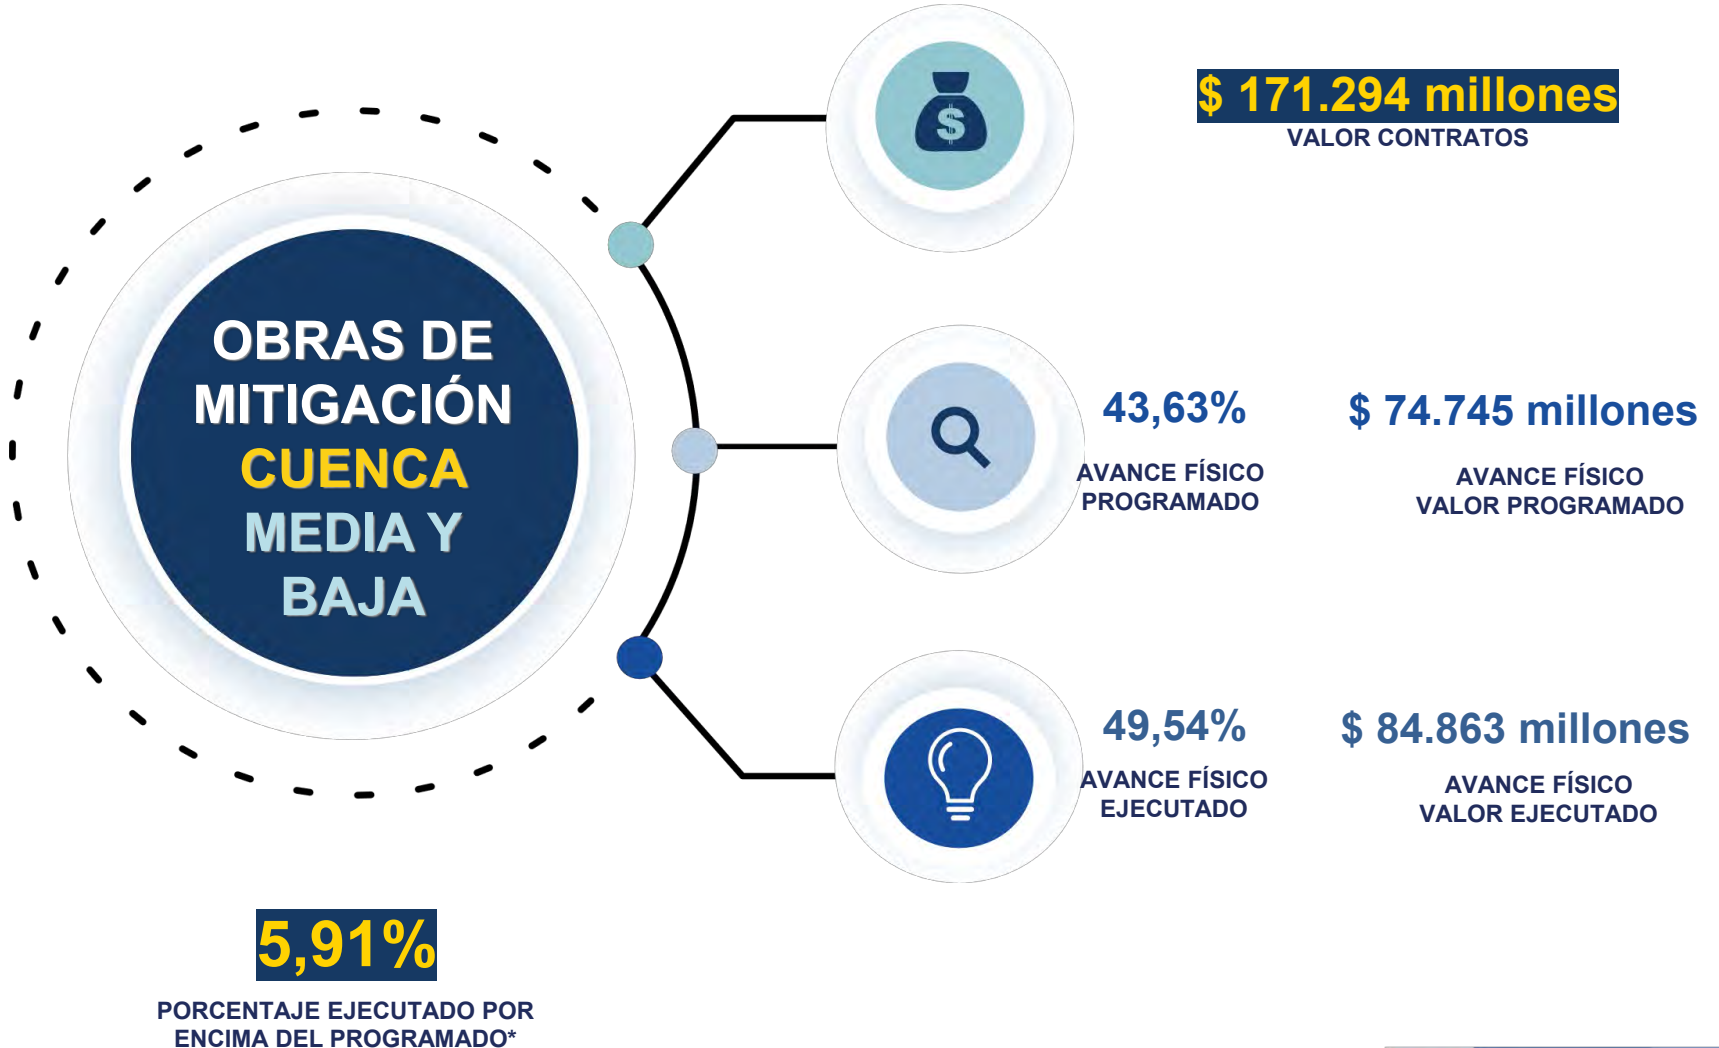

# CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN\*

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO			ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	
2	\$ 32.838.401.531,00	21,74%	32,47%	\$ 10.662.628.977,12	83,80%	\$ 27.518.580.482,98 + 51,33%
3	\$ 4.649.908.733,08	19,24%	85,44%	\$ 3.972.882.021,54	44,70%	\$ 2.078.509.203,69 -40.74%
4	\$ 6.169.543.804,64	22,45%	83,83%	\$ 5.171.928.571,43	33,33%	\$ 2.056.308.950,09 -50.50%
5	\$ 7.470.111.514,00	11,80%	31,21%	\$ 2.331.421.803,52	26,71%	\$ 1.995.266.785,39 -4.50%
6	\$ 11.015.174.280,00	20,83%	62,23%	\$ 6.854.742.954,44	54,00%	\$ 5.948.194.111,20 -8.23%
7	\$ 12.251.982.484,00	20,67%	49,38%	\$ 6.050.028.950,60	38,08%	\$ 4.665.554.929,91 -11,30%
8	\$ 7.201.817.823,00	35,40%	58,42%	\$ 4.207.301.972,20	47,27%	\$ 3.404.299.284,93 -11.15%
9	\$ 6.826.692.363,00	36,37%	63,25%	\$ 4.317.882.919,60	46,26%	\$ 3.158.027.887,12 -16,99%
10	\$ 5.707.203.584,54	58,89%	71,08%	\$ 4.056.680.307,89	71,50%	\$ 4.080.650.562,95 + 0,42%
11	\$ 16.650.891.855,01	47,33%	49,00%	\$ 8.158.937.008,95	61,26%	\$ 10.200.336.350,38 + 12,26%
12	\$ 26.513.662.153,00	25,79%	45,48%	\$ 12.058.413.547,18	54,93%	\$ 14.563.954.620,64 + 9.45%
13	\$ 2.942.990.793,02	36,76%	73,29%	\$ 2.156.917.952,20	70,05%	\$ 2.061.565.050,51 -3,24%
14	\$ 2.087.786.575,20	0%	39,14%	\$ 817.159.665,53	14,95%	\$ 312.124.092,99 -24.19%
15	\$ 6.700.484.099,80	0%	6,14%	\$ 411.409.723,73	0,87%	\$ 58.294.211,67 -5.27%
16	\$ 8.981.109.126,81	0%	8,02%	\$ 720.284.951,97	3,71%	\$ 333.199.148,60 -4.31%
17	\$ 8.470.387.014,38	0%	33,02%	\$ 2.796.921.792,15	28,67%	\$ 2.428.459.957,02 -4,35%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 0,00 0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 171.294.435.971,48</b>	<b>\$ 39.321.059.970,10</b>		<b>\$ 74.745.543.120,06</b>		<b>\$ 84.863.325.630,07</b>
		<b>22,95 %</b>		<b>43,63%</b>		<b>49.54%</b>

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 32.838.401.531,00**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020

Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2021

Fecha de suspensión: 24 - DIC - 2021

Fecha acta de reinicio: 24 - ABR - 2022

Fecha de terminación actualizada: 15 -OCT - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**


Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

**CONSTRUCCIÓN** de 1 Jarillón de **1050 ml**

**Estado Actual:**

El 20 de diciembre 2021 se radicó trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría, por un tiempo de 4 meses.

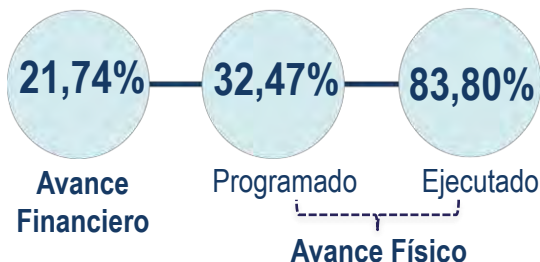

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-977-2020                  Valor: \$ 30.413.014.931,00</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-1365-2020                  Valor: \$ 2.425.386.600,00</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b>                  INGECON SA</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTER JARILLON 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

• Jarillón 1 - Quebrada Taruca

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 4.649.908.733,08**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra**

Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020  
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021  
Fecha de terminación: 11 - ABR – 2022  
Trámite de prórroga por 3 meses



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Obras estabilización y recuperación**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 27  
Total Projectado: 27

Local: 22  
**81%**


Foráneo: 5  
**19%**

Calificados: 10  
**45%**

No Calificados: 12  
**55%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

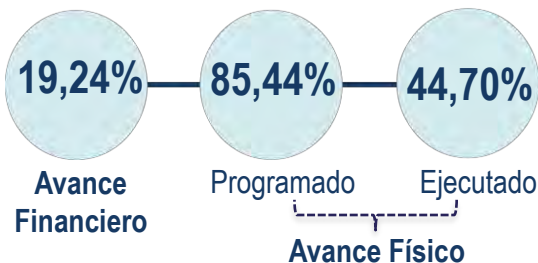

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOCA LH 2020</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 347.867.356,08 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**Muro 6: Recubrimiento en concreto**



**ALCANCE**

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato



**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 6.169.543.804,64**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
 Fecha de suscripción: 16 – SEP- 2020  
 Fecha acta de inicio: 12 – FEB – 2021  
 Fecha de suspensión: 27 –MAY– 2021  
 Fecha de reinicio: 16 - JUN – 2021  
 Fecha de terminación actualizada: 01-MAY-2022  
 En trámite de prórroga




**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Obras estabilización y recuperación**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 27 Total Projectado: 27	<b>Local: 16</b> <b>59%</b>	Calificados: 6 <b>37,5%</b>
		No Calificados: 10 <b>62,5%</b>
	<b>Foráneo: 11</b> <b>41%</b>	Calificados: 5 <b>45%</b>
		No Calificados: 6 <b>55%</b>

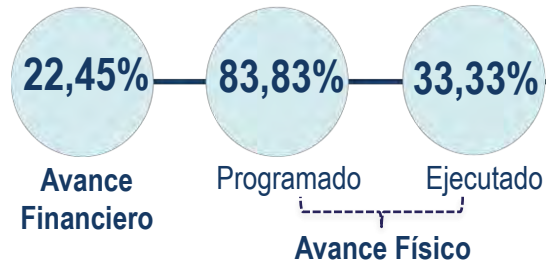

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-980-2020 Valor: \$ 5.707.990.037,72	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 461.553.766,92 (valor para este contrato)
<b>Nombre del Contratista:</b> HAROLD MUÑOZ MUÑOZ	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO HECAD VIAL
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



**Muro 7: Construcción de Colchagaviones y Fundición de Recubrimiento en Concreto.**



**Construcción primer tercio del Azud 9**



**ALCANCE**

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 7.470.111.514,00**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021  
Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022




**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

**CONSTRUCCIÓN** de 2 diques

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 30 Total Projectado: 35	Local: 22 <b>73%</b>	Calificados: 14 <b>64%</b>
		No Calificados: 8 <b>36%</b>
	Foráneo: 8 <b>27%</b>	Calificados: 8 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

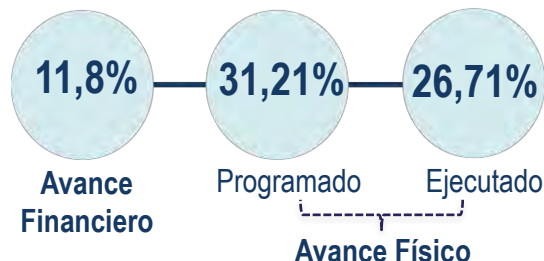

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.923.961.014,0	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 546.150.500,00
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO RIO MULATO.	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO
<b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de dique 2 avance 1/3 del cuerpo



**ALCANCE**

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



## ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 11.015.174.280,00

## EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES

Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020

Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local: 30 <b>79%</b>	Calificados: 14 <b>47%</b>
		No Calificados: 16 <b>53%</b>
	Foráneo: 8 <b>21%</b>	Calificados: 8 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

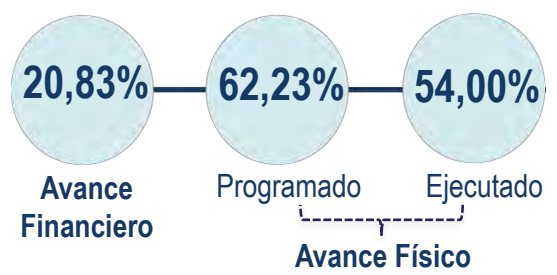


45.589

Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.094.882</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.079.398</p>
<p>-----</p> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CDF INGENIERIA SAS</p>	<p>-----</p> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERDIQUE 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



- ✓

ALCANCE

  - Dique Abierto 3
  - Muro 1
  - Azud 05
  - Muro 2
  - Azud 04
  - Muro 3

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 12.251.982.484,00**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021  
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 22  
Total Projectado: 45

Local: 18  
**82%**


Foráneo: 4  
**18%**

Calificados: 6  
**33%**

No Calificados: 12  
**67%**

Calificados: 4  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

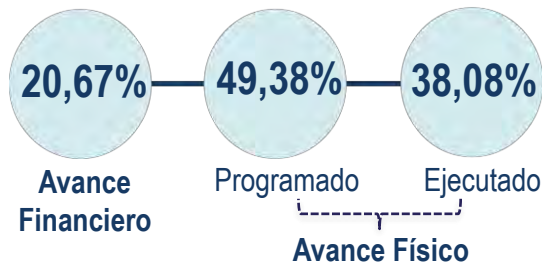

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.323.151.784</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 928.830.700</p>
<p>-----</p> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020</p>	<p>-----</p> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO MUROS MOCOCA</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de formaletas muro 4



Instalación de colcha gaviones azud 6



**ALCANCE**

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

**\$ 7.201.817.823,00**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25  
Total Projectado: 35

Local: 18  
**72%**


Foráneo: 7  
**28%**

Calificados: 7  
**39%**

No Calificados: 11  
**61%**

Calificados: 5  
**71%**

No Calificados: 2  
**29%**

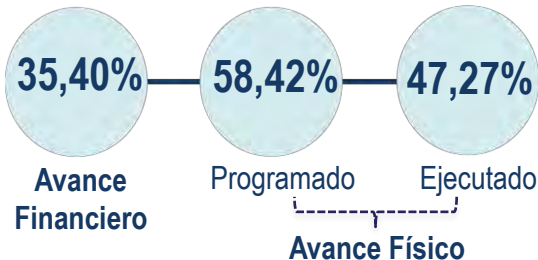

**45.589**  
Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-1388-2020  
Valor: \$ 6.665.699.934

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO DIQUE 1

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-345-2021  
Valor: \$ 536.117.889,10  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
MOCOA 2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Instalación de colcha gaviones de cimentación.



**ALCANCE**

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$6.826.692.363,00**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021  
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21  
Total Projectado: 35

Local: 11  
**52%**


Foráneo: 10  
**48%**

Calificados: 6  
**55%**

No Calificados: 5  
**45%**

Calificados: 6  
**60%**

No Calificados: 4  
**40%**

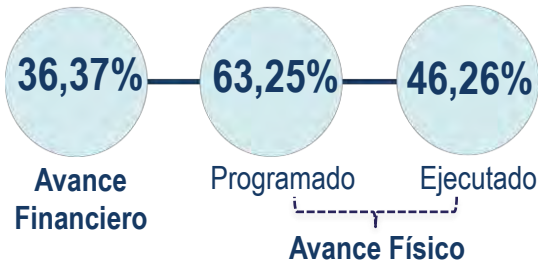

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.318.499.572</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO MURO RIO MOCOCA</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.192.790,90 (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOCA 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



Desvío cauce de río



Amarre de aceros



### ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 5.707.203.584,54**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020  
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 17  
Total Projectado: 35

Local: 7  
**41%**


Foráneo: 10  
**59%**

Calificados: 4  
**57%**

No Calificados: 3  
**43%**

Calificados: 6  
**60%**

No Calificados: 4  
**40%**

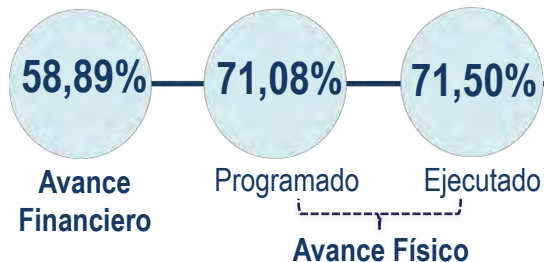

**45.589**  
Personas beneficiadas

### Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1119-2020  
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:  
A&A CONSULTORIA E  
INGENIERIA SAS

### Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021  
Valor: \$ 426.236.745,59

(para este contrato)  
Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORES  
DDA MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Entrega de residuos



Construcción. Dique 11



**ALCANCE**

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

**\$ 16.650.891.855,01**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020  
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

#### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 39  
Total Projectado: 45

Local: 27  
**69%**


Foráneo: 12  
**31%**

Calificados: 6  
**22%**

No Calificados: 21  
**78%**

Calificados: 7  
**58%**

No Calificados: 5  
**42%**

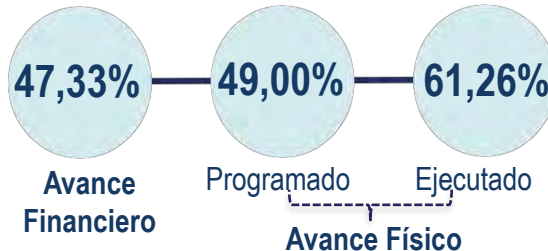

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.336.784,60</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> UNIÓN TEMPORAL OBRAS RÍO SANGOYACO 2020</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.243.555.070,41 (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa</p>	



Construcción Muro 07



Construcción Azud 14



### ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 26.513.662.153,00**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 72  
Total Projectado: 75

Local: 57  
**79%**


Foráneo: 15  
**21%**

Calificados: 24  
**42%**

No Calificados: 33  
**58%**

Calificados: 13  
**87%**

No Calificados: 2  
**13%**

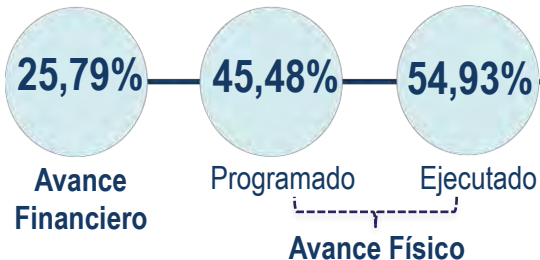

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1382-2020 Valor: \$ 24.560.158.153,0</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-205-2021 Valor: \$ 1.953.504.000,00</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO DRAGADO MOCOA 2020</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERDRAGADOS MOCOA</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa</p>	



Jarillón: Conformación de Colcho gavión.



**ALCANCE**

- Jarillón
- Espolones



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 2.942.990.793,02**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021  
Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021  
Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de azud.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 47

Total Projectado: 47

Local: 27  
**57%**


Foráneo: 20  
**43%**

Calificados: 7  
**26%**

No Calificados: 20  
**74%**

Calificados: 20  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

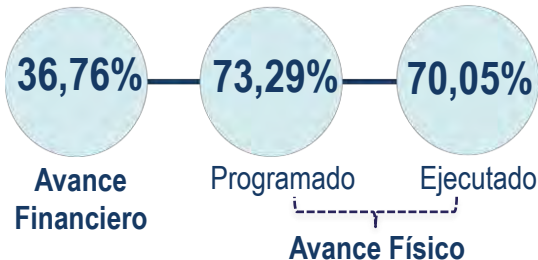

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.386.639</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO MIRAVALLE</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.604.155 (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de gaviones Ribera izquierda – Instalación de lámina chronit  
Azud 10- Río Sangoyaco.



**ALCANCE**

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOÁ

Valor total del proyecto

**\$ 2.087.786.575,20**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto y muro de protección.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15  
Total Projectado: 30

Local: 10  
**67%**

Foráneo: 5  
**33%**

Calificados: 10  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

0,0%

Avance  
Financiero

39,14%

Programado

14,95%

Ejecutado

Avance Físico

**45.589**

Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-1330-2020  
Valor: \$ 1.930.861.194,00

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO OBRAS POR  
COLOMBIA

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-133-2021  
Valor: \$ 156.925.381,20  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTER – MOCOÁ  
2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



Construcción Azud 15



### ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 6.700.484.099,80**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 08 – MAR – 2021  
Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021  
Fecha de suspensión: 18 – JUL – 2021  
Fecha acta de reinicio: 19 – OCT – 2021  
Fecha de terminación actualizada: 14 - MAR – 2023



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5  
Total Projectado: 30

Local: 0  
**0%**


Foráneo: 5  
**100%**

Calificados: 0  
**0%**

No Calificados: 0  
**0%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

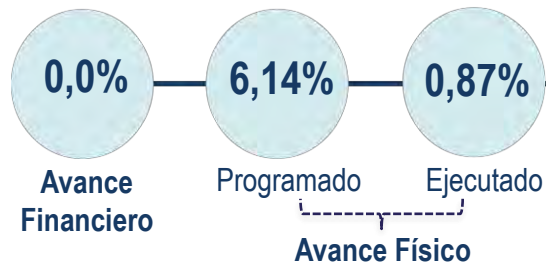

**45.589**  
Personas beneficiadas



Apiques sobre muros existente verificar TR diseño

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.196.852.151,00</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO EVI5</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.631.948,80 (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



## ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10



El futuro es de todos

Presidencia de la República

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 8.981.109.126,81**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021  
Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021  
Fecha de terminación: 10 – MAY -2023



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15  
Total Projectado: 37

Local: 13  
**87%**


Foráneo: 2  
**13%**

Calificados: 9  
**69%**

No Calificados: 4  
**31%**

Calificados: 2  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

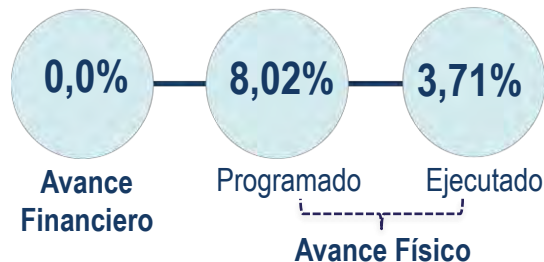

**45.589**  
Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-1342-2020  
Valor: \$ 8.307.462.026,81

**Nombre del Contratista:**  
CONSORCIO AZUD  
MOCOA 520

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-098-2021  
Valor: \$ 673.647.100

**Nombre de la Interventoría:**  
CONSORCIO  
INTERVENTORIA MUROS  
MOCOA 2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



Instalación de campamento



Ingreso de maquinaria

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 8.470.387.014,38**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 16- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 25- FEB -2023



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26  
Total Projectado: 40

Local: 22  
**85%**


Foráneo: 4  
**15%**

Calificados: 8  
**36%**

No Calificados: 14  
**64%**

Calificados: 4  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

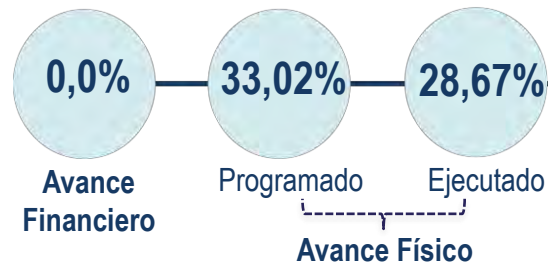

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <p>----- <b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045,38 (para este contrato)</p> <p>----- <b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de gaviones de cimentación Muro 3-Río Sangoyaco.



Instalación de gaviones de cimentación y de colchogavión en Muro 2-Quebrada Taruca.



## ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.



**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 4.816.288.237,00**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

**Plazo:** DOCE (12) MESES  
**Fecha de suscripción:** 13 – MAR - 2021



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras de drenaje

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

**Estado Actual:**

Se aprueba enrocado y la interventoría revisa diseño presentado para evaluación.

 **45.589**  
Personas beneficiadas



<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-183-2021 Valor: \$ 4.452.771.492,00</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-743-2021 Valor: \$ 363.516.745,00</p>
<p>----- <b>Nombre del Contratista:</b> CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.</p>	<p>----- <b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

**Construcción:**

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

**1.3**

# SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

# AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



# CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$ 8.840.532.147,00	0,00%	84,81%	\$ 7.497.655.313,87	50,10%	\$ 4.429.106.605,65	-34,71%
2	\$ 1.348.310.810,87	89,01%	99,00%	\$ 1.334.827.702,76	95,11%	\$ 1.282.378.412,22	-3,89%
3	\$ 2.485.832.907,67	0,00%	93,66%	\$ 2.328.231.101,32	77,71%	\$ 1.931.740.752,55	-15,95%
4	\$ 1.089.977.324,67	49,41%	100,00%	\$ 1.089.977.324,67	100,00%	\$ 1.089.977.324,67	Finalizado
5	\$ 3.025.332.743,22	0,00%	95,96%	\$ 2.903.109.300,39	15,30%	\$ 462.875.909,71	-80,66%
6	\$ 1.291.928.241,52	90,00%	100,00%	\$ 1.291.928.241,52	100,00%	\$ 1.291.928.241,52	Finalizado
7	\$ 2.887.889.611,85	0,00%	62,34%	\$ 1.800.310.384,03	31,55%	\$ 911.129.172,54	-30,79%
8	\$ 1.342.679.144,30	69,75%	96,22%	\$ 1.291.925.872,65	89,90%	\$ 1.207.068.550,73	-6,32%
9	\$ 4.581.902.966,83	22,24%	61,86%	\$ 2.834.365.175,28	36,56%	\$ 1.675.143.724,67	-25,30%
10	\$ 1.960.074.687,90	38,37%	99,00%	\$ 1.940.473.941,02	88,79%	\$ 1.740.350.315,39	-10,21%
11	\$ 1.365.555.977,75	0,00%	47,39%	\$ 647.136.977,86	47,42%	\$ 647.546.644,65	0,03%
12	\$ 6.643.141.316,25	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$ 2.617.277.429,17	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$39.480.435.309,00</b>	<b>\$ 5.609.039.246,96</b>		<b>\$ 24.959.941.335,37</b>		<b>\$ 16.669.245.654,29</b>	
		14,21%		63,22%		42,22%	

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 8.840.532.147,00**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra  
Plazo: DIEZ (10) MESES  
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021  
Fecha de terminación: 16 - ABR – 2022  
11- ABR-2022 se realiza solicitud de prórroga y adición de recursos.



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

## IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 11  
Total Projectado: 26

Local: 5  
**45%**

Foráneo: 6  
**55%**

Calificados: 4  
**80%**

No Calificados: 1  
**20%**

Calificados: 6  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

0,0%

Avance  
Financiero

84,81%

Programado

50,1%

Ejecutado

Avance Físico

**45.589**

Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-366-2021  
Valor: \$ 8.272.681.997

**Nombre del Contratista:**  
CONSORCIO VIAS MOCOA 040

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-555-2021  
Valor: \$ 567.850.150,00

**Nombre de la Interventoría:**  
CONSORCIO INTER VIAS

**Supervisor UNGRD**  
Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Instalación de tubería sanitaria



Fundición de vía

## ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.
- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.



# 2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$1.348.310.810,87**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 18 - ABR – 2022

30 – MAR - 2022 se solicitó recursos adicionales


## TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

### IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 7 Total Projectado: 7	Local: 7	Calificados: 7
	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		No Calificados: 0
		<b>0%</b>
	Foráneo: 0	Calificados: 0
	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		No Calificados: 0
		<b>0%</b>

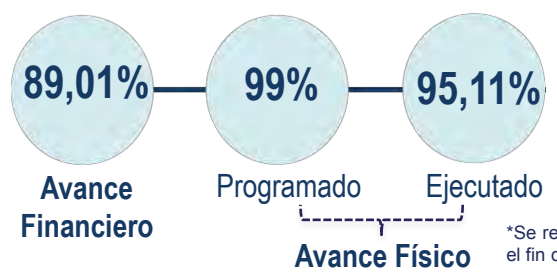

**45.589**  
Personas beneficiadas

\*Se realiza reunión con contratista e interventoría con el fin de revisar el reinicio de la obra.

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.459.103,87
<b>Nombre del Contratista:</b> JAVIER GUSTAVO OSPINA	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa	



Canalización de aguas lluvias



Fundición de placa

**ALCANCE**

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
  - Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.



## ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto  
**\$2.485.832.907,67**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES  
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021  
Fecha de terminación: 18 – ABR – 2022  
12-ABR-2022 se solicita prórroga de 3 meses




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

## IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 20 Total Projectado: 25	Local 20 <b>100%</b>	Calificados 5 <b>25%</b>
		No Calificados 15 <b>75%</b>
	Foráneo 0 <b>0%</b>	Calificados 0 <b>0%</b>
		No Calificados 0 <b>0%</b>

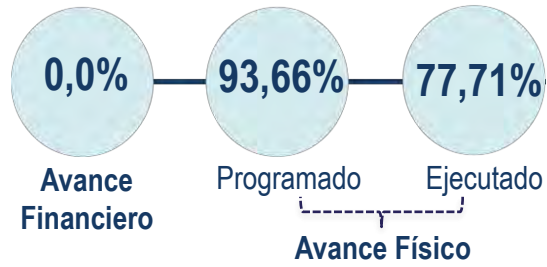


**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.932.582,67
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	



Adecuación de tramo vial



Socialización de avance de obra

 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto  
**\$ 3.025.332.743,22**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES  
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021  
Fecha de terminación: 30 – ABR - 2022




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 2 Total Projectado: 2	Local: 2 <b>100%</b>	Calificados: 2 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>
	Foráneo: 0 <b>0%</b>	Calificados: 0 <b>0%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

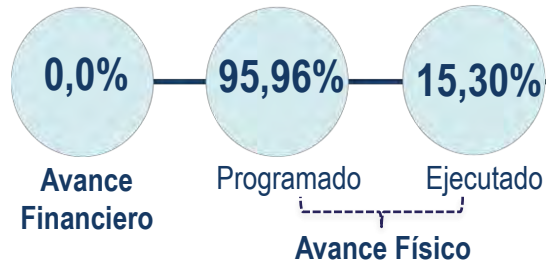


**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874,00	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.727.869,22
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO VIAS DE MOCOA	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa	



Tramos IV y VI

**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 2.887.889.611,85**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES  
Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021  
Fecha de finalización: 18 - MAY - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 21  
Total Projectado: 25

Local: 19  
**90%**

Foráneo: 2  
**10%**

Calificados: 4

**21%**

No Calificados: 15


**79%**

Calificados: 2

**100%**

No Calificados: 0

**0%**

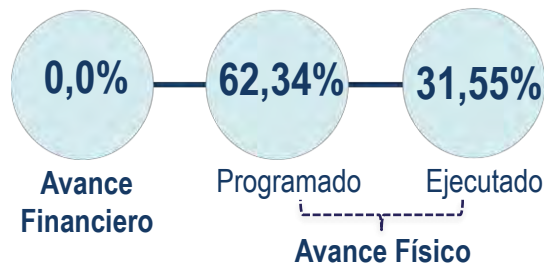

**45.589**

Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-554-2021  
Valor: \$ 2.696.280.960

**Nombre del Contratista:**  
CONSORCIO ORC 2020

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-551-2021  
Valor: \$ 191.608.651,85

**Nombre de la Interventoría:**  
CONSORCIO INTER 5HG

**Supervisor UNGRD**

Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa



**Pavimentación de un tramo**



**Descarga de cemento**

**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.




### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto  
**\$1.342.679.144,30**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra  
Plazo: SIETE (7) MESES  
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021  
Fecha de finalización: 22- ABR -2022  
7 – MAR - 2022 solicitud de adición de recursos  
8- ABR- 2022 solicitud de prórroga




### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

**Estado Actual:**  
Suspendida. Se solicitó recursos alcantarillado pluvial y prórroga por 3 meses.

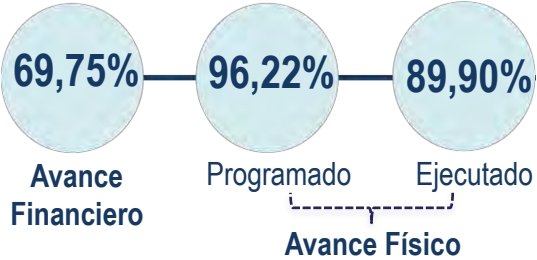

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.448,30</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 4.581.902.966,83**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra**

**Plazo: OCHO (8) MESES**

**Fecha de suscripción: 29 – MAR – 2021**

**Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021**

**Prórroga: 04 Meses**

**Fecha de terminación: 07 – JUL-2022**

**29-03-2022 Interventoría solicita adición recursos**



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

**PERSONAL EN OBRA**

**Total Obra: 30  
Total Projectado: 37**

**Local: 27  
90%**

**Foráneo: 3  
10%**

**Calificados: 15**

**56%**

**No Calificados: 12**


**44%**

**Calificados: 3**

**100%**

**No Calificados: 0**

**0%**

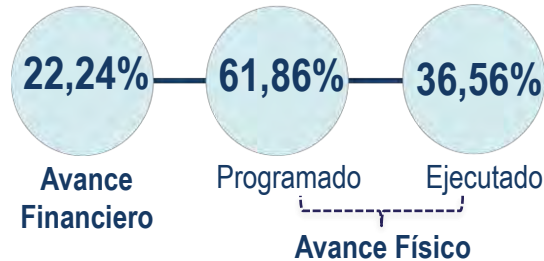

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 313.184.661,83</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



**Sector Ciudadela Deportiva**



**ALCANCE**

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.



**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 1.960.074.687,90**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

**Plazo:** CINCO (5) MESES

**Fecha de suscripción:** 29 – ABR – 2021

**Fecha acta de inicio:** 06 – JUL – 2021

**Fecha de finalización actualizada:** 18 – MAY -2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

**Pavimentación de 1 vía**

**PERSONAL EN OBRA**

**Total Obra: 19**

**Total Projectado: 25**

**Local: 19**

**100%**

**Foráneo: 0**

**0%**

**Calificados: 6**

**32%**

**No Calificados: 13**

**68%**

**Calificados: 0**

**0%**

**No Calificados: 0**

**0%**



**45.589**

**Personas beneficiadas**

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-549-2021 Valor: \$1.830.025.649 <b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO PAVIMENTOS MOAC CONSTRUCCIONES	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 130.049.038,90 (Para este contrato) <b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz Castro– Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

**Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:**

- **Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza**



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 1.365.555.977,75**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES  
 Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021  
 Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021  
 Fecha de terminación: 16 - AGO - 2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 26  
 Total Projectado: 20

Local: 19  
**73%**


Foráneo: 7  
**27%**

Calificados: 11  
**58%**

No Calificados: 8  
**42%**

Calificados: 7  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

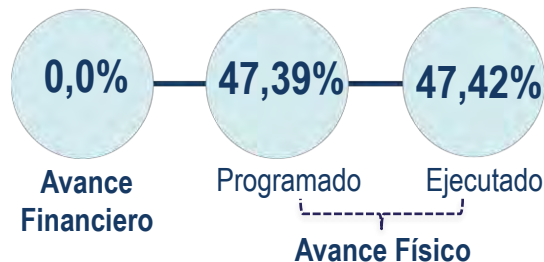

**45.589**  
 Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
 No. 9677-PPAL001-550-2021  
 Valor: \$ 1.282.799.166

Nombre del Contratista:  
 DIEGO DAVID  
 MELO CAMPIÑO

**Contrato de Interventoría**  
 No. 9677-PPAL001-969-2021  
 Valor: \$ 82.756.811,75  
 (Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO  
 INTERVENTORIA  
 PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD  
 Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)



Fundición de losas de Pavimento.



Fundición de andenes

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 6.643.141.316,25**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra



**Plazo:** DOCE (12) MESES

**Fecha de suscripción:** 15 – JUN - 2021

**Fecha acta de inicio:** No cuenta aún con fecha de acta.

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

**Estado Actual:**

La UNGRD ya dio los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario, en trámite para incorporarlos al contrato de obra y en aprobación ante la Alcaldía de Mocoa el ajuste del proyecto. Se reitera a la alcaldía de Mocoa necesidad de contestar.

**45.589**  
 Personas beneficiadas



*Toma de topografía*



<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-900-2021                  Valor: \$ 6.240.520.933</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-969-2021                  Valor: \$ 402.620.383,25</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b>                  CONSORCIO VIAS 897</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría</b>                  CONSORCIO INTERVENTORIA                  PAVIMENTOS 063</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

## ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

**\$2.617.277.429,17**

## EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría**

Plazo: **OCHO (8) MESES**  
Fecha de suscripción: 02 – AGO-2021  
Fecha acta de inicio: Pendiente



## TIPO DE INTERVENCIÓN

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

### Estado Actual:

Se realiza evaluación de adicionales solicitados por contratista.

 **45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 2.435.079.371</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 182.198.058,17</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



**Solicitud de convocatoria a comité técnico.**



## ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.



**2.**

# SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

## CONTRATOS DE OBRA SAUCES II

TOTAL VIVIENDAS

**1.209**


VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

**300**

	NO. VIVIENDAS	CONTRATISTA	VALOR ACTUAL	VALOR ADICIONAL	AVANCE	AVANCE FINANCIERO
CONTRATO 243 DE 2018	436	CONSORCIO MOCOA 2019	\$25.731.568.960,00	\$ 17.868.431.040,00	34,28%	20%
CONTRATO 244 DE 2018	473	CONSORCIO MOCOA 2019	\$27.915.211.280,00	\$ 19.384.788.720,00	31,10%	17,4%
			<b>\$ 53.646.780.240,00</b>	<b>\$ 37.253.219.760,00</b>		
TOTAL DE VIVIENDAS	<b>909</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 90.900.000.000,00</b>			

Estudios y diseños 98,23% (244), movimiento de tierras 270 terrazas para igual número de viviendas, manzanas intervenidas: T(24), U(24), I(24), J(24), K(24), V(24), W(24), X(24), AE(28), AF(28), AH(12), AG(16), 3 cuadrillas de mano de obra para cimentaciones, 1 cuadrilla para estructura, 1 cuadrilla para instalaciones eléctricas y 2 cuadrillas para instalaciones hidrosanitarias, 2 cuadrillas de movimiento de tierras. Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, dos proveedores de concreto, En obra 4 formaletas. Pendiente de cobro aprox \$640 millones (48 cimentaciones fundidas). Interventoría emitió concepto positivo reprogramación de metas, nueva fecha de terminación contrato 244 sería 30 de septiembre 2022 (para julio 31 de 2022 504 viviendas), se puso a consideración de comité técnico de supervisión convenio 217 de 2017, en proceso de gestión. Expedido otrosí No. 4 adición Convenio 217 y en estudio por Grupo Gestión Contractual UNGRD instrucciones adición contratos 243 y 244. Una vez se expidan los otrosíes de los contratos 243 y 244 se liberan aproximadamente \$6.000 millones de pesos, mayor valor de lo pagado a la fecha. Se inició proceso de incumplimiento parcial contratos 243 y 244 de 2018.

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	CONTRATISTA <b>HMV INGENIEROS LTDA</b>
	VALOR <b>\$7.049.420.065</b>
	AVANCE FINANCIERO <b>30,00%</b>

## META JULIO 2022



**Julio 31 / 2022**

**909**



Viviendas terminadas y entregadas en total

En revisión por UNGRD/FNV solicitud del Consorcio para modificar metas y prorrogar la fecha de terminación del contrato 244 para 30 de septiembre de 2022.

43



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República



## ACTIVIDADES RELEVANTES




**Movimiento de tierras 54,450 m3** de tierra (incluido expansión). **270 terrazas**  
**Cimentaciones fundidas: 110,**  
**Viviendas con muros de primer piso fundidos: 42**  
**Viviendas con muros de segundo piso fundidos: 4**  
**Viviendas con losa entrepiso fundida: 22**




**Obra presenta ingreso de personal, promedio semanal de 81 trabajadores (Administrativos 20, mano de obra 55 y maquinaria amarilla 7), para cumplimiento de metas debe ingresar mayor personal, compromiso del consorcio para abril: 234 personas en obra, llegada de formaletas 3 y 4, en obra 4 formaletas completas.** UNGRD realizó acompañamiento diario a Consorcio orientado a facilitar ingreso de personal de obra, **SENA ABRIÓ CONVOCATORIA PARA VINCULAR PERSONAL AYUDANTES Y OFICIALES DE CONTRUCCIÓN**, gran evento de recepción de hojas de vida Cámara de Comercio del Putumayo el 22 de abril de 2022, alcaldía y concejo municipal se unieron a la convocatoria de personal. Consorcio presentó solicitud de trámites ambientales ante la Corporación. Consorcio se comprometió a entregar 504 viviendas en JULIO 2022, en trámite por UNGRD/FNV solicitud de reprogramación de metas y finalización de contrato 244 a sep 30 2022.



Se espera que las gestiones del consorcio ante Corpoamazonía confirmen lo prescrito en la licencia de urbanismo en el sentido de poder construir las 909 viviendas en el predio. El consorcio radicó ante la corporación la solicitud ambiental, está en estudio de parte de la corporación. Consorcio al día en pagos a subcontratistas, Consorcio informó que para la semana del 18 al 22 de abril habrá un cambio fundamental y progresivo para atender compromisos contractuales y **programó reunión con la CORPORACIÓN.**



En proceso de **cobro 48 cimentaciones \$640 millones** aprox  
 UNGRD pagó hito estudios y diseños contrato 244 **\$3.400 millones** aprox  
 Con la expedición de los otrosíes de adición a los contratos de obra 243 y 244 se liberan por mayor valor de los contratos, aproximadamente **\$6.000 millones** de pesos.

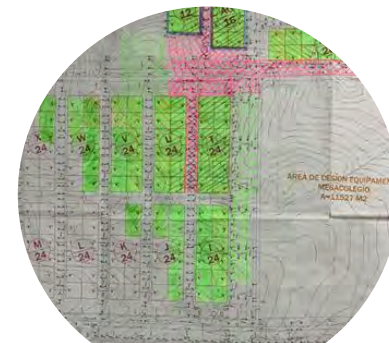

*Avance movimiento de tierras*





COMPROMISOS REUNIONES 12, 25 y 28 DE ENERO 2022

VICEPRESIDENCIA-MINVIVIENDA-UNGRD.

1

Inventario de materiales para adelantarnos a los posibles problemas, insumos y otros.

Entregado 28 de enero, Interventoría emitió observaciones, en ajuste por Consorcio. Compromiso de entrega: lunes 18 de abril de 2022.

2

Mano de obra en todos los frentes a más tardar en una semana.

81 trabajadores promedio esta semana. Bajo **RENDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS.** Se requiere vinculación de personal, compromiso consorcio para abril: **234** trabajadores.

3

Reunión con Corpoamazonía 26 de enero Consorcio, Interventoría, MINVIVIENDA, Gobernación, UNGRD

**Temas ambientales:** Ocupación de cause costado occidental del predio, posible nacedero en costado sur del predio. Consorcio radicó solicitud de trámite ante la corporación. A la espera de pronunciamiento de CORPOAMAZONÍA. Consorcio programó reunión con la CORPORACIÓN para la semana del 18 al 22 de abril.

4

A 30 de enero 4 formaletas en obra y 200 obreros activos.

Llegada a obra de juego 3 y 4 de formaletas. Bajo número de personal en obra, se requiere de manera urgente la vinculación de personal para instalación de formaletas para cumplimiento de metas.


5

Reporte diario de gestión

Incluir gestiones ante corporación y aspectos financieros a través de informe diario de personal. Mantener informado a contratante del estado técnico y financiero de los contratistas de obra. **CUMPLIDO.**



# VIVIENDA URBANA SAUCES II

 CONSORCIO MCOCA 2019		PROYECTO SAUCES II		F-SST-67						
		CONTROL DIARIO PERSONAL		Versión I						
				11/03/2019						
SEMANA I DEL 4 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL DE 2022			TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO	
CONSORCIO MCOCA 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	9	9	9	9	9	9		9	
CONSORCIO MCOCA 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	3	3	3	3	3	3		3	
INTERVENTORIA HMV	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	8	8	8	8	8	8		8	
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
		L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MCOCA 2019	2	1	2	2	2	2		2
VIGILANCIA CM 2019	CELADURIA OBRA	2	2	2	2	2	2		2
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	7	7	7	7	7	7		7
CASTAÑEDA COSNTRUCTORA SAS	CIMENTACION	9	8	9	9	9	9		9
SINIESTERRA CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	9	10	10	10	10	10		10
RDL LOGISTICA Y SOLUCIONES	ESTRUCTURA	13	11	16	16	16	16		15
ELECTROSERVIG	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	2	2	2	2	2	2		2
BCH HIDROSANITARIAS SAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5	5	5	5	5	5		5
TEJA CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2	2	2	2	2	2		2
SEBCO SAS	BOMBA MOVIL DE CONCRETO	2	0	0	2	2	2		1
<b>TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>		<b>53</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>		<b>55</b>
JUAN PABLO GUERRERO	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	1	0	0	0		0
JUAN PABLO GUERRERO	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	6	0	0	0		1
JUAN PABLO GUERRERO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	0	0	1	0	0	0		0
EDUARDO MORA	OPERADORES	0	0	0	0	0	0		0
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0	0		0
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0	0		0
LEONEL OJEDA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0	0		0
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0	0		0
LEONEL OJEDA	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1	0	0	0	1	1		1
WILSON PUENTES	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1	1	1	1	1	1		1
WILSON PUENTES	OPERADOR MINICARGADOR	1	1	1	1	1	1		1
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	2	2	3	3	3	3		3
<b>TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL PERSONAL EN EL DIA</b>		<b>78</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>83</b>		<b>81</b>

## PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 80

Local: 52  
65%

Calificados: 26  
50%

No Calificados: 26  
50%

Foráneo: 28  
35%

Calificados: 12  
43%

No Calificados: 16  
57%

**36**  
 VIVIENDAS RURALES  
 EN SITIO PROPIO



## PROCESO CONTRATO DE OBRA

El 28/09/2021 se adjudicó el proceso N° FNGRD-LP-002-2021 al CONSORCIO OTES MOCOA 1.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>,

## PROCESO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


El 03/12/21 se adjudicó el proceso N° FNGRD-CMA-001-2021 al CONSORCIO APOYOS 2022.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376922&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Contrato de obra consorcio Otes Mocoa 1	\$ 2.406.425.590,00
Contrato de interventoría consorcio apoyos 2022	\$ 220.276.140,00
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 2.626.701.730,00</b>

**Nota:** Se firmó por parte de los contratistas acta de inicio con fecha del 26/01/2022 y con fecha de finalización el 25/09/2022.

Actualmente, el contratista de obra avanza en la ejecución según lo establecido en el cronograma; se evidencia desde el 11 de abril la entrega de materiales a los primeros beneficiarios para el inicio de las obras; a la fecha se encuentran en la actividad de excavaciones para cimentación y figurado de hierro. Se verificó por parte de la Interventoría la adecuación de los lotes por parte de los beneficiarios.

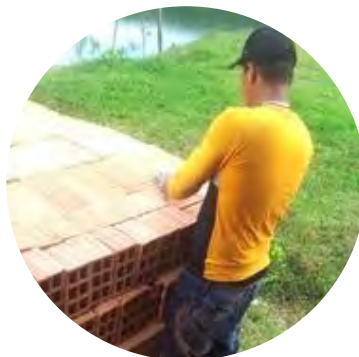

**3.**

# SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$19.194 millones  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

**\$ 19.194 millones**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES  
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018  
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018  
Fecha de finalización: 30 - JUN - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

**CONSTRUCCIÓN** de infraestructura educativa.

## IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

## PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 41

Local: 25  
**61%**

Foráneo: 16  
**39%**

Calificados: 6  
**24%**

No Calificados: 19  
**76%**

Calificados: 11  
**69%**

No Calificados: 5  
**31%**

**39,97%**

Avance  
Financiero

**76,30%**

Programado

**73,64%**

Ejecutado

Avance Físico



Fotos: Avance Fase 2

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-225-2018  
Valor: \$ 17.176.740.466

**Nombre del Contratista:**  
Consorcio Colegio Mocoa

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-228-2018  
Valor: \$1.275.731.970

**Nombre de la Interventoría:**  
INGEVAL S.A.S.

## SUPERVISOR UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello -  
Subdirección para la Reducción del Riesgo



# PROYECTO CENTRO PENITENCIARIO



Predio identificado y presentado por la Alcaldía: **100%**

**Avalúo del Predio:** En proceso de actualización del avalúo por parte del Municipio de Mocoa.

Convenio formalizado: **100%**  
 (9677-PPAL001-1292-2021)

**Fecha acta de inicio:** 19/OCT/21  
**Fecha finalización:** 18/JUN/22

Valor convenio: **\$1.310.921.000**

Recursos disponibles a través de un FIC:  
**001001031616**

**ENTIDADES PARTICIPANTES:**  
 USPEC - INPEC - ALCALDIA DE  
 MOCOA - UNGRD

**ALCANCE:**  
 Compra de predio de 11 hectáreas  
 para la construcción de nuevo  
 ERON y su escrituración y registro.

**ESTADO:**  
 La UNGRD cumplió con su compromiso de  
 financiación al **100%**

La Alcaldía de Mocoa se encuentra en proceso de  
 adquisición del predio.

## OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO

### ETAPA

1

#### ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



### ETAPA

2

#### ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	31-MAY-2022
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	96%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	91.5%
AVANCE FINANCIERO ETAPA I Y II	89%
ESTADO	Proyecto en ejecución, se adelanta actividades de instalación de micromedidores en las redes de distribución del proyecto.



**4.**

# PROYECTOS EN CONTRATACIÓN

## Impacto

**33** Intervenciones – obras de estabilización y recuperación



Actores e inversión

**\$206.257 Millones**

FNGRD - UNGRD

## CRONOGRAMA

### ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

2023

Mes:

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN -DIC

ENE - OCT

**1**

Estructuración de los procesos (Precontractual).

**1**

mes

**2**

Proceso de contratación.

**2**

meses

**3**

Ejecución de obras.

**18**

meses



## AVANCES

- Estudios y diseños de obras de mitigación para los sectores medio y alto de las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y parte alta de la quebrada Taruca.
- Se asignaron los recursos para la ejecución de las obras de mitigación.
- 11 procesos de obra y 11 de interventoría en etapa precontractual.
- En proceso de cotización 8 procesos de interventoría y en evaluación 10 procesos de obra.



## AVANCES

**Impacto** **87 Familias**

**Actores e inversión**  
**\$ 9.309 Millones**

- \$ 5.763 millones: Fonvivienda
- \$ 3.545 millones: FNGRD - UNGRD

- Se adelantan los trámites para la incorporación de los recursos al convenio.
- Equipo de trabajo de la UNGRD realizó desplazamiento al municipio de Mocoa para realizar visita al predio. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la UNGRD y la alcaldía con el fin de verificar los requisitos de postulación del predio.

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración	2022										2023	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT-DIC	ENE-JUN	
1 Incorporación recursos al convenio	2 semanas												
2 Postulación y adquisición predio	5 meses												
3 Proceso precontractual contratación obra	3 semanas												
4 Proceso precontractual contratación interventoría	2 semanas												
5 Ejecución fase I contratos de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	3 meses												
6 Ejecución fase II contratos de obra - construcción proyecto 87 viviendas y obras de urbanismo	9 meses												

**NOTA:** Los tiempos anteriores dependerán de la postulación del predio por parte de la Alcaldía de Mocoa.



## AVANCES

Impacto **216 Familias**



Actores e inversión

**\$ 32.107 Millones**

- \$ 22.590 millones: FNGRD - UNGRD
- \$ 9.517 millones: BAC

- El 8 de abril de 2022 se radicó en el área de Gestión Contractual la solicitud de elaboración del proceso de selección para contratar las obras.
- El 11 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de Gestión contractual y el equipo técnico y jurídico de la SDG, como resultado de la reunión se definió hacer una solicitud de información de proveedores teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021 y Artículo 32 de la Ley 2069 de 2020. Es por ello que ese mismo día se radicó en el área de gestión Contractual dicha solicitud para ser cargada en el SECOP antes de publicar el proceso para la construcción de las viviendas.
- El 12 de abril de 2022 se cargo a través de la plataforma SECOP II la encuesta "EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES", en aras de determinar el análisis del sector para los fines señalados según Decreto 1860 de 2021 y Artículo 32 de la Ley 2069 de 2020

Proceso contratación 216 viviendas – Urbanismo >>>

Proceso contratación Red eléctrica >>>

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE 216 VIVIENDAS Y OBRAS DE URBANISMO	\$ 15.881.977.890	OBRA
	\$1.780.995.315	INTERVENTORÍA
RED ELÉCTRICA	\$3.552.090.750	OBRA
	\$248.646.353	INTERVENTORÍA
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.463.710.307</b>	

## CRONOGRAMA

### ACTIVIDAD

Duración (meses)

2022  
Mes:

2023  
Mes:

FEB MAR ABR MAY JUN JUL - DIC ENE-MAY

1	Proceso para la contratación de las obras de vivienda VISR.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proceso para la contratación de la interventoría de vivienda VISR.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ejecución fase I contrato de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ejecución fase II contrato de obra - construcción proyecto 216 viviendas y obras de urbanismo (20 viviendas por mes)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



El futuro es de todos

Presidencia de la República

# CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO

## Impacto

**435** Comerciantes beneficiados de forma directa

### Actores e inversión

**\$18.976 Millones**

FNGRD - UNGRD

• FNGRD – UNGRD y Municipio de Mocoa



## AVANCES

- En revisión del GGC la solicitud de otrosí de adición de 1998 millones al convenio interadministrativo.
- En estructuración de documentos para publicar en SECOP la contratación de la obra por Ley 80

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022						2023	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-NOV
1 Estructurar Convenio con Municipio de Mocoa	2	■	■						
2 Estructurar proceso licitatorio de obra e interventoría	2	■	■						
3 Publicación y adjudicación contrato de obra (Ley 80)	4			■	■	■			
4 Publicación y adjudicación contrato de Interventoría (Ley 80)	3				■	■	■		
5 Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	5 días								
6 Ejecución fase I contrato de obra - revision estudios y diseños	6						■		
7 Ejecución fase II contrato de obra - construcción de la galería de la plaza de mercado	17						■	■	



Impacto

**16** barrios **2.522** usuarios

Actores e inversión

**\$7.500 Millones**

FNGRD - UNGRD

- Viceministerio de agua y Saneamiento Básico, Findeter y FNGRD – UNGRD.



## AVANCES

- Se suscribió convenio No. 9677-PPAL001-463-2022, entre el FNGRD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El 16/02//2022 se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos No. 9677-PPAL001-609-2022, celebrado con Findeter.
- Se inicia proceso de publicación de pliegos de contratación y adjudicación de estudios y diseños, obra e interventoría, por parte de Findeter.
- El 31/03/2022, al cierre de la convocatoria pública, se declara desierta por la no presentación de oferentes.
- Se plantea una Rueda de Negocios por parte de Findeter entre los días 6 y 11 de abril de 2022, para socializar el proyecto con potenciales oferentes, con experiencia en la zona y realizar los ajustes pertinentes a la convocatoria.
- El 12 de abril se definirá por parte de Findeter el Nuevo proceso de Convocatoria (Pública o Privada), resultado de la rueda de negocios.

## ACTIVIDAD

2022

Mes:

Duración

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY-NOV

DIC


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY-NOV	DIC
<b>1</b> Suscripción del convenio con el Viceministerio de agua y saneamiento básico	2 semanas	█				
<b>2</b> Suscripción del contrato con Findeter para la ejecución del proyecto	2 semanas		█			
<b>3</b> Creación del patrimonio autónomo y trámites precontractuales	4 semanas		█			
<b>4</b> Proceso de contratación obra e interventoría	5 semanas			█		
<b>5</b> Legalización de los contratos de obra e interventoría	1 semana			█		
<b>6</b> Ejecución	8 meses y 2 semanas			█	█	█



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República





Impacto

**45.589** Personas beneficiadas

Actores e inversión

**\$553 Millones**

FNGRD - UNGRD



## AVANCES

- Se asignaron los recursos para el fortalecimiento del SAT.
- En revisión y ajustes en el GGC para realizar la invitación a cotizar (Proceso por Ley 1523).

## CRONOGRAMA

### ACTIVIDAD

Duración  
(meses)

2022

Mes:

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

1


Proceso contratación

2

2

Ejecución de actividades




3



**5.**

# GENERACIÓN DE EMPLEO

# GENERACIÓN DE EMPLEO

	<b>INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN</b>	<b>81</b>
	<b>EMPLEO GENERADO A LA FECHA</b>	<b>683</b>
	<b>PERSONAL PROYECTADO</b>	<b>1930</b>

	06/04/22	13/04/22		06/04/22	13/04/22
<b>MANO DE OBRA LOCAL</b>	<b>475</b>	<b>495</b>	<b>MANO DE OBRA FORÁNEA</b>	<b>190</b>	<b>188</b>
CALIFICADOS	214	215	CALIFICADOS	142	144
NO CALIFICADOS	261	280	NO CALIFICADOS	48	44
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	71%	72%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	29%	28%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.229	1.579
EMPLEOS INDUCIDOS	273	351
<b>TOTAL EMPLEOS</b>	<b>1.502</b>	<b>1.930</b>

**GRACIAS**
