

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Julio 13 de 2022



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Sistema Integrado
de Planeación y
Gestión de la UNGRD
certificado en:



1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$171.294 millones



Total de contratos

18 de obra

Ejecución

18

% en Perfeccionamiento

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.480 millones



Total de contratos

13 de obra

Ejecución

13

% en Perfeccionamiento

100%

4 de interventoría

4

100%

Estamos ejecutando **24** sectores en total
 10,66 Km de pavimento

1.1

PROYECTOS FINALIZADOS

Proyecto finalizado

Obras de control de protección y/o estabilización

En **desarrollo del proyecto** se construyeron 2569,88 m2 de pantallas ancladas para la mitigación, estabilización y consolidación de los taludes aferentes al barrio Modelo en el Municipio de Mocoa.
 Empleos Generados: **26**

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-063-2019
 Valor: \$ 3.841.235.901

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-261-2019
 Valor: \$ 453.207.180,00

Nombre del Contratista:
 Virgilio Bravo Sosa

Nombre de la Interventoría:
 Yahara Maritza Viveros Ortiz



Antes

*Ficha 1 – Obras de mitigación

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
 Fecha de terminación programada: 28 - DIC - 2021
 Fecha de terminación real: 28- DIC- 2021
 Avance financiero Interventoría: 44,21%
 Avance financiero Total: 85,52%
 Avance físico: 100%

INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 4.294.443.081

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589

Proyecto finalizado

Obras de Pavimentación

En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 349 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes y una longitud de 436,7 metros lineales de alcantarillado pluvial.

Empleos Generados: **38**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-407-2021

Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre del Contratista:

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 72.318.929,67

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG.

Antes

*Ficha 4 – Vías y alcantarillado

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 27 - ABR – 2021

Fecha de terminación programada: 18- ENE- 2022

Fecha de terminación real: 18- ENE- 2022

Avance financiero: 49,41%

Avance físico: 100%

INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 1.089.977.324,67

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589



El futuro es de todos

Presidencia de la República

Obras de Pavimentación

Proyecto finalizado



Antes

En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 318,65 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes.
 Empleos Generados: **40**

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-518-2021
 Valor: \$ 1.206.210.066

Nombre del Contratista:
 UNIÓN TEMPORAL CAIMARON

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 85.718.175,52

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER 5HG.

*Ficha 6 – Vías y alcantarillado

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 19 - ABR – 2021
 Fecha de terminación programada: 18- NOV- 2021
 Fecha de terminación real: 18 – NOV – 2021
 Avance financiero: 90%
 Avance físico: 100%

INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 1.291.928.241,52

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589

Proyecto finalizado

Mejoramiento de vías urbanas

En **desarrollo del proyecto** se mejoraron 1048.716ml de vía rural a través de sistema de placa huella, con sistema de recolección de aguas lluvias a través de berma cuneta.

Empleos Generados: **40**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-549-2021

Valor: \$1.830.025.649

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS
 MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 130.049.038,90

(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG

Antes

*Ficha 10 – Vías y alcantarillado

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 06 – JUL - 2021

Fecha de terminación programada: 18- MAY- 2022

Fecha de terminación real: 18 – MAY-2022

Avance financiero: 38,37%

Avance físico: 100%

INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 1.960.074.687,90

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589



El futuro es de todos

Presidencia de la República

1.2

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN*

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.838.401.531,00	81,80%	32,47%	\$ 10.662.628.977,12	83,80%	\$ 27.518.580.482,98	+ 51,33%
3	\$ 4.649.908.733,08	19,24%	83,18%	\$ 3.867.794.084,18	56,83%	\$ 2.642.543.133,01	- 26,35%
4	\$ 6.169.543.804,64	22,45%	77,00%	\$ 4.750.548.729,57	35,49%	\$ 2.189.571.096,27	-41,51%
5	\$ 7.470.111.514,00	22,91%	72,48%	\$ 5.414.336.825,35	37,00%	\$ 2.763.941.260,18	- 35,48%
6	\$ 11.015.174.280,00	20,83%	57,80%	\$ 6.366.770.733,84	72,10%	\$ 7.941.940.655,88	+14,30%
7	\$ 12.251.982.484,00	20,67%	76,30%	\$ 9.348.262.635,29	42,06%	\$ 5.153.183.832,77	-34,24%
8	\$ 7.201.817.823,00	35,40%	55,97%	\$ 4.030.857.435,53	60,04%	\$ 4.323.971.420,93	+ 4,07%
9	\$ 6.826.692.363,00	36,37%	62,45%	\$ 4.263.269.380,69	76,02%	\$ 5.189.651.534,35	+13,57%
10	\$ 5.707.203.584,54	58,89%	75,32%	\$ 4.298.665.739,88	77,20%	\$ 4.405.961.167,26	+1,88%
11	\$ 16.650.891.855,01	46,51%	80,97%	\$ 13.482.227.135,00	84,14%	\$ 14.010.060.406,81	+3,17%
12	\$ 26.513.662.153,00	25,79%	73,56%	\$ 19.503.449.879,75	72,18%	\$ 19.137.561.342,04	- 1,38%
13	\$ 2.942.990.793,02	36,76%	86,29%	\$ 2.539.506.755,30	90,02%	\$ 2.649.280.311,88	+3,73%
14	\$ 2.087.786.575,20	0%	40,97%	\$ 855.366.159,86	28,64%	\$ 597.942.075,14	-12,33%
15	\$ 6.700.484.099,80	0%	17,06%	\$ 1.143.102.587,43	10,13%	\$ 678.759.039,31	-6,93%
16	\$ 8.981.109.126,81	0%	39,03%	\$ 3.505.326.892,19	8,33%	\$ 748.126.390,26	-30,70%
17	\$ 8.470.387.014,38	25,24%	43,10%	\$ 3.650.736.803,20	33,43%	\$ 2.831.650.378,91	- 9,67%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	2,13%	\$ 102.586.939,45	1,73%	\$ 83.321.786,50	- 0,40%
TOTAL	\$ 171.294.435.971,48	\$61.875.121.688,24		\$ 97.785.437.693,62		\$ 102.866.046.314,47	
		36,12 %		57,09%		60,05%	

*Obras de mitigación Cuenca media y baja

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 32.838.401.531,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020

Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2021

Fecha de suspensión: 24 - DIC - 2021

Fecha de terminación: 15- FEB - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

Estado Actual:

El 22 de abril 2022 se radicó trámite de **ampliación suspensión** del contrato de obra e interventoría, por un tiempo de 4 meses.

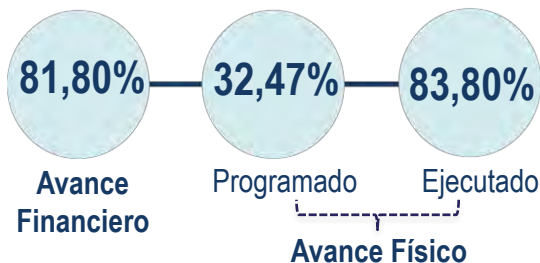

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.413.014.931,00</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.386.600,00</p>
<p>Nombre del Contratista: INGECON SA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 4.649.908.733,08

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de suspensión: 01 –ABR- 2022
Fecha de reinicio: 01- AGO – 2022
Fecha de terminación: 11- AGO-2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 22
Total Projectado: 22

Local: 19
86%


Foráneo: 3
14%

Calificados: 9
47%

No Calificados: 10
53%

Calificados: 3
100%

No Calificados: 0
0%

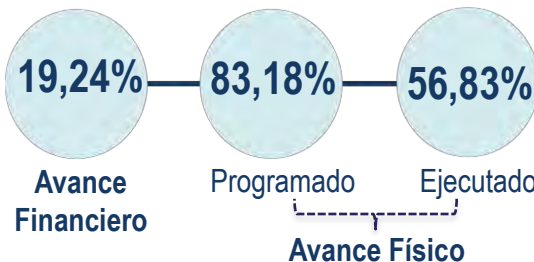

45.589
Población beneficiada



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1025-2020
Valor: \$4.302.041.377,00

Nombre del Contratista:
CONSORCIO RECUPERACIÓN
MOCOA LH 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 347.867.356,08
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



Desenfofre de formaletas azud 8

ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 6.169.543.804,64

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
Fecha de suscripción: 16 – SEP- 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB – 2021
Fecha de suspensión: 01 –ABR- 2022
Fecha de reinicio: 01- AGO – 2022
Fecha de terminación: 01- SEP-2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

Estado Actual:

Reprogramación con plan de contingencia exhaustivo.
No se presenta avance ejecutado a causa de ola invernal.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 9
Total Projectado: 9

Local: 7
78%

Foráneo: 2
22%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 2
100%

No Calificados: 0
0%

22,45%

Avance
Financiero

77,00%

Programado

35,49%

Ejecutado

Avance Físico

45.589 
Población beneficiada



Dique tipo Azud 9



Muro 7



ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.470.111.514,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
Total Projectado: 19

Local: 12
63%


Foráneo: 7
37%

Calificados: 12
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%

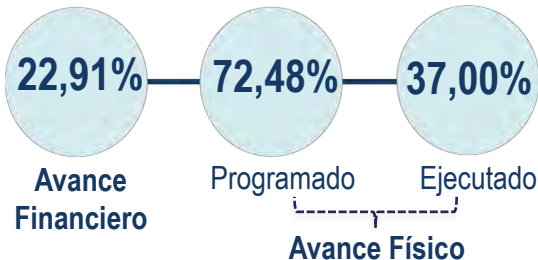

45.589
Población beneficiada

**No presenta avance debido a las crecientes súbitas en río Mulato*

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.923.961.014</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 546.150.500,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO MULATO.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Adecuación de terreno para desvío de cause en dique 2



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

6 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO 1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.174.280,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 09 - NOV - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

Estado Actual:
Se realiza reprogramación por prórroga en el tiempo del contrato por 4 meses.

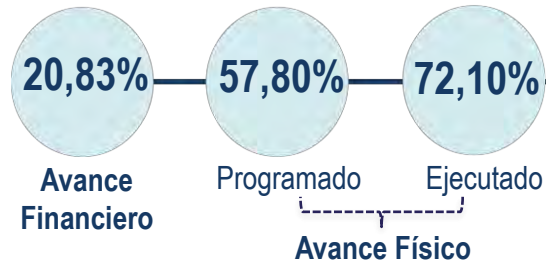

45.589 
Población beneficiada

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 32 Total Projectado: 32	Local: 22 69%	Calificados: 7 32%
		No Calificados: 15 68%
	Foráneo: 10 31%	Calificados: 8 80%
		No Calificados: 2 20%

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.094.882	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.079.398
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020

Supervisor UNGRD
Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



Movimiento de tierras para el nuevo cause



Nuevo cause del río



ALCANCE

- Dique Abierto 3
- Muro 1
- Azud 05
- Muro 2
- Azud 04
- Muro 3



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 12.251.982.484,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

Estado Actual:

Contratista avanza con plan de contingencia y se adelanta proceso de incumplimiento por atraso. Interventoría reporta programado de acuerdo a reprogramación No.2

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 49
Total Projectado: 49

Local: 35
71%


Foráneo: 14
29%

Calificados: 11
31%

No Calificados: 24
69%

Calificados: 12
86%

No Calificados: 2
14%

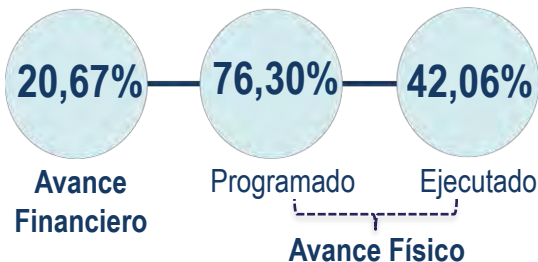

45.589 
Población beneficiada



Crecientes súbitas, desbordamiento del río Mulato

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-201-2021
Valor: \$ 11.323.151.784

Nombre del Contratista:
CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-344-2021
Valor: \$ 928.830.700

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO MUROS MOCOA

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 06 - Muro 4 - Azud 07 - Muro 5
- Muro 5 - Muro 09 - Azud 11 - Muro 8
- Muro 10 - Azud 12 - Obras de drenaje



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.201.817.823,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20

Total Projectado: 35

Local: 15
75%

Foráneo: 5
25%

Calificados: 7

47%

No Calificados: 8


53%

Calificados: 5

100%

No Calificados: 0

0%

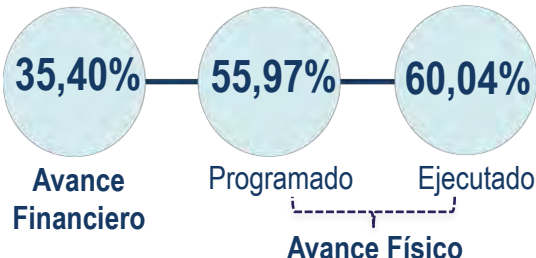

45.589
 Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.665.699.934</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.117.889,10 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



Reforzando el Jarillón de protección



Colmatación de materiales sobre dique 1

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$6.826.692.363,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención **CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 22 Total Projectado: 35	Local: 10 45%	Calificados: 8 80%
		No Calificados: 2 20%
	Foráneo: 12 55%	Calificados: 8 67%
		No Calificados: 4 33%

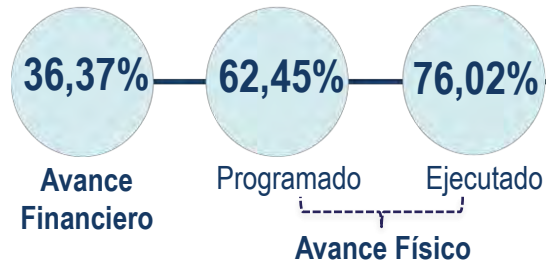

45.589 

Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.318.499.572</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO MURO RIO MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.192.790,90 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



Colmatación de materiales sobre dique 2 , daño de aceros

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.203.584,54

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20
Total Projectado: 35

Local: 9
45%


Foráneo: 11
55%

Calificados: 4
44%

No Calificados: 5
56%

Calificados: 4
36%

No Calificados: 7
64%

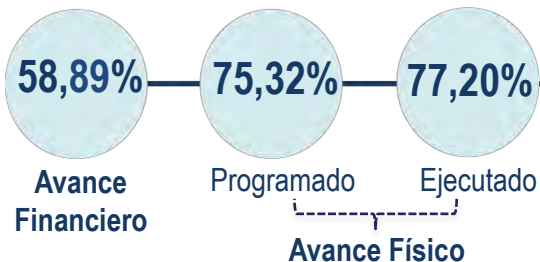

45.589 
Población beneficiada

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.236.745,59
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOCHA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mococho



Construcción muro 4



ALCANCE

• Azud 11 • Muro 04 • Muro 05



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 16.650.891.855,01

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 47
Total Projectado: 45

Local: 35
74%


Foráneo: 12
26%

Calificados: 6
17%

No Calificados: 29
83%

Calificados: 7
58%

No Calificados: 5
42%

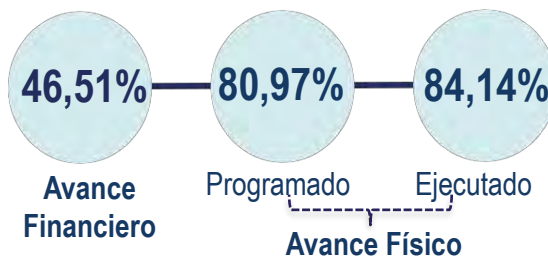

45.589
Población beneficiada

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1064-2020
Valor: \$ 15.407.336.784,60

Nombre del Contratista:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS
RIO SANGOYACO 2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 1.243.555.070,41
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mococa



Construcción Azud 14



Construcción Azud 12



- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 26.513.662.153,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 43

Total Projectado: 43

Local: 30
70%

Foráneo: 13
30%

Calificados: 11

37%

No Calificados: 19


63%

Calificados: 7

54%

No Calificados: 6

46%

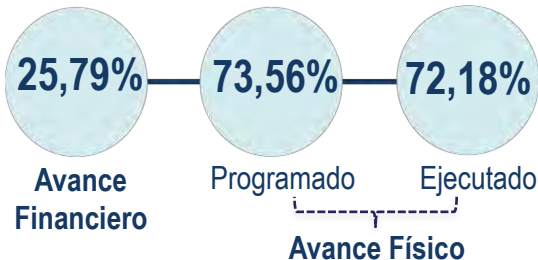

45.589
Población beneficiada

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1382-2020

Valor: \$ 24.560.158.153,0

Nombre del Contratista:

CONSORCIO DRAGADO MOCOCA
2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-205-2021

Valor: \$ 1.953.504.000,00

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mococa



Crecientes súbitas del río Mococa.



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 2.942.990.793,02

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021
Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 39
Total Projectado: 41

Local: 19
49%


Foráneo: 20
51%

Calificados: 7
37%

No Calificados: 12
63%

Calificados: 20
100%

No Calificados: 0
0%

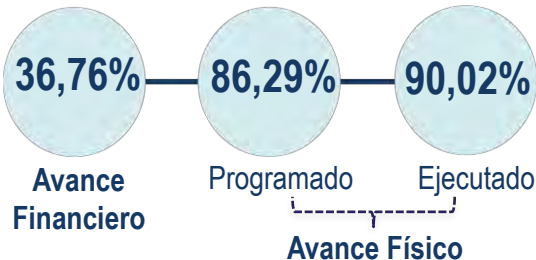

45.589
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.386.639</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.604.155 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Limpieza y adecuación de zona de trabajo ribera derecha después de la creciente del río Sangoyaco (Evaluación de afectaciones) del 02 y 03 de Julio



Construcción de gaviones ribera derecha



ALCANCE

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.087.786.575,20

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones

CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
 Total Projectado: 30

Local: 10
67%

Foráneo: 5
33%

Calificados: 10

100%

No Calificados: 0

0%

Calificados: 5

100%

No Calificados: 0

0%

0,0%

Avance
 Financiero

40,97%

Programado

28,64%

Ejecutado

Avance Físico

45.589
 Población beneficiada

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1330-2020
 Valor: \$ 1.930.861.194,00

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO OBRAS POR
 COLOMBIA

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-133-2021
 Valor: \$ 156.925.381,20
 (para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER – MOCOA
 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



Construcción azud 15

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.700.484.099,80

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021
 Fecha acta de reinicio: 19 – OCT - 2021
 Fecha de terminación actualizada: 14 - ENE – 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 29
 Total Projectado: 30

Local: 13
45%


Foráneo: 16
55%

Calificados: 2
15%

No Calificados: 11
85%

Calificados: 16
100%

No Calificados: 0
0%

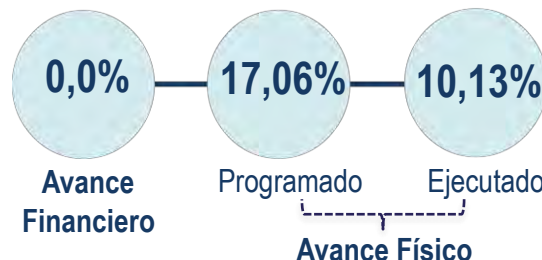

45.589
 Población beneficiada

**No presenta avance de ejecución debido a las crecientes súbitas en río Sangoyaco*

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.196.852.151,00</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.631.948,80 (para este contrato)</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



Construcción muro gavión 10



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.126,81

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021
Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021
Fecha de terminación: 10 - MAY -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

Estado Actual:

Fallo de presunto incumplimiento a Interventoría mediante Resolución No. 0590 de 30/06/22.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 37
Total Projectado: 37

Local: 22
59%

Foráneo: 15
41%

Calificados: 13
59%

No Calificados: 9
41%

Calificados: 11
73%

No Calificados: 4
27%

0,0%

Avance
Financiero

39,03%

Programado

8,33%

Ejecutado

Avance Físico

45.589
Población beneficiada



Encofrado para fundición de cuerpo primera sección de cuerpo Azud 4



Avance fundición de primera sección de cuerpo -Azud 4

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1342-2020
Valor: \$ 8.307.462.026,81

Nombre del Contratista:
CONSORCIO AZUD
MOCOA 520

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-098-2021
Valor: \$ 673.647.100

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORIA MUROS
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 16- JUN- 2021
 Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021
 Fecha de terminación: 25- FEB -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 23
 Total Projectado: 23

Local: 17
74%

Foráneo: 6
26%

Calificados: 7

41%

No Calificados: 10


59%

Calificados: 6

100%

No Calificados: 0

0%

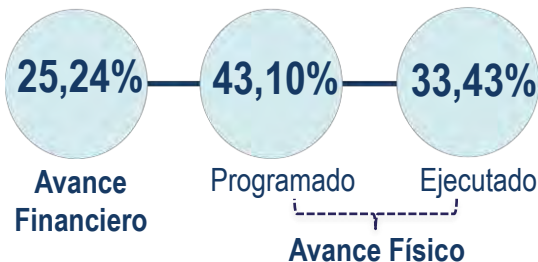

45.589
 Población beneficiada

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-639-2021
 Valor: \$ 7.838.331.969

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO
 CONSTRUOBRAS MOCOA

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-110-2021
 Valor: \$ 632.055.045,38

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Fundición de placas en concreto muro 02.



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES
Fecha de suscripción: 13 – MAR -2021
Fecha acta de inicio: 11 – ABR - 2022
Fecha de terminación: 10- ABR -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 13
Total Projectado: 13

Local: 8
62%

Foráneo: 5
38%

Calificados: 6
75%

No Calificados: 2
25%

Calificados: 2
40%

No Calificados: 3
60%

0,0%

Avance Financiero

2,13%

Programado

1,73%

Ejecutado

Avance Físico

45.589
Población beneficiada



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-183-2021
Valor: \$ 4.452.771.492,00

Nombre del Contratista:
CONSTRUVAL
INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-743-2021
Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INGENIERÍA
DE MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa



Adecuación de terreno

ALCANCE

Construcción:

- Estructuración de Disipación
- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos



El futuro es de todos

Presidencia de la República

1.3

CONSULTORÍA FAJA PARALELA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 5.999.422.108.00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Consultoría - Interventoría

Plazo: QUINCE (15) MESES
Fecha de suscripción: 05- MAY-2021
Fecha acta de inicio: 13 – SEP- 2021
Fecha de terminación: 12- DIC-2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Identificación de los usos y ocupaciones del suelo

IMPACTO

Protección ronda hídrica de los ríos Mulato y Sangoyaco

PERSONAL EN CONSULTORÍA

Total obra: 21
Total proyectado: 21

Local: 19
90%


Foráneo: 2
10%

Calificados: 17
89%

No Calificados: 2
11%

Calificados: 2
100%

No Calificados: 0
0%

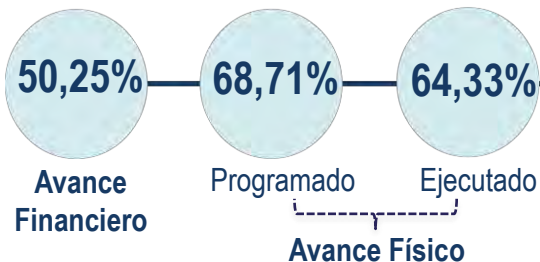

15.000
Población beneficiada

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-606-2021
Valor: \$ 5.519.435.608.00

Nombre del Contratista:
UNIÓN TEMPORAL
SERVICONAL - CSAL

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-621-2021
Valor: \$ 479.986.500,00

Nombre de la Interventoría:
UNIÓN TEMPORAL MOCOA
INTERVENTORÍA

Supervisor UNGRD
Ing. Wilson Eduardo Porras Estrada- Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Faja Paralela



El futuro es de todos

Presidencia de la República

1.3

SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$ 8.840.532.147,00	0,00%	94,05%	\$ 8.314.520.484,25	59,07%	\$ 5.222.102.339,23	-34,98%
2	\$ 1.348.310.810,87	89,01%	99,00%	\$ 1.334.827.702,76	95,11%	\$ 1.282.378.412,22	- 3,89%
3	\$ 2.485.832.907,67	36,19%	97,30%	\$ 2.418.715.419,16	74,91%	\$ 1.862.137.431,14	- 22,39%
4	\$ 1.089.977.324,67	49,41%	100,00%	\$ 1.089.977.324,67	100,00%	\$ 1.089.977.324,67	Finalizado
5	\$ 3.025.332.743,22	0,00%	95,96%	\$ 2.903.109.300,39	15,45%	\$ 467.413.908,83	- 80,51%
6	\$ 1.291.928.241,52	90,00%	100,00%	\$ 1.291.928.241,52	100,00%	\$ 1.291.928.241,52	Finalizado
7	\$ 2.887.889.611,85	0,00%	87,28%	\$ 2.520.550.053,22	42,95%	\$ 1.240.348.588,29	- 44,33%
8	\$ 1.342.679.144,30	69,75%	97,45%	\$ 1.308.440.826,12	97,87%	\$ 1.314.080.078,53	+ 0,42%
9	\$ 4.581.902.966,83	22,24%	61,86%	\$ 2.834.365.175,28	36,56%	\$ 1.675.143.724,67	-25,30%
10	\$ 1.960.074.687,90	38,37%	100,00%	\$ 1.960.074.687,90	100,00%	\$ 1.960.074.687,90	Finalizado
11	\$ 1.365.555.977,75	0,00%	70,00%	\$ 955.889.184,43	70,05%	\$ 956.571.962,41	+ 0,50%
12	\$ 6.643.141.316,25	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$ 2.617.277.429,17	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL	\$39.480.435.309,00	\$ 6.508.662.176,25		\$ 26.932.398.399,71		\$ 18.362.156.699,41	
		16,49%		68,22%		46,51%	

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra
Plazo: DIEZ (10) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021
Fecha de suspensión: 12 –MAY- 2022
Fecha de reinicio: 11- SEP – 2022
Fecha de terminación: 17-SEP-2022



TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

Estado Actual:

Se realiza prórroga de suspensión por dos meses mas.

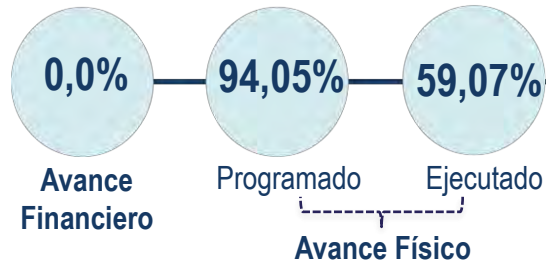

45.589 
Población beneficiada

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.
- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.



Fundición de vía

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$1.348.310.810,87

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de suspensión: 22 –AGO- 2022

Fecha de reinicio: 23- AGO – 2022

Fecha de terminación: 18- SEP-2022



TIPO DE INTERVENCIÓN


Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:

Se encuentra suspendido, el trámite requerido es un adicional en recurso y requiere ser aprobado por la Alcaldía de Mocoa, se radicó el trámite para revisión a alcaldía el 13 de mayo de 2022. Se devolvieron documentos con observaciones para corrección.

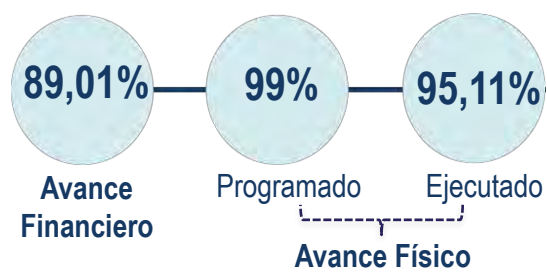

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.459.103,87</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	



Canalización de aguas lluvias



Fundición de placa

ALCANCE

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
 - Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN


**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto
\$2.485.832.907,67

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
 Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021
 Fecha de terminación: 16-SEP-2022
 12-ABR-2022 se solicita prórroga de 3 meses




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

Estado Actual:
Se encuentra suspendido, el trámite requerido es un adicional en recurso y requiere ser aprobado por la Alcaldía de Mocoa, el ajuste se encuentra en revisión de supervisión. La suspensión inicia el 15 de junio de 2022 al 14 de agosto de 2022.

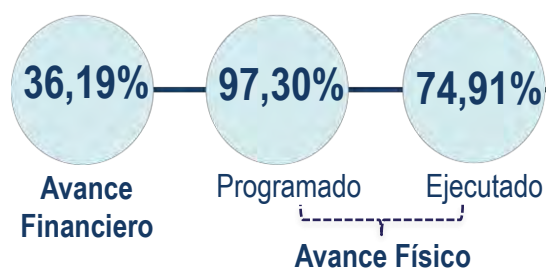

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.932.582,67</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 3.025.332.743,22

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de terminación: 15-AGO-2022

Se solicita suspensión N°1 Estudio reemplazo de alcantarillado

TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

Estado Actual:
Suspendido desde el 4/01/2022 al 14/08/2022.
Requiere solicitar adicional en recursos y presentar
ajuste ante alcaldía.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.727.869,22
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa	

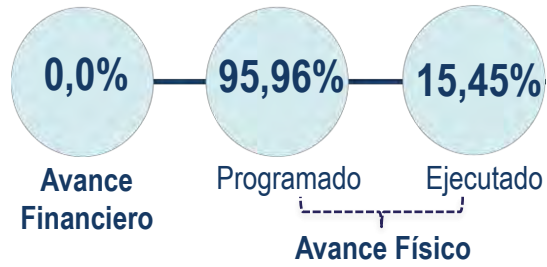

45.589

Población beneficiada



Localización y replanteo Condominio Norte

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.887.889.611,85

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización: 22 – AGO -2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

Estado Actual:
Se solicitó ampliación de la suspensión 2 por un término de dos meses a partir del 14 de junio de 2022 hasta 13 de agosto de 2022.

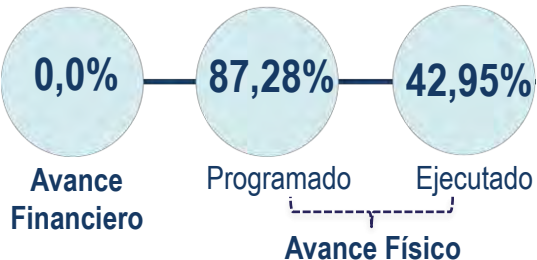

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.608.651,85</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición de placa de andén

ALCANCE

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
 - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$1.342.679.144,30

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021

Fecha de finalización: 15-AGO-22.

Se solicita recursos adicionales para alcantarillado pluvial y suspensión por 60 días



TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Se solicitó suspensión n° 4 por un término de dos meses a partir del 23 de junio de 2022 hasta 22 de agosto de 2022, para subsanar observaciones entregadas por alcaldía de Mocoa.

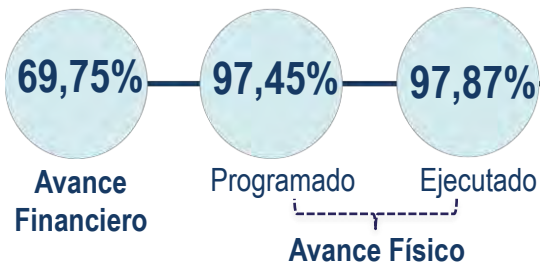

45.589

Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.448,30</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	



Sello de juntas

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS TRAMOS VÍA CIUDADELA DEPORTIVA, QUINTA PAREDES , SECTOR ENTRE JOSÉ HOMERO Y URBANIZACIÓN VILLA LEYVA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.581.902.966,83

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra


Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 29 – MAR – 2021

Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021

Ampliación de suspensión: 06-JUN-2022

29-MAR-2022 Interventoría solicita adición recursos




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 313.184.661,83</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	

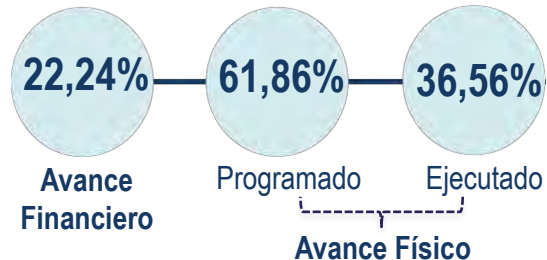

45.589 
Población beneficiada

ALCANCE

Ciudadela deportiva entre CII 12 y Cra 7, y Cra 6 entre CII 4 barrio Jose Homero y CII 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y CII 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

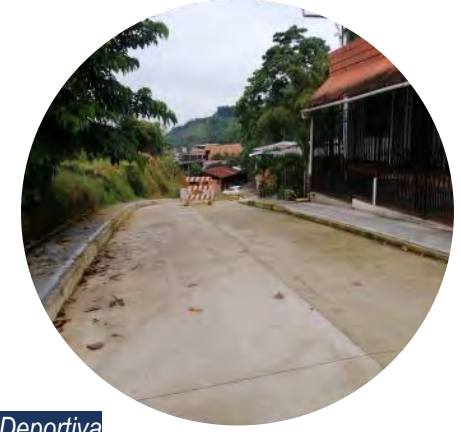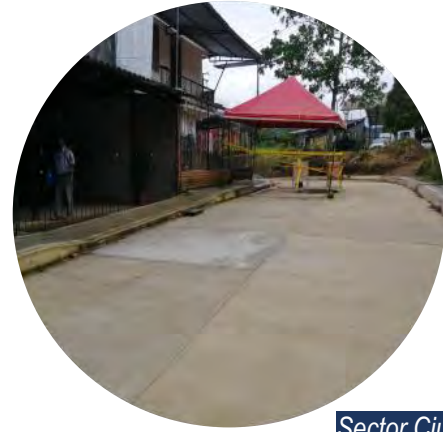

Sector Ciudadela Deportiva

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.365.555.977,75

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021
Fecha de terminación: 16 - AGO - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Proyecto suspendido desde el 26 de abril hasta el 26 de julio.

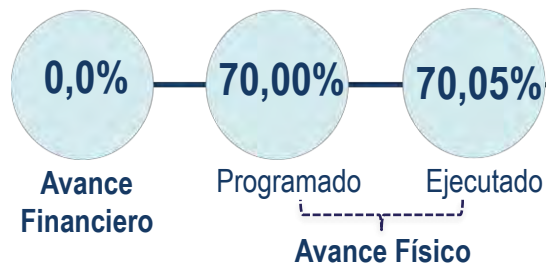

45.589
 Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.756.811,75 (Para este contrato)</p>
<p>Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



Proceso de fundición de tapas de alcantarillado



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.643.141.316,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES
 Fecha de suscripción: 28 – JUL – 2021
 Fecha acta de inicio: 31 – MAY – 2022
 Fecha de finalización: 31-MAY-2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Se avanza en topografía detallada para solicitar permisos de vertimiento y permisos de ocupación de cauce para implantar disipadores a Corpoamazonia.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
 Total Projectado: 12

**Local: 8
 67%**

**Foráneo: 4
 33%**

**Calificados: 7
 87,5%**

**No Calificados: 1
 12,5%**

**Calificados: 4
 100%**

**No Calificados: 0
 0%**



Toma de topografía

45.589
Población beneficiada



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 402.620.383,25</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$2.617.277.429,17

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 02 – AGO-2021
Fecha acta de inicio: Pendiente



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO


Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Reanudación de interventoría y revisión de documentos para ajustes ante Alcaldía

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 2.435.079.371</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 182.198.058,17</p>
<p>Nombre del Contratista: MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II

TOTAL VIVIENDAS

1.209

VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

	NO. VIP	CONTRATISTA	VALOR ACTUAL CONTRATOS	VALOR ADICIONAL (En estudio UNGRD)	AVANCE TECNICO	AVANCE FIN/	VALOR PAGADO	SALDO
CONTRATO 243 DE 2018	436	CONSORCIO MOCOA 2019	\$ 25.731.568.960,00	\$ 17.868.431.040,00	35,03%	20%	\$ 5.146.313.792,00	\$ 20.585.255.168,00
CONTRATO 244 DE 2018	473		\$ 27.915.211.280,00	\$ 19.384.788.720,00	32,49%	17,40%	\$ 4.855.292.697,54	\$ 23.059.918.582,46
			\$ 53.646.780.240,00	\$ 37.253.219.760,00				
TOTAL DE VIVIENDAS	909	VALOR TOTAL	\$ 90.900.000.000,00				\$ 10.001.606.489,54	\$ 43.645.173.750,46

Declarado incumplimiento parcial y penal contratos 243 y 244 de 2018: Contrato 243: \$1.990.594.174,74 y contrato 244: \$1.943.457.009,31. Quedaron en firme el 23 de mayo de 2022. Junio 14 de 2022 declarado siniestro de incumplimiento total en primera instancia Contratos 243 y 244 de 2018, Contrato 243 \$3.155.719.617 y Contrato 244: \$3.639.585.246. Consorcio presentó recurso de reposición el 23 de junio de 2022 en audiencia y presentó plan de choque para construcción de 84 viviendas a 31 de julio de 2022 y cronograma general para cumplimiento de construcción de las 909 viviendas. En seguimiento por interventoría, MINVIVIENDA y UNGRD, el 6 de julio se realizó visita de terreno para verificar avances en obra de acuerdo a lo propuesto por el Consorcio. Consorcio probó mas de \$4.000 millones de inversión en el mes de junio de 2022 y un avance en obra considerado. 12 de julio de 2022 continúa audiencia posible incumplimiento total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA



HMV INGENIEROS LTDA

VALOR



\$7.049.420.065

AVANCE FINANCIERO



32,04%

META JULIO 2022

Declarado incumplimiento total de los contratos de obra PRIMERA INSTANCIA- Consorcio presentó recurso de reposición junto con propuesta para entregar 84 viviendas a 31 de julio de 2022. En seguimiento por Interventoría, MINVIVIENDA y UNGRD



Julio 31 / 2022

909



Número de viviendas contratos 243 y 244 de 2018

45



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



ACTIVIDADES RELEVANTES



Estudios y diseños 98,23% (Contrato 244).

Movimiento de tierras **62,637 m3** de tierra (incluido expansión). 316 terrazas.

Cimentaciones fundidas: **146**, armadas y listas para fundir: 0.

Viviendas con muros de primer piso fundidos: **52**, listos para fundir: 2.

Viviendas con muros de segundo piso fundidos: **6**, listos para fundir: 0.

Viviendas con losa entrepiso fundida: **26**, listas para fundir: 2.

Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, 2 proveedores INTERMITENTES de concreto, en obra 4 formaletas. Contratado con proveedores locales cubiertas, ventanearía, puertas y acabados arquitectónicos para 2 viviendas. **LLEGADA A OBRA DE PLANTA DE CONCRETO (instalada – en pruebas), MALLA EN ACERO PARA MUROS** para primeras 48 viviendas y **650 bultos de cemento.**

Construcción de la línea de alcantarillado que conecta al megacolegio en 87% de ejecución.

Continúan actividades en obra para la reparación de estructuras, 10 viviendas intervenidas.



Obra presenta ingreso de personal, promedio semanal de 81 trabajadores (Administrativos 20, mano de obra 58 y maquinaria amarilla 3), para cumplimiento de metas debe ingresar mayor personal, **No se cumplió compromiso del consorcio para esta semana, promedio propuesto 138 obreros, el promedio en obra fue de 58.** Continúan actividades de reparación de estructuras, instalación formaleta muros y losa entrepiso manzanas AH, T, U, I, V.

En obra 4 formaletas. SENA VERIFICARÁ REALIZAR CAPACITACIÓN PARA MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS Y PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. Consorcio presentó solicitud de trámites ambientales ante la Corporación (En estudio por Corporación).




Se espera que las gestiones del consorcio ante Corpoamazonía confirmen lo prescrito en la licencia de urbanismo en el sentido de poder construir las 909 viviendas en el predio. El consorcio radicó 7 de marzo de 2022 ante la corporación la solicitud ambiental (Ocupación de Cauce), Consorcio realizó **reunión con la CORPORACIÓN el 29 de junio de 2022, a la espera de resultados. Fue solicitado a Consorcio iniciar trámite PRÓRROGA LICENCIA DE URBANISMO. Vence 24 de julio de 2022.**



Continúa en proceso de **cobro 96** cimentaciones **\$1,280 millones** aprox. Interventoría aprobará una vez se realicen las acciones técnicas solicitadas y presenten los respectivos informes mensuales.

Avance movimiento de tierras

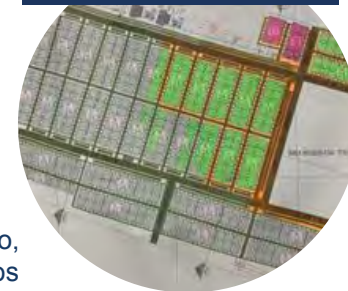



COMPROMISOS REUNIONES 12, 25 y 28 DE ENERO, 01 DE JUNIO
Y 06 DE JULIO DEL 2022

VICEPRESIDENCIA-MINVIVIENDA-UNGRD.

1

Inventario de materiales para adelantarnos a los posibles problemas, insumos y otros.

Entregado actualizado el 6 de julio de 2022, Interventoría esta revisando.

2

Mano de obra en todos los frentes a más tardar en una semana.

58 trabajadores promedio esta semana, se espera mayor **rendimiento para cumplimiento de metas. A finales de julio, requerido de manera urgente** ingreso de mayor cantidad de personal. Continúa construcción línea de alcantarillado para conexión del Megacollegio y reparación de estructuras de viviendas muros primer piso así como armado de formaleta para fundición de muros y placas entrepiso manzanas T-U-V-I-AH-AG

3

Reunión con Corpoamazonía 26 de enero Consorcio, Interventoría, MINVIVIENDA, Gobernación, UNGRD

Temas ambientales:
Ocupación de cauce costado occidental del predio. Consorcio radicó solicitud de trámite ante la corporación. A la espera de pronunciamiento de CORPOAMAZONÍA. Consorcio se reunió con la CORPORACIÓN el 29 de junio, **a la espera de resultados.**

4

A 30 de enero 4 formaletas en obra y 200 obreros activos.


En obra 4 formaletas. Se necesita mayor número de personal en obra, se requiere de manera urgente la vinculación de personal para instalación de formaletas para cumplimiento de metas. Reunión con el SENA para capacitación de personal en sistemas constructivos industrializados e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

5

Reunión 1/14 de junio 2022 y 06 de julio de 2022 Ministra de Vivienda Director UNGRD

Plan de trabajo para construcción **viviendas (15 de junio / 31 de julio 2022) presentado** el 23 de junio en audiencia como recurso de reposición ante la declaratoria en primera instancia incumplimiento total contratos de obra. (documentos administrativos-técnicos-financieros). 6 de julio se decretadas pruebas, 12 de julio continuación audiencia posible incumplimiento total

VIVIENDA URBANA SAUCES II

 CONSORCIO MCOCA 2019		PROYECTO SAUCES II CONTROL DIARIO PERSONAL		F-SST-67							
				Versión I 11/03/2019							
SEMANA DEL 04/07/2022 AL 10/07/2022 JULIO DE 2022		TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA									
PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	JUNIO							PROMEDIO SEMANAL		
		L	M	M	J	V	S	D			
		4	5	6	7	8	9	10			
CONSORCIO MCOCA 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	8	8	8	8	8	8	8	8		
CONSORCIO MCOCA 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	3	3	3	3	3	3	3	3		
INTERVENTORIA HMY	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	1	7	7	7	7	7	7	4		
VIGILANCIA CM 2019	CELADURIA OBRA	2	2	2	2	2	2	2	2		
TOTAL		14	20	20	20	20	20	20	20		
TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA											
CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO	
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MCOCA 2019	138	0	1	1	2	2	2		1	
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	ESTRUCTURA		1	9	10	11	11	16		10	
RDL LOGISTICA Y SOLUCIONES	ESTRUCTURA		15	22	20	25	27	25		22	
K&A	ESTRUCTURA Y CIMENTACION		0	6	6	6	6	6		5	
MET SAS	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA		0	2	3	5	5	5		3	
EDUARDO MORA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		0	4	4	4	4	4		3	
BCH INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		1	3	3	3	3	3		3	
RAPICONCRETOS	PLANTA DE CONCRETO		2	3	3	3	3	3		3	
SEBCO SAS	BOMBA MOVIL DE CONCRETO		0	0	2	0	2	2		1	
TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS			19	50	52	59	63	66		58	
JUAN PABLO GUERRERO	CONDUCTORES DE VOLQUETA		0	0	0	0	0	0		0	
JUAN PABLO GUERRERO	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR		0	0	0	0	0	0		0	
JUAN PABLO GUERRERO	OPERADOR RETROEXCAVADORA		0	0	1	0	0	0		0	
EDUARDO MORA	OPERADORES		0	0	0	0	0	0		0	
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA		0	0	0	0	0	0		0	
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR		0	0	0	0	0	0		0	
LEONEL OJEDA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR		0	0	0	0	0	0		0	
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA		0	0	0	0	0	0		0	
LEONEL OJEDA	OPERADOR PAJARITA		0	0	0	0	0	0		0	
LEONEL OJEDA	OPERADOR EXCAVADORA		0	0	0	0	0	0		0	
WILSON PUENTES	OPERADOR EXCAVADORA		0	1	1	1	0	0		1	
WILSON PUENTES	OPERADOR MINICARGADOR, VIBROCOMPACTA		0	2	2	1	2	2		2	
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA		0	3	2	2	0	0		1	
TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA			0	6	6	4	2	2		3	
TOTAL PERSONAL EN EL DIA			19	56	58	63	65	68		62	
PERSONAL VERIFICADO POR INTERVENTORIA, DEDICADO A ACTIVIDADES DE OBRA, SEGÚN PROGRAMACIÓN PRESENTADA POR FRENTE DE ACTIVIDADES		138	11	40	42	56	57	57		44	



PERSONAL EN OBRA Total Obra: 81	Local: 36 44%	Calificados: 18 50%
		No Calificados: 18 50%
	Foráneo: 45 56%	Calificados: 27 60%
		No Calificados: 18 40%

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA**

Valor total del proyecto

\$ 2.626.701.730,00

EJECUTOR

UNGRD – FNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 26-ENE-2022
Fecha acta de inicio: 26-ENE-2022
Fecha de terminación: 25 – SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Construcción Vivienda rural


IMPACTO

Construcción de **36 viviendas** en sitio propio

Estado Actual:

El contratista continúa con las actividades programadas teniendo en cuenta el plan de contingencia realizado, en el marco del cual se establecieron 4 frentes de trabajo mas, completando 12 frentes de obra. Actualmente se instalan cubiertas, redes eléctricas y sanitarias, pañete en muros internos y externos e instalación de puertas y ventanas.

General Proyecto

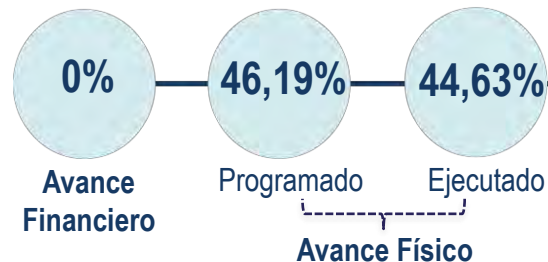

144 
Población beneficiada

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total proyectado: 21

Local: 13
62%

Foráneo: 8
38%

Calificados: 2
15%

No Calificados: 11
85%

Calificados: 8
100%

No Calificados: 0
0%



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1737-2021
Valor: \$ 2.367.193.692,48

Nombre del Contratista:
OSCAR CAPELLINI

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-1843-2021
Valor: \$ 240.667.980,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO APOYOS 2022

Supervisor UNGRD

Carlos Mario Arteaga –Reconstrucción Mocoa



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$19.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 19.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: CUARENTA Y SEIS (46) MESES
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018
Fecha de finalización: 02 - AGO - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado actual:

El proyecto se encuentra suspendido por un mes contado a partir del 21 de junio al 21 de julio del presente año. Teniendo en cuenta la solicitud de prórroga realizada por el contratista por un periodo de 3 meses más.

67,42%

Avance
Financiero

87,08%

Programado

80,58%

Ejecutado

Avance Físico



Fotos: Avance Fase 2

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-225-2018 Valor: \$ 17.176.740.466</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-228-2018 Valor: \$1.275.731.970</p>
<p>Nombre del Contratista: Consortio Colegio Mocoa</p>	<p>Nombre de la Interventoría: INGEVAL S.A.S.</p>
<p>SUPERVISOR UNGRD Yineth Arinda Cumplido Botello - SRR</p>	

*\$741.527.564: Se tienen como excedente para compra de computadores - MINTIC



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

PROYECTO CENTRO PENITENCIARIO



ENTIDADES PARTICIPANTES:
 USPEC - INPEC - ALCALDIA DE MOCOA - UNGRD

ALCANCE:
 Compra de predio de 11 hectáreas para la construcción de nuevo ERON y su escrituración y registro.

ESTADO:
 La UNGRD cumplió con su compromiso de financiación al **100%**
 En proceso de liquidación del convenio por solicitud del INPEC y USPEC

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
VALOR CONTRATO ETAPA I	\$ 24.001.631.006
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO
VALOR INTERVENTORIA ETAPAS I Y II	\$ 4.061.664.838
CONSULTOR	CDM Smith
VALOR CONSULTORIA	\$ 630.135.033
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR CONTRATO ETAPA II AGUAS MOCOCA S.A E.S.P.	\$ 2.954.350.397
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 31.647.781.274,00



ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.


ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	15- JUL-2022
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	91,43%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	90,12%
AVANCE FINANCIERO ETAPA I Y II	89,68%

ESTADO

Proyecto en ejecución, se adelanta actividades de instalación de micromedidores en las redes de distribución del proyecto. Se prorroga el contrato por 45 días (hasta el 15 de julio de 2022) y se reprograman actividades de obra.

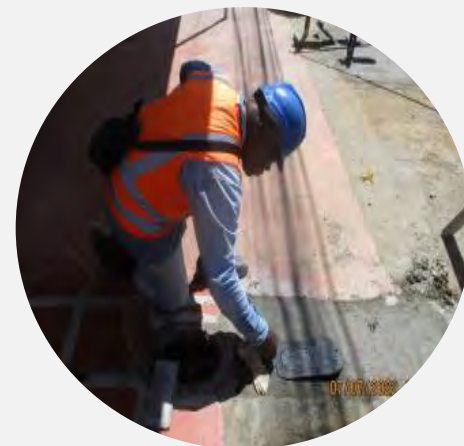

El futuro es de todos

Presidencia de la República

4.

PROYECTOS EN CONTRATACIÓN



Impacto

32 Intervenciones – obras de estabilización y recuperación



Actores e inversión

\$206.257 Millones

FNGRD - UNGRD

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

2023

Mes:

FEB

MAR

ABR

MAY - JUN

JUN - DIC

ENE - NOV

1

Estructuración de los procesos (Precontractual).

1

mes

2

Proceso de contratación.

4

meses

3

Ejecución de obras.

18

meses



AVANCES

- Estudios y diseños de obras de mitigación para los sectores medio y alto de las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y parte alta de la quebrada Taruca.
- Se asignaron los recursos para la ejecución de las obras de mitigación.
- Para invitar a cotizar: 1 de interventoría.
- En verificación preliminar: 3 procesos de obra y 2 procesos de interventoría.
- En invitación a contratar: 1 proceso de interventoría.
- En espera de RUT y certificación bancaria por parte del contratista: 3 procesos de interventoría.
- En instrucción de elaboración de contrato: 1 proceso de obra y 1 proceso de interventoría.
- En elaboración de la minuta del contrato por parte de Fidupervisora: 3 procesos de interventoría.
- En expedición de pólizas por parte del contratista: 7 procesos de obra y 1 proceso de interventoría.
- En perfeccionamiento y legalización de la minuta del contrato: 1 proceso de obra.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



AVANCES

Impacto

87 Familias



Actores e inversión

\$ 9.309 Millones

- \$ 5.763 millones: Fonvivienda
- \$ 3.545 millones: FNGRD - UNGRD

- Equipo de trabajo de la UNGRD realizó desplazamiento al municipio de Mocoa para realizar visita al predio. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la UNGRD y la alcaldía con el fin de verificar los requisitos de postulación del predio.
- El municipio de Mocoa se comprometió a allegar a la UNGRD al 30 de junio, la documentación para postular un nuevo predio para el desarrollo del proyecto, compromiso que se encuentra pendiente a la fecha.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración	2022										2023	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT-DIC	ENE-SEP	
1 Incorporación recursos al convenio	2 semanas												
2 Postulación y adquisición predio	7 meses												
3 Proceso precontractual contratación obra	3 semanas												
4 Proceso precontractual contratación interventoría	2 semanas												
5 Ejecución fase I contratos de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	3 meses												
6 Ejecución fase II contratos de obra - construcción proyecto 87 viviendas y obras de urbanismo	9 meses												

NOTA: Los tiempos anteriores dependerán de la postulación del predio por parte de la Alcaldía de Mocoa.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Impacto **216 Familias**



Actores e inversión

\$ 32.107 Millones


- \$ 22.590 millones: FNGRD - UNGRD
- \$ 9.517 millones: BAC

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE 216 VIVIENDAS Y OBRAS DE URBANISMO	\$ 15.881.977.890	OBRA
RED ELÉCTRICA	\$ 248.646.353	OBRA
TOTAL	\$ 21.463.710.307	INTERVENTORÍA

CRONOGRAMA

AVANCES

- El día 22 de abril de 2022 se cargó en la plataforma SECOPII el proceso de selección Licitación Pública FNGRD-LP-001-2022 (CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS RURALES NUCLEADAS MUNICIPIO DE MOCOA).
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2914035&isFromPublicArea=True&isModal=False>
- El día 26 de mayo de 2022 se cerró el plazo para la presentación de ofertas, para lo cual se recibió una propuesta del CONSORCIO URBANISMO RURAL MOCOA.
- El día jueves 9 de junio de 2022, se expidió Resolución “POR MEDIO DE LA CUAL EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FNGRD-LP-001-2022”. Teniendo en cuenta que el proponente no presentó documentos de subsanación.
- Se presenta nuevo cronograma del proceso:

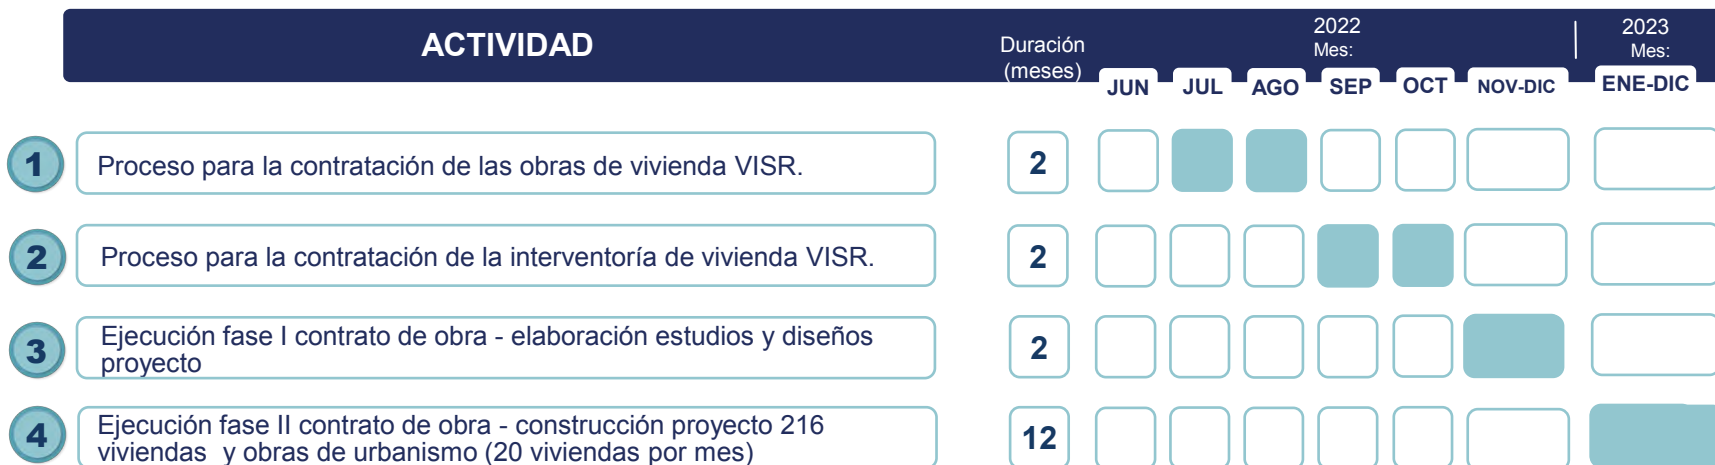

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO

Impacto

435 Comerciantes beneficiados de forma directa

Actores e inversión

\$23.374 Millones



Compra Predio: \$ 400.000.000,00 (ejecutado)
Estudios, diseños y obras compl.: \$1.687.684.080 (ejecutado)
Valor Interventoría: \$311.009.478 (ejecutado)

Valor inicial: \$ 18.976.637.030,00 (Por ejecutar)
Valor Adición: \$ 1.998.695.214,29 (Por ejecutar)
FNGRD



AVANCES

- \$ 2.398.693.558 (valor ejecutado).
- \$ 20.975.332.244,29 (valor por ejecutar).
- Se liquidó el convenio interadministrativo No. 9677-PPAL001-522-2022 suscrito entre el FNGRD y el Municipio de Mocoa.
- Actualmente se adelanta la estructuración del nuevo convenio.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022							2024	
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV - DIC	ENE - MAR
1 Liquidación convenio con municipio de Mocoa	1									
2 Estructurar nuevo Convenio con Municipio de Mocoa	1 mes									
3 Estructurar proceso licitatorio de obra e interventoría	15 días									
4 Publicación y adjudicación contrato de obra (Ley 80)	2									
5 Publicación y adjudicación contrato de Interventoría (Ley 80)	2									
6 Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	5 días									
7 Ejecución fase I contrato de obra - revision estudios y diseños	1									
8 Ejecución fase II contrato de obra - construcción de la galería de la plaza de mercado	18									



El futuro es de todos

Presidencia de la República

Impacto

16 barrios **2.522** usuarios

Actores e inversión

\$7.500 Millones

FNGRD - UNGRD

- Viceministerio de agua y Saneamiento Básico, Findeter y FNGRD – UNGRD.



AVANCES

- Se suscribió convenio No. 9677-PPAL001-463-2022, entre el FNGRD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El 16/02//2022 se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos No. 9677-PPAL001-609-2022, celebrado con Findeter.
- Entre el 13 y 15 de junio de 2022 se realizó visita para socializar el proyecto y hacer reconocimiento de campo con el contratista de obra (Consortio Captumayo), interventoría (Consortio Interventoría Mocoa 083), empresa de servicios públicos (Aguas de Mocoa) y la UNGRD.
- Se prevé la firma de actas de inicio para la semana del 11 al 15 de julio de 2022. A la fecha, se están evaluando los requisitos para la validación y firma del acta de inicio de obra. Los requisitos de interventoría se encuentran completos.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	TIEMPO	2022			2023		
		ENE	FEB	MAR-MAY	ENE	FEB	MAR
1 Suscripción del convenio con el Viceministerio de agua y saneamiento básico	2 semanas	█					
2 Suscripción del contrato con Findeter para la ejecución del proyecto	2 semanas		█				
3 Creación del patrimonio autónomo y trámites precontractuales	2 semanas		█				
4 Proceso de contratación obra e interventoría	13 semanas			█	█		
5 Legalización de los contratos de obra e interventoría	6 semanas				█		
6 Ejecución	7 meses y 2 semanas				█	█	█



Impacto

45.589 Personas beneficiadas



Actores e inversión

\$553 Millones

FNGRD - UNGRD



AVANCES

- Se asignaron los recursos para el fortalecimiento del SAT.
- Actualmente se realiza el estudio de mercado para actualizar precios y establecer el presupuesto oficial del proyecto.
- Se solicitó información a proveedores con el fin de determinar el presupuesto oficial dada la escasez de equipos y el incrementos de precios a nivel mundial.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración
(meses)

2022

Mes:

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO - NOV

1

Proceso contratación

5



2

Ejecución de actividades

4




El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

5.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

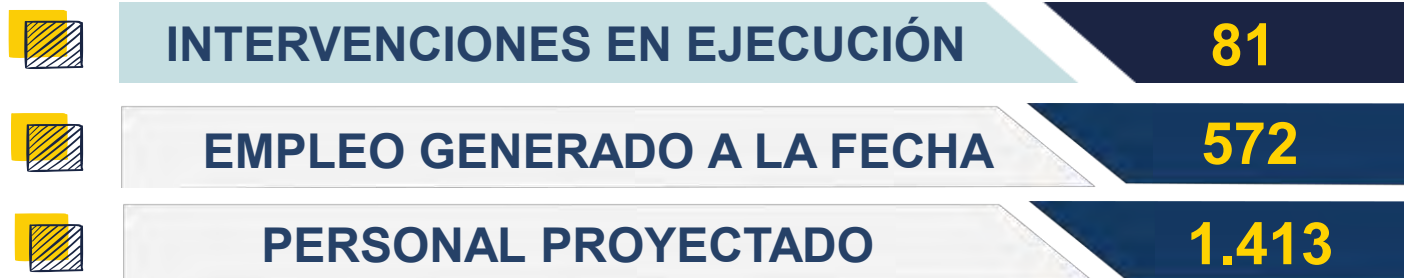

	06/07/22	13/07/22		06/07/22	13/07/22
MANO DE OBRA LOCAL	357	358	MANO DE OBRA FORÁNEA	203	214
CALIFICADOS	171	171	CALIFICADOS	160	164
NO CALIFICADOS	186	187	NO CALIFICADOS	43	50
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	64%	63%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	36%	37%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.030	1.156
EMPLEOS INDUCIDOS	229	257
TOTAL EMPLEOS	1.259	1.413

GRACIAS
