

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Octubre 13 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

18 de obra

18

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones



Total de contratos

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

13 de obra

13

100%

4 de interventoría

4

100%

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



*De las 18 obras, 10 van por encima del porcentaje ejecutado

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
Fecha de terminación: 28 - DIC - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 24
Total Projectado: 26

Local 24
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 14
58%

No Calificados 10
42%

Calificados 0
0%

No Calificados 0
0%



45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960</p>
<p>Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa</p>	<p>Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz</p>
<p>Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición de placa



Armado de acero

ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
Fecha de terminación: 14 - JUN - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 78 Total Projectado: 140	Local 55 71%	Calificados 24 44%
		No Calificados 31 56%
	Foráneo 23 29%	Calificados 17 74%
		No Calificados 6 26%



 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	




ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
 Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
 Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará 4 intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 23 Total Projectado: 34	Local 18 78%	Calificados 15 83%
		No Calificados 3 17%
	Foráneo 5 22%	Calificados 5 100%
		No Calificados 0 0%



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Conformación del talud del muro de protección 6



Construcción de colcha gavión para muro de protección 6

ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 25

Local 15
71%

Foráneo 6
29%

Calificados 9

60%

No Calificados 6

40%

Calificados 2

33%

No Calificados 4

67%

0,0%

Avance
Financiero

24,63%

Programado

15,11%

Ejecutado

38,65%

Atraso referido

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-980-2020
Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre del Contratista:
HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD

Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato



*Excavación para cimentación azud 9,
instalación de mallas colcha gavión, e inicio
de nivelación para bolsacreto*



*Construcción de placa del muro de
protección 7*



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26

Total Projectado: 35

Local 18
69%

Foráneo 8
31%

Calificados 14

78%

No Calificados 4

22%

Calificados 8

100%

No Calificados 0

0%

0,0%

Avance
 Financiero

12,05%

Programado

3,55%

Ejecutado

Avance Físico

70,53%

Atraso referido

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1334-2020

Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre del Contratista:

CONSORCIO RIO
 MULATO.

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-141-2021

Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTERVENTORIA
 RÍO MULATO

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



El futuro
 es de todos

Presidencia
 de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
 Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local 30 79%	Calificados 14 47%
		No Calificados 16 53%
	Foráneo 8 21%	Calificados 8 100%
		No Calificados 0 0%



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ✓

ALCANCE

 - Dique Abierto 3
 - Muro 2
 - Muro 1
 - Azud 04
 - Azud 05
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 22 Total Projectado: 45	Local 18 82%	Calificados 6 33%
		No Calificados 12 67%
	Foráneo 4 18%	Calificados 4 100%
		No Calificados 0 0%



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOA
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE**

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 27

Total Projectado: 35

Local 20
74%

Foráneo 7
26%

Calificados 7

35%

No Calificados 13

65%

Calificados 5

71%

No Calificados 2

29%

0,0%

Avance
Financiero

28,54%

Programado

22,75%

Ejecutado

20,28%

Atraso referido

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1388-2020
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DIQUE 1

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 536.303.878,1967

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Fundación Módulo 5



Formaleta



ALCANCE

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%

Foráneo 10
48%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 6
60%

No Calificados 4
40%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 508.303.365,8033
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Formaleta Tabique Mdl 2 y 3



Fundición dentellón



ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
 Total Projectado: 35

Local: 10
67%

Foráneo: 5
33%

Calificados: 6
60%

No Calificados: 4
40%

Calificados : 5
100%

No Calificados 0
0%



45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1119-2020
 Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
 A&A CONSULTORIA E
 INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-154-2021
 Valor: \$ 426.384.755,43

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORES
 DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Excavaciones Azud 11



Ejercicio Simulacro en obra



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 48
 Total Projectado: 45

Local: 27
56%

Foráneo: 21
44%

Calificados: 6
22%

No Calificados 21
78%

Calificados : 8
38%

No Calificados 13
62%



45.589
 Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato)</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa</p>	



Construcción con colcho gavión Muro 6



Quinto recorrido con grupo comunitario de gestión social Avance obras



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 17
Total Projectado: 61

Local 6
35%

Foráneo 11
65%

Calificados 3
50%

No Calificados 3
50%

Calificados 9
82%

No Calificados 2
18%



45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO
MOCOA 2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021
Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 38
Total Projectado: 37

Local: 19
50%

Foráneo: 19
50%

Calificados: 11

58%

No Calificados 8

42%

Calificados : 18

95%

No Calificados 1

5%



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.478.287,36</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.807.563,26 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Adecuación final acceso 2
carreteable.



Construcción de gaviones y
formaleta para dentellón



ALCANCE

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOÁ

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 14

Total Projectado: 30

Local: 9
64%

Foráneo: 5
36%

Calificados: 9

100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 5

100%

No Calificados 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

12,7%

Programado

6,05%

Ejecutado

53,3%

Atraso referido



45.589

Personas beneficiadas

Avance Físico



Excavaciones Azud 15



Charla Ambiental

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOÁ 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021
 Fecha acta de reinicio: 18 – OCT - 2021
 Fecha de terminación actualizada: 17 - ENE – 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.


Estado Actual:

Se dará reinicio al contrato el 18/10/2021, se realiza acercamientos con areneros localizados en el área a intervenir.

45.589
 Personas beneficiadas



Pausadas Actividades Campo por predial

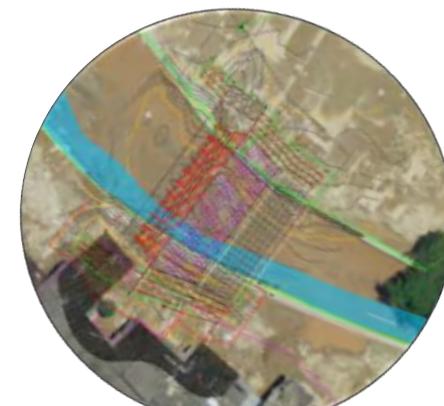

Modificación a diseños por prediales

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: Pendiente por definir
Fecha acta de inicio: Pendiente por definir



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO


Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

Estado Actual:

En corrección de contrato de fianza por parte de contratista para posterior aprobación de pólizas por parte de Fiduprevisora.

Inicio actividades preliminares del contrato, PMT PMA, PGS y protocolos de bioseguridad.

45.589
Personas beneficiadas

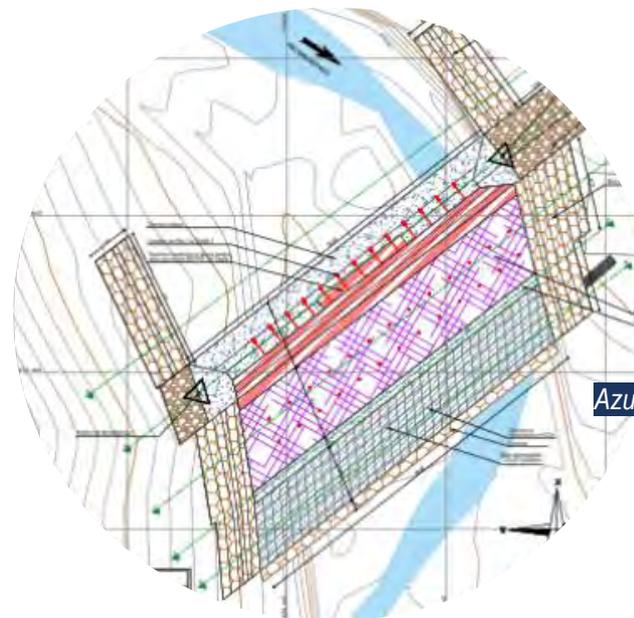

Azud 8 Río Sangoyaco.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.027</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOCA 520</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOCA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

Estado Actual:

Adecuación de acceso a Dique Azud 6,
correcciones cronograma de obra; aprobado
permiso de tala de árboles por parte de
Corpoamazonia, revisión de PMA, PGS y PMT.

 **45.589**
Personas beneficiadas



Adecuación de accesos y sitio para Azud 6



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <p>----- Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <p>----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: Pendiente por definir.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Se ajustan diseños particulares para cada obra, hasta la fecha se evaluó entregas pluviales del barrio Huasi Panga.

Gestión interinstitucional:

Se vincula a Plan maestro para determinar obras que realiza UNGRD y Plan maestro.

45.589

Personas beneficiadas



Visita técnica río Sangoyaco



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-183-2021 Valor: \$ 4.452.771.492,00</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-743-2021 Valor: \$ 363.516.745,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO				ATRASO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.844.159.281,86	21,74%	16,57%	5.442.277.193,00	65,73%	\$ 21.588.465.895,97	
3	\$ 4.706.751.939,00	0%	33,95%	1.597.942.283,29	24,25%	\$ 1.141.387.345,21	9.70%
4	\$ 6.115.409.901,98	0%	24,63%	1.506.225.458,86	15,11%	\$ 924.038.436,19	9.52%
5	\$ 7.488.477.539,43	0%	12,05%	902.361.543,50	3,55%	\$ 265.840.952,65	8.50%
6	\$ 11.015.788.965,85	0%	22,78%	2.509.396.726,42	22,65%	\$ 2.495.076.200,77	0,13%
7	\$ 12.263.393.477,06	0%	14,11%	1.730.364.819,61	13,98%	\$ 1.714.422.408,09	0,13%
8	\$ 7.204.019.704,53	0%	28,54%	2.056.027.223,67	22,75%	\$ 1.638.914.482,78	5,79%
9	\$ 6.827.896.668,28	0%	17,68%	1.207.172.130,95	25,49%	\$ 1.740.430.860,74	-7.81
10	\$ 5.707.351.594,38	0%	13,80%	787.614.520,02	14,70%	\$ 838.980.684,37	-0,90
11	\$ 16.651.641.771,25	0%	9,40%	1.565.254.326,50	11,00%	\$ 1.831.680.594,84	-1,60
12	\$ 26.536.775.722,39	0%	5,30%	1.406.449.113,29	9,70%	\$ 2.574.067.245,07	-4.40
13	\$ 2.943.285.850,62	0%	25,00%	735.821.462,66	20,97%	\$ 617.207.042,88	4.03%
14	\$ 2.096.212.362,12	0%	12,70%	266.218.969,99	6,05%	\$ 126.820.847,91	6.65%
15	\$ 6.705.288.187,44	0%	0,00%	-	0,00%	\$ 0,00	0,00%
16	\$ 8.981.109.127,00	0%	0,00%	-	0,00%	\$ 0,00	0,00%
17	\$ 8.470.387.014,00	0%	0,00%	-	0,00%	\$ 0,00	0,00%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	0,00%	-	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL	\$ 171.374.237.344,19			\$ 21.713.125.771,77 12.67%		\$ 37.497.332.997,46 21.880%	

1.2

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y
ALCANTARILLADO EN
EJECUCIÓN**

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021
Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local 5 45%	Calificados 4 80%
		No Calificados 1 20%
	Foráneo 6 55%	Calificados 6 100%
		No Calificados 0 0%



 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Mejoramiento de Suelo



Mejoramiento de terreno

 **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.
 - Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
 - Barrio Primero de Enero.
 - Barrio Venecia.
 - Barrio Obrero II Etapa.
 - Barrio San Andrés.
 - Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES
Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 18 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 25	Local 22	Calificados 12
	92%	17%
		No Calificados 10
		83%
	Foráneo 2	Calificados 0
	8%	0%
		No Calificados 2
		100%



45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Reposición de pavimento barrio El Carmen



Fundición de cámaras sanitaria barrios Prado Norte – Bajo Cañaveral

 **ALCANCE**

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021

Fecha de terminación: 18 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 25	Local 22 92%	Calificados 12 17%
		No Calificados 10 83%
	Foráneo 2 8%	Calificados 0 0%
		No Calificados 2 100%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Cajeo de vía Barrio Piñayaco



Instalación de pedraplén Barrio Peñón

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021
Fecha de terminación: 26 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 17
Total Projectado: 25

Local 15
88%

Foráneo 2
12%

Calificados 3


20%

No Calificados 12
80%

Calificados 2

100%

No Calificados 0
0%

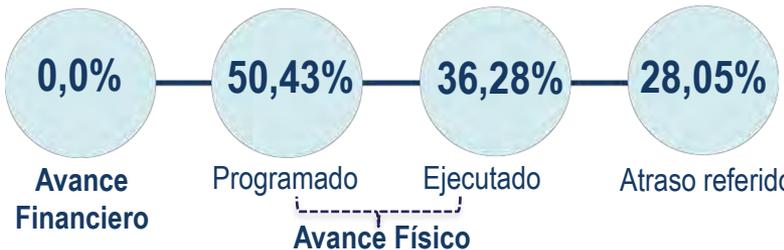

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-407-2021
Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre del Contratista:
ALEX ALBERTO CALVACHE
MENA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 72.268.367

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19



Instalación de geotextil y pedraplén



Fundición de andenes



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 12 Total Projectado: 25	Local 12 100%	Calificados 8 66%
		No Calificados 4 34%
	Foráneo 0 0%	Calificados 0 0%
		No Calificados 0 0%



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.



Instalación de formaleta para fundición de placas TRAMO IV



Instalación de subbase TRAMO IV

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 18 - NOV - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25

Total Projectado: 25

Local 24 96%	Calificados 7 29%
	No Calificados 17 71%
Foráneo 1 4%	Calificados 1 100%
	No Calificados 0 0%



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-518-2021 Valor: \$ 1.206.210.066	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 85.658.245
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL CAIMARON	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Fundición de andenes



Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

ALCANCE

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 18 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 25

Local 7
83%

Foráneo 1
17%

Calificados 3

43%

No Calificados 4

57%

Calificados 1

100%

No Calificados 0

0%



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-554-2021
Valor: \$ 2.696.280.960

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 191.474.688

Nombre del Contratista:
CONSORCIO ORC 2020

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Toma de densidades a la capa de subbase



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 09 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 14
Total Projectado: 25

Local 14
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 7
50%

No Calificados 7
50%

Calificados 0
0%

No Calificados 0
0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-636-2021
Valor: \$ 1.253.593.696

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.085.329

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Cajeo de vía



Instalación de acero para fundición de placas



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 07 – MAR -2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 37

Local: 27
90%

Foráneo: 3
10%

Calificados: 15
56%

No Calificados 12
44%

Calificados: 3
100%

No Calificados 0
0%



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Construcción de cámaras y sumideros sector Quinta Paredes.



Instalación de formaleta sector Ciudadela Deportiva.



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 05 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20
Total Projectado: 25

Local 20
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 4
20%

No Calificados 16
80%

Calificados 0
0%

No Calificados 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

32,95%

Programado

26,70%

Ejecutado

18,96%

Atraso referido

Avance Físico

45.589
Personas beneficiadas



**Fundición de huella e
instalación de aceros**



Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-549-2021
Valor: \$1.830.025.649

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS
MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 130.312.324

(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021
Fecha de terminación: 16 - MAY - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Se inician con el levantamiento de las actas de vecindad entre el equipo del contratista de obra y la interventoría. Se obtiene el certificado de la alcaldía manifestando que el trazado se encuentra dentro del lineamiento urbano de acuerdo al tipo de vía aprobado.

 **45.589**
Personas beneficiadas



Levantamiento de actas de vecindad entre contratista de obra e interventoría



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166</p> <p>-----</p> <p>Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato)</p> <p>-----</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

La UNGRD se encuentra adelantando las gestiones para la incorporación de los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario.

Interventoría y contratista se encuentran adelantando la revisión de los diseños de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de acuerdo a las recomendaciones del PMAMO.

45.589
 Personas beneficiadas



Evidencia fotográfica de las condiciones actuales del tramo a intervenir



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94</p>
<p>----- Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897</p>	<p>----- Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.435.104.449

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
 Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
 Fecha acta de inicio: Modificación de pólizas



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Gestiones pertinentes ante Alcaldía Municipal para aclaración de diseños de alcantarillado pluvial y descole. En revisión de PGS, PMA. PMT por parte de interventoría.

45.589
 Personas beneficiadas



Urbanización Quinta Paredes.-
 Sectores a pavimentar



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 2.435.104.449</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p>
<p>Nombre del Contratista: MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO				ATRASO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$ 8.840.532.147,00	0,00%	0,83%	\$ 73.376.416,82	0,62%	\$ 54.811.299,31	0.21%
2	\$ 1.348.270.441,00	0,00%	97,40%	\$ 1.313.215.409,53	81,35%	\$ 1.096.818.003,75	16.05%
3	\$ 2.485.717.595,00	0,00%	4,94%	\$ 122.794.449,19	6,05%	\$ 150.385.914,50	-1,11%
4	\$ 1.089.926.762,00	0,00%	50,43%	\$ 549.650.066,08	36,28%	\$ 395.425.429,25	14.15%
5	\$ 3.025.192.404,00	0,00%	8,81%	\$ 266.519.450,79	6,59%	\$ 199.360.179,42	2,22%
6	\$ 1.291.868.311,00	0,00%	70,27%	\$ 907.795.862,14	80,32%	\$ 1.037.628.627,40	-10,05%
7	\$ 2.887.755.648,00	0,00%	8,21%	\$ 237.084.738,70	7,50%	\$ 216.581.673,60	0.71%
8	\$ 1.342.679.025,00	0,00%	21,38%	\$ 287.064.775,55	33,44%	\$ 448.991.865,96	-12,06%
9	\$ 4.764.101.025,00	0,00%	14,81%	\$ 705.563.361,80	12,55%	\$ 597.894.678,64	2.26%
10	\$ 1.960.337.973,00	0,00%	32,95%	\$ 645.931.362,10	26,70%	\$ 523.410.238,79	6.25%
11	\$ 1.365.747.660,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
12	\$ 6.644.038.095,94	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$ 2.435.104.449,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL	\$ 39.481.271.535,94			\$ 5.108.995.892,71		\$ 4.721.307.910,62	
				12.94%		11.95%	0.98%

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

Informe corte 8 de octubre de 2021

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

NO. VIVIENDAS

CONTRATISTA

VALOR

*AVANCE

AVANCE FINANCIERO



436

CONSORCIO MOCOA 2019

\$25.732 millones



30,34%

5%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%

5%

TOTAL DE
VIVIENDAS



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

Estudios y diseños 99.80%,(243) y 98,23% (244) Movimiento de tierras 154 terrazas listas. Continúa figuración de hierro para 216 cimentaciones, cuadrilla mano de obra excavaciones operando, armado de hierro para cimentación de 6 viviendas, fundida cimentación para 4 viviendas de 24 viviendas manzana T. Llegada a obra de acero para muros.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$7.049.420.065

Avance financiero

20,05%

CRONOGRAMA

FECHA DE TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



216



693

909

PERSONAL
PROYECTADO



82

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Movimiento de tierras 31.856 m3 de tierra (incluido expansión).
- Continúa actividad de construcción de cimentación manzana T, 24 terrazas, excavación para vigas, vigas de amarre, tubería sanitaria, hidráulica, eléctrica y gas, fundición de cimentaciones
- En operación una cuadrilla para movimiento de tierras (terraceo).
- Llegada a obra de formaleta completa para dos viviendas.
- Vinculación de mayor número de personal para cuadrilla de mano de obra actual, y contratar dos frentes adicionales de mano de obra para fortalecer rendimientos, compromiso para el 11 de octubre.
- Provisionales de energía y agua, llegada insumos y materiales de construcción. Ubicación en obra de 3 contenedores, 1 para oficina, 2 para campamento de materiales.
- Se solicitó a Consorcio diligenciar matriz de AGENDA CONJUNTA DE COMPROMISOS, aun no la envían.
- Celebrada audiencia de incumplimiento estudios y diseños, contrato 243 \$10 millones, 244 \$98 millones, en primera instancia. Para el 12 de octubre audiencia de descargos.
- Solicitud a Fiduprevisora otrosí contrato 243 para aplazar la entrega de las primeras 72 viviendas construidas para el 11 de noviembre.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	6	2	8
No calificado	40	0	40
Total	46	2	48



VIVIENDA URBANA SAUCES II



PLAN DE COMPRAS E INSUMOS V1.

PROGRAMACIÓN COMPRAS SAUCES II (8 MANZANAS/148 VIVIENDAS)

Etapa	Manzana	Tipo Modulo	Numero de modulos en manza	Numero de viviendas	Area construida X modulo	Total area construida Modulo	area total construida manza	CONTRATACIÓN MVTO DE TIERRAS	CONTRATACIÓN CIMENTACIÓN	CONTRATACIÓN ESTRUCTURA	CONTRATACIÓN CUBIERTA	CONTRATO MANO DE OBRA ENCHAP	CONTRATO CARPINTERIA METALICA	CONTRATO CARPINTERIA MADEP	2DO JUEGO FORMALETA	3ER JUEGO DE FORMALETA
ETAPA 1	I	Modulo X 12	2	24	800,99	1601,98	1601,98	CONTRATADO	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 20/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 26/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	28/10/2021	15/12/2021
	J	Modulo X 12	2	24	800,99	1601,98	1601,98	CONTRATADO	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 20/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 26/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	28/10/2021	15/12/2021
ETAPA 2	T	Modulo X 12	2	24	800,99	1601,98	1601,98	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 28/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	28/10/2021	15/12/2021
	U	Modulo X 12	2	24	800,99	1601,98	1601,98	CONTRATADO	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 20/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 26/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	28/10/2021	15/12/2021
ETAPA 1	AE	Modulo X 12	1	12	800,99	800,99	1870,67	CONTRATADO	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 20/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 26/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	28/10/2021	15/12/2021
	AF	Modulo X 12	1	12	800,99	800,99	1870,67	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 20/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 26/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	28/10/2021	15/12/2021
ETAPA 2	AG	Modulo X 8	2	16	534,84	1069,68	1069,68	CONTRATADO	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 20/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 26/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	28/10/2021	15/12/2021
	AH	Modulo X 12	1	12	800,99	800,99	800,99	CONTRATADO	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 15/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 20/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 26/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	CIERRE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN CONTRATO 22/10/2021	28/10/2021	15/12/2021

*Consortio entrega versión definitiva 13/10/2021 para 216 viviendas dic 2021 y cronograma de ejecución.



VARIABLES DE CALIFICACIÓN PRIORIZACIÓN FAMILIAS BENEFICIARIAS SFV

CRITERIO	PUNTAJE
<ul style="list-style-type: none"> Núcleos familiares conformados por padres y/o madres cabeza de hogar que tengan a su cargo niñas y/o niños. Núcleos familiares con niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad. 	20
<ul style="list-style-type: none"> Núcleos familiares con personas en situación de discapacidad. 	20
<ul style="list-style-type: none"> Núcleos familiares conformados por adultos mayores. 	20
<ul style="list-style-type: none"> Comunidades indígenas y afro descendientes. 	10
<ul style="list-style-type: none"> Núcleos familiares víctimas de conflicto armado con doble condición. 	10
<ul style="list-style-type: none"> Núcleos familiares en condición de pobreza extrema ubicados en Sisbén en el grupo A1 –A5 y núcleos familiares ubicados en el grupo B1 – B7 considerados en condición de pobreza moderada. 	10
<ul style="list-style-type: none"> Núcleos familiares con presencia de menores de edad. 	10

*Actividad a cargo del Municipio de Mocoa, Secretaria de infraestructura y Gestión del Riesgo Municipal



ACTIVIDADES GENERALES ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS



1

Elaboración y Registro de **Reglamento de Propiedad Horizontal**, obligación contractual del Contratista de obra, previo poder dado por la UNGRD como dueño del predio.



2

Certificado de **Matrícula Inmobiliaria del Reglamento de Propiedad Horizontal**, en donde se definen las matrículas inmobiliarias de las 909 viviendas.



3

Transferencia del dominio de cada una de las viviendas, de la UNGRD/FIDUPREVISORA como propietaria del predio a cada uno de los beneficiarios, de acuerdo a los certificados de matrículas de cada una de las viviendas, lo cual se hace mediante documento jurídico, Resolución Administrativa.



N° DE
VIVIENDAS



87

Aportes de
FONVIVIENDA



5.764 millones

Valor otorgado por FONVIVIENDA
a través del Convenio
No. 9677-PPAL001-783-2018



AVANCES

- Se cuenta con la estructuración técnica, jurídica y financiera de las versiones del Anexo Técnico y de la justificación para las invitaciones a cotizar. Pendiente la aprobación de la implantación de las 909 unidades de vivienda.

VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



AVANCES

- **Mocoa Disperso:** El día 28 de Septiembre de 2021, a las 11:40 am; se culmina la audiencia de adjudicación del proceso No. **FNGRD-LP-002-2021**, cuyo título es: “**REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO**”, <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>, adjudicando el proceso al CONSORCIO OTES MOCOA 1.

Se está a la espera que el consorcio realice las gestiones pertinentes ante la DIAN para remitir la instrucción de contratación a la Fiduprevisora.

UNGRD

Precio estimado total: 2.406.425.590,81 COP

Número del proceso FNGRD-LP-002-2021

Título: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Fase: Presentación de observaciones

Estado: Publicado

Descripción: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y SU ANEXO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO 9677 – PPAL001 – 668 – 2017, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A., Y EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública)

PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS	90 (DÍAS)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	13/08/2021
Publicación del aviso de convocatoria pública	13/08/2021
Publicación de estudios previos	13/08/2021
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	13/08/2021
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	25/08/2021
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	27/08/2021
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	30/08/2021
Audiencia de asignación de Riesgos	01/09/2021
Presentación de observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	02/09/2021
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	03/09/2021
Plazo máximo para expedir adendas	06/09/2021
Presentación de Ofertas	10/09/2021
Apertura del sobre 1	10/09/2021
Informe de presentación de Ofertas	10/09/2021
Publicación del informe de verificación o evaluación	13/09/2021
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	20/09/2021
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	28/09/2021
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	28/09/2021
Firma del Contrato	Una vez adelantados tramites con DIAN
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	Una vez adelantados tramites con DIAN

AVANCES

VIVIENDA RURAL NUCLEADA

N° DE VIVIENDAS



216

INVERSIÓN



Urbanismo **10.110 mill**
 Vivienda **15.870 mill**
 PTAR: **1.500 mill**
 Subestación eléctrica: **3.500 mill**
 Total: **\$ 30.980 millones**

\$ 9.516.549.300 En convenio con **Banco Agrario**

\$21.463.764.291 Recursos faltantes

- **Mocóa Nucleada:** A la fecha se cuenta con el aval técnico del **BAC** para iniciar la ejecución del proyecto de vivienda, quedando pendiente la aprobación del prototipo de acuerdo a los ajustes que realiza la consultoría a cargo de SPIA.

Adicionalmente, se cuenta con la estructuración técnica del proyecto para la apertura del proceso de licitación, donde está pendiente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De los 216 hogares a los cuales les fueron asignados los subsidios para vivienda rural nucleada, A la fecha por parte del **BAC** se encuentran revisados y aprobados 211 hogares (97.7%) incluidas las 40 sustituciones solicitadas por la alcaldía y tramitadas por la UNGRD.

Con relación al compromiso del **Director de la UNGRD** se realiza consulta al **BAC** para definir la situación de los 5 hogares de la comunidad **MUSURRUNAKUNA** que solicitan la construcción de las viviendas en el predio entregado a esta comunidad en la Vrda. El Pepino.

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018

Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018

Fecha de finalización: 01 - NOV – 2021 (Según trámite de prórroga).



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 56

Local 37
66%

Foráneo 19
34%

Calificados 22
59%

No Calificados 15
41%

Calificados 16
84%

No Calificados 3
16%

54%

Avance
Financiero

95,50%

Programado

94,50%

Ejecutado

Avance Físico



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consorcio Colegio Moco

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

Supervisor UNGRD
Yineth Arinda Cumplido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo



BLOQUE PRIMARIA:

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Cubierta metálica (50%)
- Enchape de pisos (100%)
- Instalaciones sanitarias (100%)
- Instalaciones hidráulicas (100%)
- Instalaciones eléctricas (100%)
- Instalación RCI (100%)
- Carpintería metálica (100%)
- Estampado de pisos (100%)
- Instalación de ventanería (100%)



BLOQUE PREESCOLAR

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Cubierta metálica (50%)
- Enchape de pisos (100%)
- Instalaciones sanitarias (100%)
- Instalaciones hidráulicas (100%)
- Instalaciones eléctricas (5%)
- Instalación RCI (100%)
- Carpintería metálica (15%)
- Construcción muro de contención (100%)



BLOQUE DE PORTERÍA

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (80%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Construcción muro contención (100%)



BLOQUE DE BIBLIOTECA

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Instalaciones eléctricas (5%)
- Instalación RCI (100%)



TANQUE DE ALMACENAMIENTO

- Estructura concreto (100%)
- Relleno perimetral (100%)



RAMPA

- Baranda metálica (100%)
- Fundición placa (100%)



BLOQUE BACHILLERATO

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Cubierta metálica (50%)
- Enchape de pisos (100%)
- Instalaciones sanitarias (100%)
- Instalaciones hidráulicas (100%)
- Instalaciones eléctricas (30%)
- Instalación RCI (100%)
- Carpintería metálica (100%)
- Estampado de pisos (100%)
- Instalación de ventanería (50%)
- Construcción muro de contención (100%)



BLOQUE DE LABORATORIOS

- Cimentación (100%)
- Estructuras concreto (100%)
- Mampostería (100%)
- Estructura metálica cubierta (100%)
- Cubierta metálica (50%)
- Enchape de pisos (70%)
- Instalaciones sanitarias (100%)
- Instalaciones hidráulicas (100%)
- Instalaciones eléctricas (5%)
- Instalación RCI (100%)



OBRAS EXTERIORES

- Instalación de tubería para red contra incendios. **Por culminar**
- Instalación de tubería principal de red hidrosanitaria. **Por culminar**
- Instalación de tubería principal de presión. **Por culminar**
- Instalación de tubería principal de red eléctrica. **Por culminar**
- Construcción de cajas sanitarias. **Por culminar.**



PROYECTO PLAZA DE MERCADO



PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56




INVERSIÓN

\$18.976.637.030



AVANCES

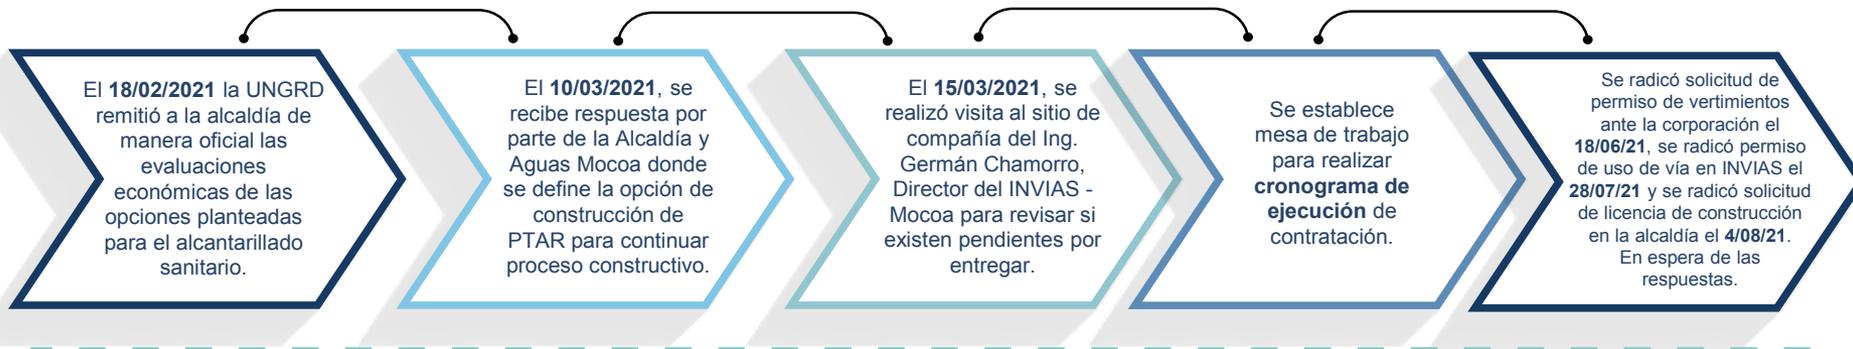

CRONOGRAMA



El futuro
 es de todos

Presidencia
 de la República

PROYECTO CENTRO PENITENCIARIO



Predio identificado y presentado por la Alcaldía: **100%**

Avaluó del Predio: **100%**

Área del predio: **11 hectáreas**

Convenio formalizado: **100%**
 (9677-PPAL001-1292-2021)

Valor convenio: **\$1.310.921.000**

FIC: **001001031616** del 24/09/2021



ENTIDADES PARTICIPANTES:
 USPEC - INPEC - ALCALDIA DE
 MOCOA - UNGRD



ALCANCE:
 Compra de predio de 11 hectáreas
 para la construcción de nuevo
 ERON y su escrituración y registro.



ESTADO:
 En proceso de adquisición por parte de la
 Alcaldía de Mocoa.
 El Municipio está estructurando el proyecto de
 acuerdo en el que se solicita al concejo Municipal
 autorización para la compra del predio.

RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ETAPA

2

ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	65%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	16%
ESTADO	Proyecto en ejecución. Se adelantan actividades socialización de instalación de micromedidores, así como la ejecución del cambio de tubería de asbesto cemento a PVC y empalmes en redes de distribución del proyecto.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



TEJIDO SOCIAL


CASO NIÑOS DESAPARECIDOS



4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

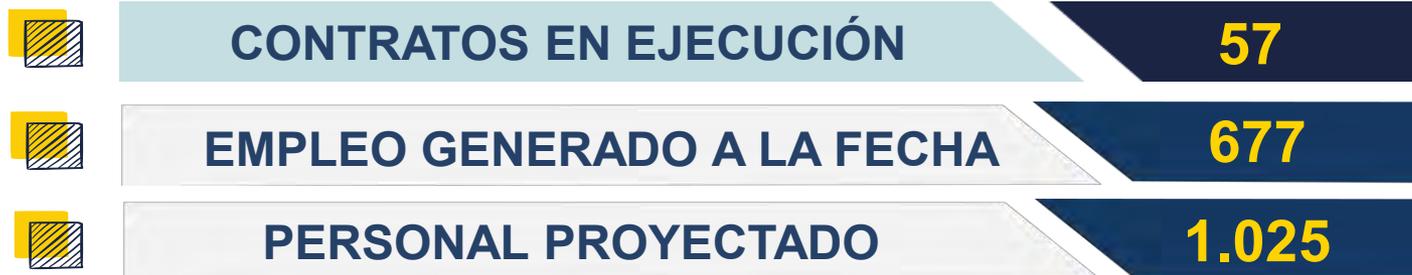

	30/09/21	13/10/21		30/09/21	13/10/21
MANO DE OBRA LOCAL	505	509	MANO DE OBRA FORÁNEA	171	168
CALIFICADOS	249	235	CALIFICADOS	133	131
NO CALIFICADOS	256	274	NO CALIFICADOS	38	37
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	75%	75%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	25%	25%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.219	1.845
EMPLEOS INDUCIDOS	271	410
TOTAL EMPLEOS	1.490	2.255

GRACIAS
