

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Diciembre 15 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos

18 de obra

Ejecución

18

% en Perfeccionamiento ejecución

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones



Total de contratos

13 de obra

Ejecución

13

% en Perfeccionamiento ejecución

100%

4 de interventoría

4

100%

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO			ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	
2	\$ 32,844,159,281.86	21.74%	34.00%	11,167,014,155.83	81.77%	\$ 26,856,669,044.78 + 47.77%
3	\$ 4,706,751,939.00	0%	64.27%	3,025,029,471.20	29.17%	\$ 1,372,959,540.61 - 35.10%
4	\$ 6,115,409,901.98	0%	54.99%	3,362,863,905.10	23.81%	\$ 1,456,079,097.66 - 31.18%
5	\$ 7,488,477,539.43	0%	34.58%	2,589,515,533.13	18.05%	\$ 1,351,670,195.87 - 16.53%
6	\$ 11,015,788,965.85	0%	42.50%	4,681,710,310.49	30.02%	\$ 3,306,939,847.55 - 12.48%
7	\$ 12,263,393,477.06	0%	32.90%	4,034,656,453.95	22.02%	\$ 2,700,399,243.65 - 10.88%
8	\$ 7,204,019,704.53	28.06%	38.25%	2,755,537,536.98	36.72%	\$ 2,645,316,035.50 - 1.53%
9	\$ 6,827,896,668.28	36.37%	22.23%	1,517,841,429.36	37.52%	\$ 2,561,826,829.94 + 15.29%
10	\$ 5,707,351,594.38	0%	27.30%	1,558,106,985.27	30.90%	\$ 1,763,571,642.66 + 3.60%
11	\$ 16,651,641,771.25	0%	18.30%	3,047,250,444.14	25.80%	\$ 4,296,123,576.98 + 7.50%
12	\$ 26,536,775,722.39	0%	34.24%	9,086,192,007.35	23.87%	\$ 6,334,328,364.93 - 10.37%
13	\$ 2,943,285,850.62	0%	39.52%	1,163,186,568.17	36.76%	\$ 1,081,951,878.69 - 2.76%
14	\$ 2,096,212,362.12	0%	16.00%	335,393,977.94	7.14%	\$ 149,669,562.66 - 8.86%
15	\$ 6,705,288,187.44	0%	0.00%	-	0.00%	\$ 0.00 0.00%
16	\$ 8,981,109,127.00	0%	0.00%	-	0.00%	\$ 0.00 0.00%
17	\$ 8,470,387,014.00	0%	11.65%	986,800,087.13	2.94%	\$ 249,029,378.21 - 8.71%
18	\$ 4,816,288,237.00	0%	0.00%	-	0.00%	\$ 0.00 0.00%
TOTAL	\$ 171,374,237,344.19			\$ 49,311,098,866.03 28.77%		\$ 56,126,534,239.69 32.75%

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
Fecha de terminación: 28 - DIC - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 24
Total Projectado: 26

Local: 24
100%


Foráneo: 0
0%

Calificados: 14
58%

No Calificados: 10
42%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 063 del 2019
Valor: \$ 3.841.235.901

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-261-2019
Valor: \$ 360.589.960

Nombre del Contratista:
Virgilio Bravo Sosa

Nombre de la Interventoría:
Yahara Maritza Viveros Ortiz

Supervisor UNGRD

Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Fundición pantalla



Acero para pantalla

ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
Fecha de terminación: 14 - JUN - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 28
Total Projectado: 140

Local: 19
68%


Foráneo: 9
32%

Calificados: 10
53%

No Calificados: 9
47%

Calificados: 8
89%

No Calificados: 1
11%

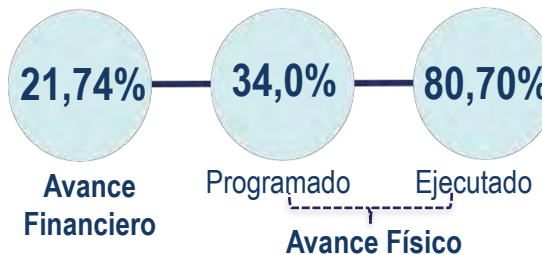

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-977-2020
Valor: \$ 30.418.456.852,86

Nombre del Contratista:
INGECON SA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-1365-2020
Valor: \$ 2.425.702.429,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER JARILLON 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
 Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
 Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará 4 intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA Total Obra:26 Total Projectado:30	Local: 19	Calificados: 16
	73%	84%
		No Calificados: 3
		16%
	Foráneo: 7	Calificados: 5
	27%	71%
		No Calificados: 2
		29%

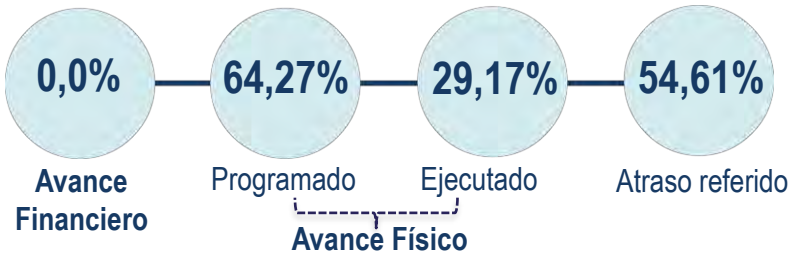

45.589
 Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

**PERSONAL EN
OBRA**

Total Obra: 21
Total Projectado: 25

Local: 15
71%


Foráneo: 6
29%

Calificados: 9
60%

No Calificados: 6
40%

Calificados: 2
33%

No Calificados: 4
67%

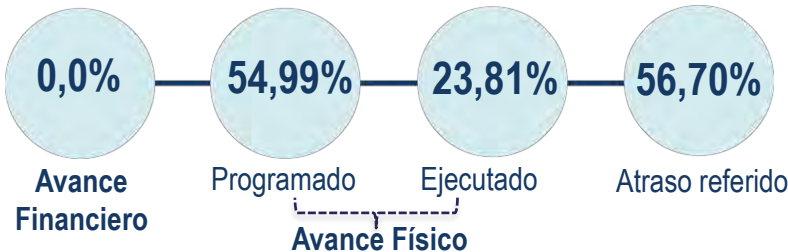

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-980-2020
Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre del Contratista:
HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD
Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 35

Local: 22
73%

Foráneo: 8
27%

Calificados: 14
64%

No Calificados: 8
36%

Calificados: 8
100%

No Calificados: 0
0%



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.924.254.899,43</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 564.222.640,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO MULATO.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de acero y vaciado de concreto dentellón del Dique 2



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

6 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO 1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
 Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 08 – JUL - 2022


TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local: 30 79%	Calificados: 14 47%
		No Calificados: 16 53%
	Foráneo: 8 21%	Calificados: 8 100%
		No Calificados: 0 0%

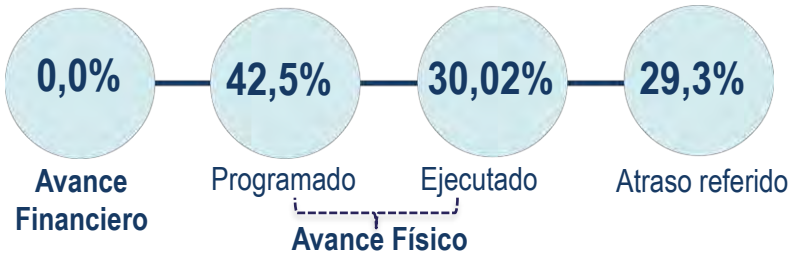


45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Se continua con la Instalación de Bolsacretos en el Azud 4

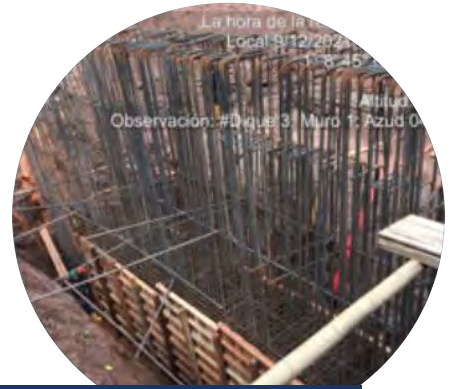

Instalación de acero y armado de formaleta para Dique 3 abierto

- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje


PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 22
Total Projectado: 45

Local: 18
82%

Foráneo: 4
18%

Calificados: 6 33%
No Calificados: 12 67%
Calificados: 4 100%
No Calificados: 0 0%

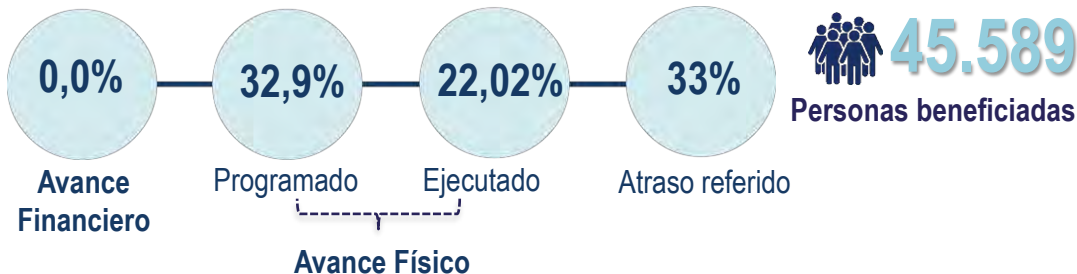

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOA</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Formaleta instalada para vaciado del cuerpo y aleta completa del primer tercio, Azud 12



Instalación de Gaviones de cimentación Muro 10

ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25

Total Proyectado: 35

Local: 18
72%


Foráneo: 7
28%

Calificados: 7
39%

No Calificados: 11
61%

Calificados: 5
71%

No Calificados: 2
29%

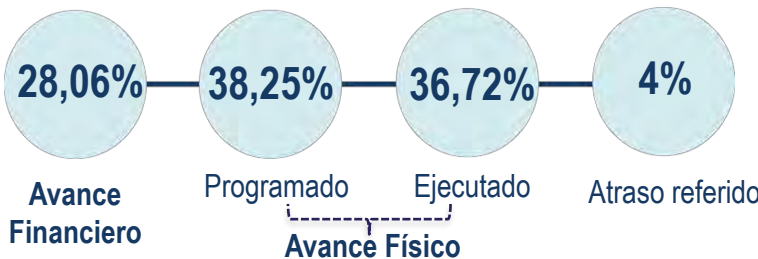

45.589
Personas beneficiadas



Solado para dentellón 6



Excavación dentellón 6

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 21 Total Projectado: 35	Local: 11 52%	Calificados: 6 55%
		No Calificados: 5 45%
	Foráneo: 10 48%	Calificados: 6 60%
		No Calificados: 4 40%

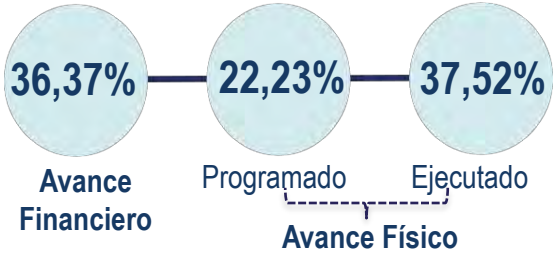

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.319.593.302,48</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO MURO RIO MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.303.365,8033 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



Desenfofrado Tabiques

ALCANCE • Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
Total Projectado: 35

Local: 14
74%


Foráneo: 5
26%

Calificados: 6
43%

No Calificados: 8
57%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

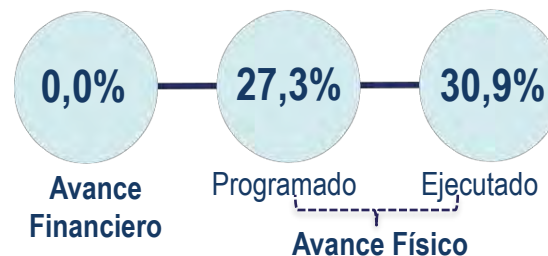

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.384.755,43

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOCHA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mococho



Fundición de cuerpo Dique 11



Charlas SST- Dique 11



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 52
Total Projectado: 45

Local: 32
62%

Foráneo: 20
38%

Calificados: 6


19%

No Calificados: 26
81%

Calificados: 8

40%

No Calificados: 12
60%

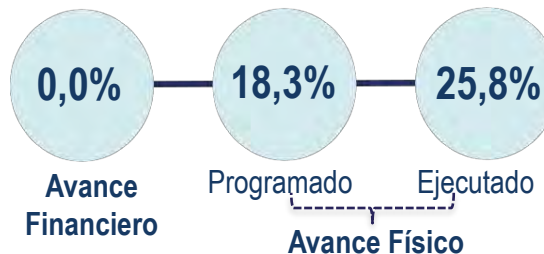

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato)</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa</p>	



Inicio Excavaciones Jarillon 02



Reunión de 3 socialización Comunidad AID



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 55
Total Projectado: 61

Local: 41
75%


Foráneo: 14
25%

Calificados: 15
37%

No Calificados: 26
63%

Calificados: 2
14%

No Calificados: 12
86%

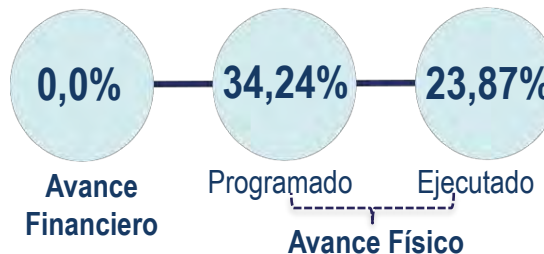

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO
MOCOA 2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021
Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 38

Total Projectado: 37

Local: 19
50%

Foráneo: 19
50%

Calificados: 11

58%

No Calificados: 8

42%

Calificados: 18

95%

No Calificados: 1

5%

0,0%

Avance
Financiero

39,52%

Programado

36,76%

Ejecutado

6,97%

Atraso referido

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-311-2021
Valor: \$ 2.723.478.287,36

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-110-2021
Valor: \$ 219.807.563,26

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Construcción de gaviones primera línea
ribera izquierda Azud (Primer tercio)



ALCANCE

- Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOÁ

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones

CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15

Total Projectado: 30

Local: 10
67%

Foráneo: 5
33%

Calificados: 10
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

16,0%

Programado

7,14%

Ejecutado

55,0%

Atraso referido

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1330-2020

Valor: \$ 1.938.876.092,45

Nombre del Contratista:

CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-133-2021

Valor: \$ 157.336.269,67

(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER – MOCOÁ 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



Perfilado Dentellón Bolsacretos
Azud 15



Dentellón en Gavión de zona
colcho gavión Azud 15



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021
 Fecha acta de reinicio: 19 – OCT - 2021
 Fecha de terminación actualizada: 14 - MAR – 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.


Estado Actual:

Se tiene ajuste de diseño presentado por Hidroconsulta, el contratista inicio actividades preliminares de limpieza, localización y replanteo. Ya se tiene aprobados PMT, PGS, PMA y protocolos de Bioseguridad.

45.589
 Personas beneficiadas



Pausadas Actividades Campo por predial

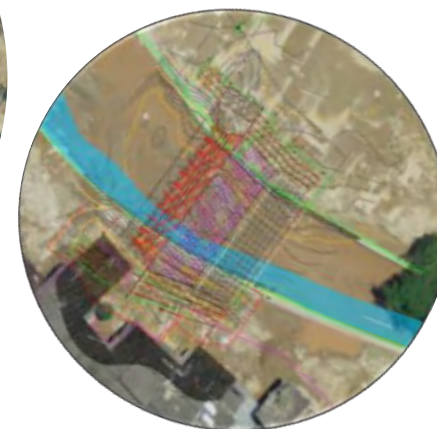

Modificación a diseños por prediales

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021
 Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021
 Fecha de terminación: 10 - MAY -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

Estado Actual:

Levantamiento de inventario forestal y solicitud de Aprovechamiento forestal ante Corpoamazonia. Se continua en la elaboración de PMA y PGS por parte del contratista de obra; PMT radicado en Alcaldía.



Levantamiento de inventario forestal

45.589
 Personas beneficiadas



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.027</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100</p>
<p>-----</p> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOA 520</p>	<p>-----</p> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 40

Local: 7
58%


Foráneo: 5
42%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Excavaciones Muro 02



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: Se está a la espera de aclaración con Corpoamazonía para dar inicio.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Obras complementarias en proceso de ajuste de diseño de conformidad con el avance de las obras de mitigación que se ejecutan en el río Sangoyaco, en proceso de modificación de representante legal del contrato de obra.

Gestión interinstitucional

*Es importante articular con Corpoamazonía y contraloría para trazar ruta de intervención.

45.589

Personas beneficiadas



Visita técnica sobre río Sangoyaco



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-183-2021 Valor: \$ 4.452.771.492,00</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-743-2021 Valor: \$ 363.516.745,00</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.2

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y
ALCANTARILLADO EN
EJECUCIÓN**

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$ 8,840,532,147.00	0.00%	29.53%	\$ 2,610,609,143.01	5.65%	\$ 499,490,066.31	- 23.88%
2	\$ 1,348,270,441.00	32.41%	98.02%	\$ 1,321,574,686.27	95.11%	\$ 1,282,340,016.44	- 2.91%
3	\$ 2,485,717,595.00	0.00%	67.25%	\$ 1,671,645,082.64	27.94%	\$ 694,509,496.04	- 39.31%
4	\$ 1,089,926,762.00	0.00%	100.00%	\$ 1,089,926,762.00	91.48%	\$ 997,065,001.88	- 8.52%
5	\$ 3,025,192,404.00	0.00%	92.15%	\$ 2,787,714,800.29	71.16%	\$ 2,152,726,914.69	- 20.99%
6	\$ 1,291,868,311.00	90.00%	100.00%	\$ 1,291,868,311.00	100.00%	\$ 1,291,868,311.00	-
7	\$ 2,887,755,648.00	0.00%	29.25%	\$ 844,668,527.04	12.26%	\$ 354,038,842.44	- 16.99%
8	\$ 1,342,679,025.00	0.00%	86.00%	\$ 1,154,703,961.50	68.87%	\$ 924,703,044.52	- 17.13%
9	\$ 4,764,101,025.00	0.00%	33.46%	\$ 1,594,068,202.97	23.59%	\$ 1,123,851,431.80	- 9.87%
10	\$ 1,960,337,973.00	0.00%	67.85%	\$ 1,330,089,314.68	54.50%	\$ 1,068,384,195.29	- 13.35%
11	\$ 1,365,747,660.00	0.00%	9.98%	\$ 136,301,616.47	9.08%	\$ 124,009,887.53	- 0.90%
12	\$ 6,644,038,095.94	0.00%	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
13	\$ 2,435,104,449.00	0.00%	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL	\$ 39.481.271.535,94			\$ 15,833,170,407.85		\$ 10,512,987,207.92	
				40,10%		26,62%	

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES
 Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
 Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021
 Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local: 5 45%	Calificados: 4 80%
		No Calificados: 1 20%
	Foráneo: 6 55%	Calificados: 6 100%
		No Calificados: 0 0%



 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Instalación de Subbase



Compactación



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada por prórroga : 18 - ENE - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 25	Local: 22 92%	Calificados: 12 55%
		No Calificados: 10 45%
	Foráneo: 2 8%	Calificados: 0 0%
		No Calificados: 2 100%

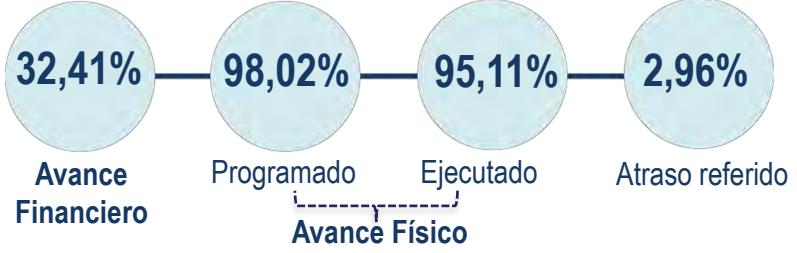

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Rellenos de excavaciones barrio El Carmen

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaverál y Prado Norte.

 **ALCANCE**

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021

Fecha de terminación: 18 – ENE – 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 8 Total Projectado: 25	Local 8 100%	Calificados 5 63%
		No Calificados 3 37%
	Foráneo 0 0%	Calificados 0 0%
		No Calificados 0 0%

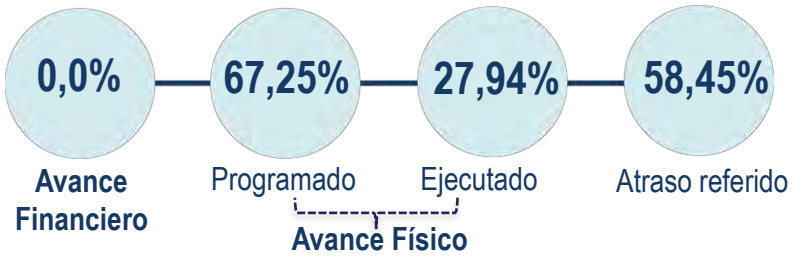

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Fundición de placas
barrio Piñayaco

 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021

Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 17

Total Projectado: 25

Local: 15

88%

Foráneo: 2

12%

Calificados: 3

20%

No Calificados: 12


80%

Calificados: 2

100%

No Calificados: 0

0%

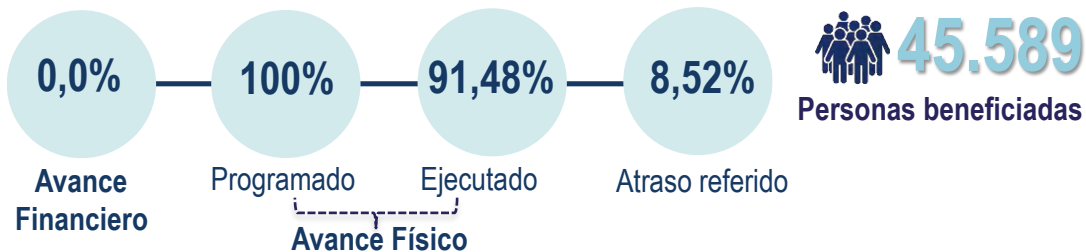

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-407-2021 Valor: \$ 1.017.658.395</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 72.268.367</p>
<p>Nombre del Contratista: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición de placas y andenes



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 12 Total Projectado: 25	Local: 12 100%	Calificados: 8 67%
		No Calificados: 4 33%
	Foráneo: 0 0%	Calificados: 0 0%
		No Calificados: 0 0%



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 18 - NOV - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25

Total Projectado: 25

Local: 24
96%

Foráneo: 1
4%

Calificados: 7
29%

No Calificados: 17
71%

Calificados: 1
100%

No Calificados: 0
0%



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-518-2021
Valor: \$ 1.206.210.066

Nombre del Contratista:
UNION TEMPORAL
CAIMARON

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 85.658.245

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Vía pavimentada



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 18 - ENE - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 8 Total Projectado: 25	Local: 7	Calificados: 3
	88%	43%
		No Calificados: 4
		57%
	Foráneo: 1	Calificados: 1
	12%	100%
		No Calificados: 0
		0%

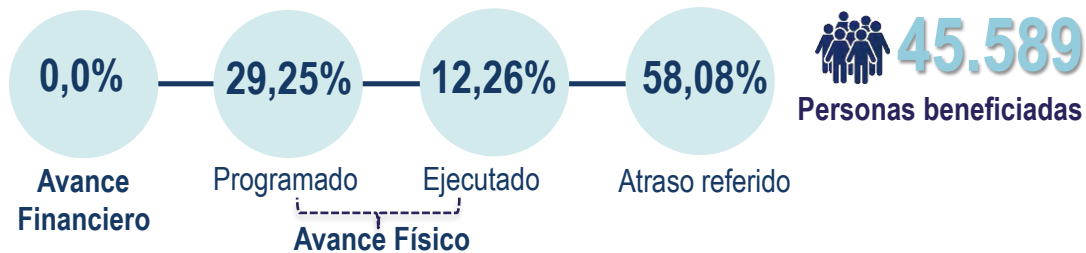

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Instalación de formaleta para fundición de placas

ALCANCE

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
 - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 09 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 18
Total Projectado: 25

Local: 18
100%


Foráneo: 0
0%

Calificados: 7
39%

No Calificados: 11
61%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%

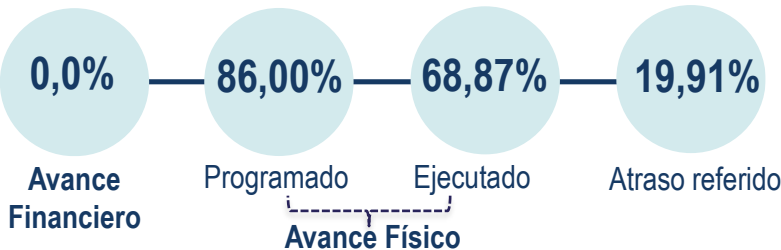

45.589
Personas beneficiadas



Fundición de placas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.329</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 07 – MAR -2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 37

Local: 27
90%

Foráneo: 3
10%

Calificados: 15

56%

No Calificados: 12

44%

Calificados: 3

100%

No Calificados: 0

0%

0,0%

Avance Financiero

33,46%

Programado

23,59%

Ejecutado

29,49%

Atraso referido

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Pavimentación longitud total placa Ciudadela Deportiva.



Instalación de pedraplen tramo 9 Sector Quinta paredes.



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
 Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021
 Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
 Fecha de terminación: 18 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20
 Total Projectado: 25

Local: 20
100%


Foráneo: 0
0%

Calificados: 4
20%

No Calificados: 16
80%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%

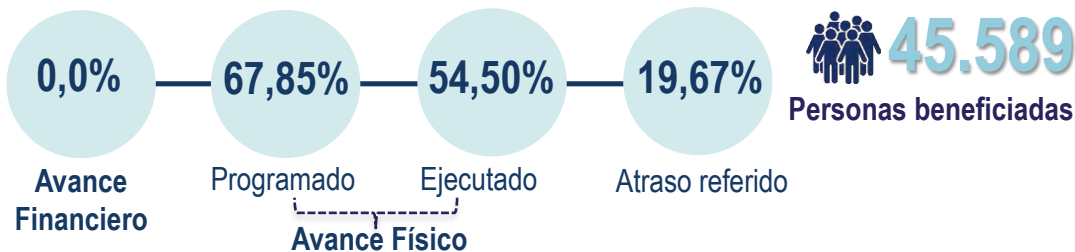

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-549-2021
 Valor: \$1.830.025.649
Nombre del Contratista:
 CONSORCIO PAVIMENTOS
 MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 130.312.324
 (Para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD
 Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza



Fundición de huella aceros



Verificación topográfica

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021
Fecha de terminación: 16 - MAY - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 24
Total Projectado: 20

Local: 17
71%


Foráneo: 7
29%

Calificados: 10
59%

No Calificados: 7
41%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%

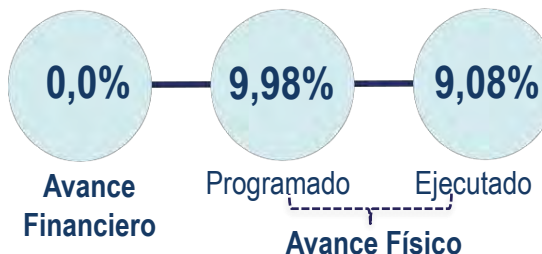

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Brenda Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Vaciado de Concreto para cámara C5 de inspección pluvial



Instalación de tubería PVC 10" de sumideros



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

La UNGRD ya dio los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario, en trámite para incorporarlos al contrato de obra y en aprobación ante OCAD municipal del ajuste del proyecto.

45.589
 Personas beneficiadas



Evidencia fotográfica de las condiciones actuales del tramo a intervenir

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-900-2021

Valor: \$ 6.240.520.933

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-969-2021

Valor: \$ 403.517.162,94

Nombre del Contratista:

CONSORCIO VIAS 897

Nombre de la Interventoría

CONSORCIO INTERVENTORIA
 PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD

Brenda Peña – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.435.104.449

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
 Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
 Fecha acta de inicio: Pendiente



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas


IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Reunión con Aguas Mocoa y PMAMO para articulación con actividades de Instalación de micro medidores y diseños de Plan maestro de alcantarillado.

45.589
 Personas beneficiadas



Listado de asistencia reunión
 Aguas Mocoa- PMAMO.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 2.435.104.449</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

NO. VIVIENDAS



436

CONTRATISTA

CONSORCIO MOCOA 2019

VALOR

\$25.732 millones

*AVANCE



32,70%

AVANCE FINANCIERO



20%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,11%



5%

TOTAL DE
VIVIENDAS



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

Estudios y diseños 100% (243 - pagado hito: \$3.900 millones) y 98,23% (244), movimiento de tierras 204 terrazas para igual número de viviendas. Continúa figuración de hierro para cimentaciones, manzanas intervenidas: T(24), U(24), I(24), V(24), AE(28), AF(28), AH(12), AG(16) total: 170 viviendas en construcción, 4 cuadrillas de mano de obra, Cuadrillas mano de obra instalaciones, 4 frentes de movimiento de tierras. Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, dos proveedores de concreto. Pronto pago hito 3, 24 cimentaciones fundidas \$318 millones. En perfeccionamiento ajustes contratos 243 y 244, ajuste cumplimiento metas entrega de viviendas hasta 31/07/2022. En trámite quinto pago \$708 millones, contrato 277 interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$7.049.420.065


Avance financiero

20,05%

METAS DICIEMBRE 2021

La totalidad de las viviendas se entregarán antes de finalizar el periodo de gobierno.


La fecha de culminación no se altera (julio 2022).

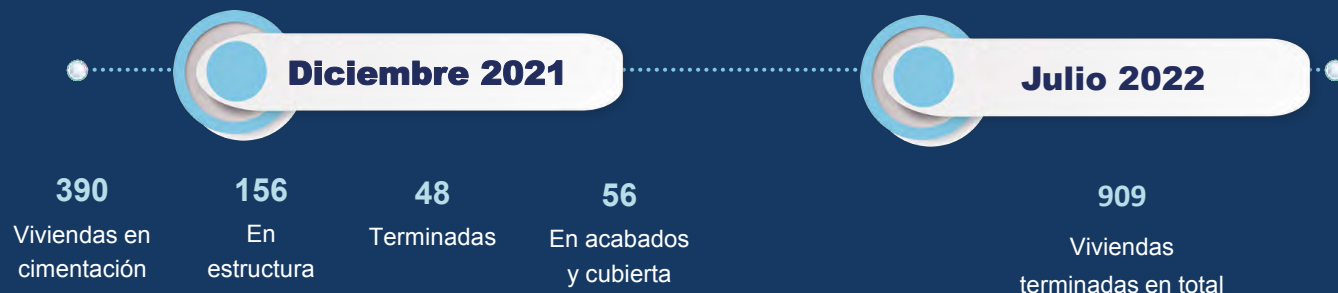



ACTIVIDADES RELEVANTES

- Movimiento de tierras **47,452m³** de tierra (incluido expansión).
- **Manzana T:** 24 cimentaciones fundidas, 24 viviendas con muros de primer piso fundido, 16 viviendas con placa entrepiso fundidas, 4 viviendas con muro de segundo piso fundido, 6 con malla e instalaciones de muro de segundo piso listas para instalar formaleta.
- **Manzana U:** 20 viviendas con cimentación fundida. Formaleta instalada para muros primer piso para dos viviendas. 8 viviendas con malla electrosoldada para muros.
- **Manzana i:** 22 viviendas con excavación de ciclópeos, 22 viviendas con ciclópeos fundidos, 22 viviendas con excavación para vigas de cimentación, 10 con acero para vigas instalado y 12 viviendas con instalaciones hidrosanitarias instaladas en cimentación.
- **Manzanas AE AF:** 12 viviendas con excavación de ciclópeos, 10 viviendas con ciclópeos fundidos y excavación para vigas, 12 viviendas con acero de vigas de cimentación instalado e instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y gas. 8 cimentaciones fundidas, 6 viviendas en estructura.
- **Manzanas AH AG:** 24 viviendas con excavación de ciclópeos, 24 viviendas con ciclópeos fundidos, 20 viviendas con excavación para vigas de cimentación, 10 viviendas con acero para vigas de cimentación y 8 viviendas con instalaciones hidrosanitarias instaladas
- **Continúa:** Movimiento de tierras para terraceo, figuración de hierro para cimentaciones, muros y placa entrepiso.
- Se solicitó a Consorcio incrementar el número de personal y acelerar movimiento de tierras para cumplir metas. Escases de triturado de ½ pulgada para fundiciones de muros.
- Llegada a obra de tercer formaleta, cerámica para baños y pisos 48 viviendas.

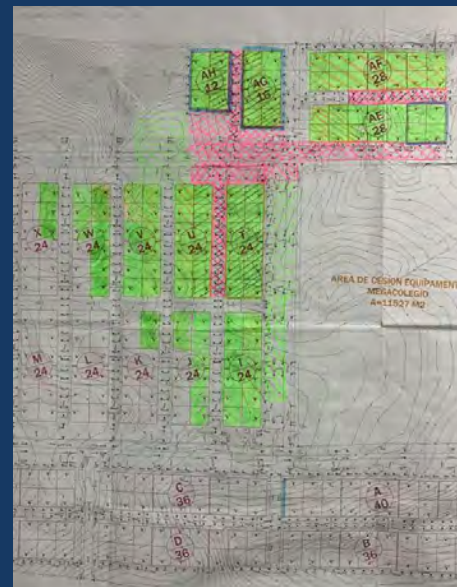

AVANCE MOVIMIENTO DE TIERRAS



ACTIVIDADES RELEVANTES



AVANCE MOVIMIENTO DE TIERRAS

VIVIENDA URBANA SAUCES II

 CONSORCIO MOCOA 2019	PROYECTO SAUCES II CONTROL DIARIO PERSONAL		F-SST-67						
			Versión I						
			11/03/2019						
SEMANA 2 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2021			TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA						
PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
CONSORCIO MOCOA 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	9	9	5	10	10	10		9
CONSORCIO MOCOA 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	3	3	1	3	3	3		3
INTERVENTORIA HMY	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	8	8	0	8	8	8		7
TOTAL		20	20	6	21	21	21	0	18
CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
		L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MOCOA 2019	2	2	2	2	2	2		2
SEGURIDAD PRIVADA AMCVID	CELADURIA OBRA	2	2	2	2	2	2		2
CONSTRUCTORA EYJ SAS	CIMENTACION	36	37	38	32	26	30		33
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	20	21	15	22	22	22		20
CASTAÑEDA COSNTRUCTORA SAS	CIMENTACION	9	12	9	13	10	13		11
SINIESTERRA CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	14	17	21	21	21	14		18
ELECTROSERVIG	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	6	6	4	7	7	7		6
YENI CONSTANZA MIGUEZ	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	1	1	0	1	1	1		1
BCH HIDROSANITARIAS SAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	9	9	0	9	9	9		8
TEJA CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	6	7	0	7	7	7		6
TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		105	114	91	116	107	107	0	107
JVC CONSTRUCCIONES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	11	8	9		5
JVC CONSTRUCCIONES	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	3	4	4		2
EDUARDO MORA	OPERADORES	1	0	1	1	1	0		1
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0	0		0
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	3	2	0		1
LEONEL OJEDA	OPERADORES	0	0	1	1	1	1		1
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	5	11	10	3		5
WILSON PUENTES	OPERADORES, DESPACHADOR	1	1	1	2	1	2		1
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	5	10	6	3		4
TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA		2	1	13	42	33	22	0	19
TOTAL PERSONAL EN EL DIA		107	115	104	158	140	129	0	126

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 126	Local: 80 63%	Calificados: 5 6%
		No Calificados: 75 94%
	Foráneo: 46 37%	Calificados: 15 33%
		No Calificados: 31 67%



VIVIENDAS URBANAS

N° DE
VIVIENDAS



87

Aportes de
FONVIVIENDA



5.764 millones

Valor otorgado por FONVIVIENDA
a través del Convenio
No. 9677-PPAL001-783-2018



AVANCES

- Se cuenta con la estructuración técnica, jurídica y financiera de las versiones del Anexo Técnico y de la justificación para las invitaciones a cotizar. Pendiente la aprobación de la implantación de las 909 unidades de vivienda.



AVANCES

● MOCOYA DISPERSO:

Proceso - Contrato de obra: El día 28/09/2021, a las 11:40 am; se culmina la audiencia de adjudicación del proceso No. **FNGRD-LP-002-2021**, Adjudicando el proceso al CONSORCIO OTES MOCOYA 1.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>,

El consorcio realizó las gestiones pendientes ante la DIAN, con base a ello la UNGRD remitió la instrucción para elaboración de contrato a la Fiduprevisora. El 10/12/2021, La Fiduprevisora envía el contrato para la obtención de pólizas y suscripción final del mismo.

Proceso - Contrato de Interventoría: El 09/11/2021 se realizó la publicación del concurso de méritos abierto para la interventoría, bajo el número del proceso FNGRD-CMA-001-2021.

Adjudicado el proceso al CONSORCIO APOYOS 2022.

El Consorcio informa que tiene cita asignada para el día 15 de diciembre ante la DIAN, para el número del RUT del Consorcio, lo que permitirá continuar con el proceso contratación.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376922&isFromPublicArea=True&isModal=False>

UNGRD	
Precio estimado total:	240.667.980 COP
Número del proceso:	FNGRD-CMA-001-2021
Título:	INTERVENTORÍA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOYA
Fase:	Presentación de observaciones
Estado:	Publicado
Descripción:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y SU ANEXO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO 9677 PPAL001 668 2017, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
Tipo de proceso:	Concurso de méritos abierto



Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Publicación del aviso de convocatoria pública	13 días de tiempo transcurrido (9/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos	13 días de tiempo transcurrido (9/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	13 días de tiempo transcurrido (9/11/2021 6:16:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	5 días de tiempo transcurrido (17/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	-
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones	4 días de tiempo transcurrido (18/11/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	4 días de tiempo transcurrido (18/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	3 días de tiempo transcurrido (19/11/2021 7:08:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	4 días de tiempo transcurrido (18/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	16 horas de tiempo transcurrido (22/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	13 minutos para terminar (23/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	2 horas para terminar (23/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	1 día para terminar (25/11/2021 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas	1 día para terminar (25/11/2021 10:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas	1 día para terminar (25/11/2021 10:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	2 días para terminar (25/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	7 días para terminar (30/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta	8 días para terminar (1/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato	9 días para terminar (3/12/2021 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	12 días para terminar (6/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	13 días para terminar (6/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

VIVIENDA RURAL NUCLEADA

N° DE VIVIENDAS



216

INVERSIÓN



Urbanismo **10.110 mill**
 Vivienda **15.870 mill**
 PTAR: **1.500 mill**
 Subestación eléctrica: **3.500 mill**
 Total: **\$ 30.980 millones**

\$ 9.516.549.300 En convenio con **Banco Agrario**

\$21.463.764.291 Recursos faltantes

AVANCES

- **Mocoa Nucleada:** A la fecha se cuenta con el aval técnico del **BAC** para iniciar la ejecución del proyecto de vivienda.

La consultoría SPIA realizó los ajustes al prototipo de vivienda estando en revisión para aval final por parte del BAC.

A la fecha se cuenta con la estructuración técnica del proyecto para la apertura del proceso de licitación, estando pendiente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el cierre financiero del mismo.

De los 216 hogares a los cuales les fueron asignados los subsidios para vivienda rural nucleada, A la fecha por parte del **BAC** se encuentran revisados y aprobados 211 hogares (97.7%) incluidas las 40 sustituciones solicitadas por la alcaldía y tramitadas por la UNGRD.

Con relación al compromiso del **Director de la UNGRD** se realizó consulta al **BAC** para definir la situación de los 5 hogares de la comunidad MUSURRUNAKUNA que solicitan la construcción de las viviendas en el predio entregado a esta comunidad en la Vrda. El Pepino, estando a la espera de respuesta, pues este cambio constituiría la creación de otro proyecto que deberá ser estructurado y avalado de manera por el BAC.

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018

Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018

Fecha de finalización: 30 - ENE – 2022 (Según fecha contractual).



TIPO DE INTERVENCIÓN


CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado Actual:

El 07 de diciembre de 2021, se radicó el trámite de adición y prórroga al convenio 512-2017, al Ministerio de Educación Nacional y a FIDUPREVISORA S.A, por un valor de \$ 7.183.977.854 y una prórroga de 12 meses, estamos a la espera de la firma de la Viceministra para poder continuar con el trámite.

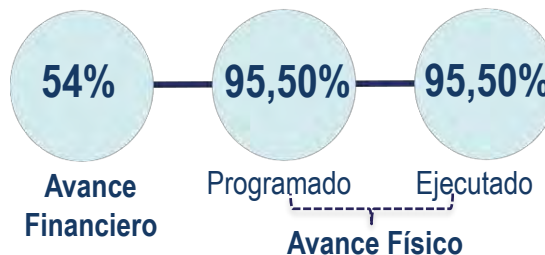

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

Supervisor UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo

PROYECTO PLAZA DE MERCADO

PLAZA DE MERCADO




INVERSIÓN

\$18.976.637.030

PERSONAL PROYECTADO: **56**



AVANCES

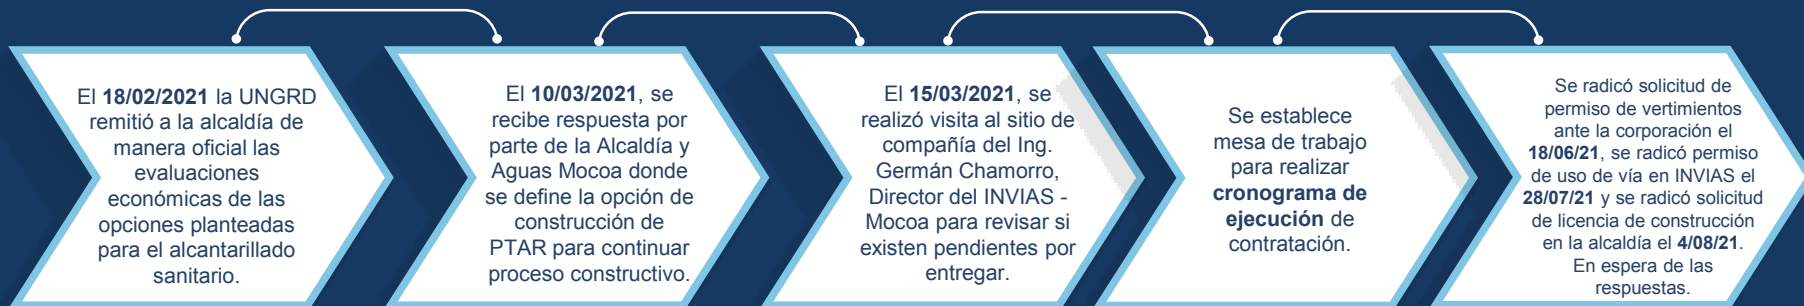

CRONOGRAMA



El futuro
 es de todos

Presidencia
 de la República

PROYECTO CENTRO PENITENCIARIO



ENTIDADES PARTICIPANTES:
 USPEC - INPEC - ALCALDIA DE
 MOCOA - UNGRD

ALCANCE:
 Compra de predio de 11 hectáreas
 para la construcción de nuevo
 ERON y su escrituración y registro.

ESTADO:
 En proceso de adquisición por parte de la
 Alcaldía de Mocoa.
 El Municipio está estructurando el proyecto de
 acuerdo en el que se solicita al concejo Municipal
 autorización para la compra del predio.

RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.


CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	50%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	32%
ESTADO	Proyecto en ejecución, se adelanta actividades de instalación de micromedidores, empalmes en redes de distribución y líneas de conducción y optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable existente.

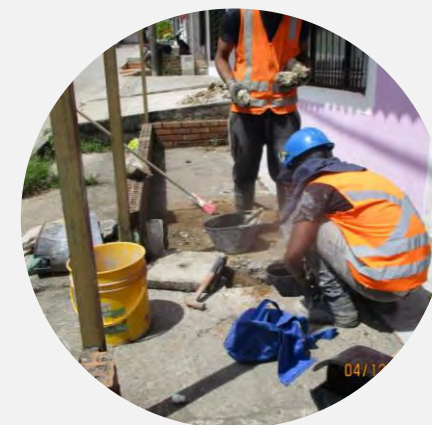

ETAPA

2



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO



CONTRATOS EN EJECUCIÓN

57



EMPLEO GENERADO A LA FECHA

753



PERSONAL PROYECTADO

1.157

	09/12/21	15/12/21		09/12/21	15/12/21
MANO DE OBRA LOCAL	551	554	MANO DE OBRA FORÁNEA	203	199
CALIFICADOS	243	234	CALIFICADOS	120	128
NO CALIFICADOS	308	320	NO CALIFICADOS	83	71
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	73%	74%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	27%	26%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.355	2.083
EMPLEOS INDUCIDOS	301	463
TOTAL EMPLEOS	1.656	2.546

GRACIAS
