

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Junio 16 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos:

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

18 de obra

18

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones

17 →
CONTRATOS

Total de contratos:

13 de obra.

4 de interventoría.

Ejecución

12

4

Contratación

1

0

Perfeccionamiento

0

0

% en Perfeccionamiento ejecución

92,3%

100%

Inicio total de las obras de vías y alcantarillado:

30 de junio 2021



1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

 **Plazo: VEINTICINCO (25) MESES**
Inicio: 27 JUNIO DE 2019
Terminación: 14 DE JULIO DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

Estado de la Obra:

La Alcaldía de Mocoa presenta acta de suspensión No. 03 del contrato de Obra No. 063 del 2019; esto sustentado en la falta de materiales en la zona, producto de los cierres viales que ha generado el paro nacional.

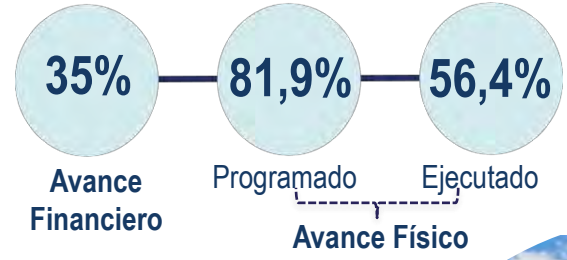

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960
Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa	Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	




ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Inicio: 15 DICIEMBRE DE 2020
 Terminación: 14 DE JUNIO DE 2022


TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO


CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 96 Total Projectado: 100	Local 60 63%	Calificados 34 57%
		No Calificados 26 43%
	Foráneo 36 37%	Calificados 30 83%
		No Calificados 6 17%

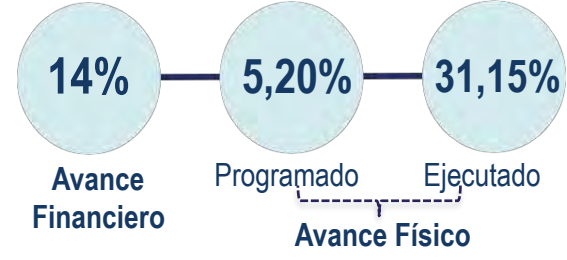

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	

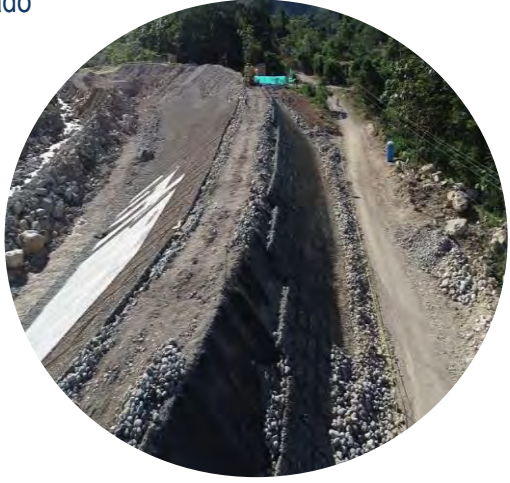

ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: **CATORCE (14) MESES**
 Inicio: 12 DE FEBRERO DE 2021
 Terminación: 11 DE ABRIL DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 24
 Total Projectado: 30

Local 19 79%	Calificados 15 79%
	No Calificados 4 21%
Foráneo 5 21%	Calificados 5 100%
	No Calificados 0 0%

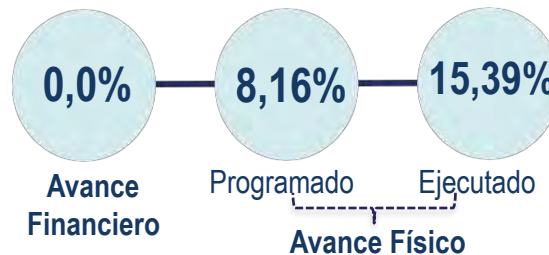

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de gaviones



Almacenamiento de malla para colcha gavión



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: CATORCE (14) MESES
Inicio: 12 DE FEBRERO DE 2021
Terminación: 11 DE ABRIL DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

Estado Actual:

Esta obra se encuentra suspendida desde el **14/05/21** se reiniciará una vez se normalice la situación de orden público.

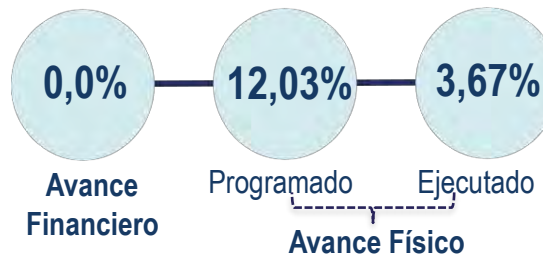

45.589

Personas beneficiadas

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 30

Local 10
83%

Foráneo 2
17%

Calificados 10
100%

No Calificados 0
0%

Calificados 2
100%

No Calificados 0
0%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-980-2020
Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre del Contratista:
HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD

Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



Condiciones en las cuales queda el río después de suspender actividades

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 08 DE MARZO DE 2021

Terminación: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

Obra física:

Se desarrolla mesa técnica en la implantación de la estructura Dique abierto 1, el contratista manifiesta a la Interventoría las dificultades en la longitud. Interventoría en mesa de trabajo con la UNGRD busca dar soporte para subsanar y poder dar inicio físico a la obra que cuenta con PGS, PMA, PMT, PB y SST ya listo.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26
 Total Projectado: 35

**Local 18
 69%**

**Foráneo 8
 31%**

Calificados 14
78%

No Calificados 4
22%

Calificados 8
100%

No Calificados 0
0%



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1334-2020
 Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO RIO MULATO.

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-141-2021
 Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 RÍO MULATO

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



El futuro es de todos

Presidencia de la República

6 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO 1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Inicio: 9 DE MARZO DE 2021
Terminación: 8 DE JULIO DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 14 Total Projectado: 40	Local 12 86%	Calificados 8 67%
		No Calificados 4 33%
	Foráneo 2 14%	Calificados 2 100%
		No Calificados 0 0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto
\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Inicio: 9 DE MARZO DE 2021
Terminación: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022


TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 16 Total Projectado: 45	Local 12 75%	Calificados 6 50%
		No Calificados 6 50%
	Foráneo 4 25%	Calificados 4 100%
		No Calificados 0%

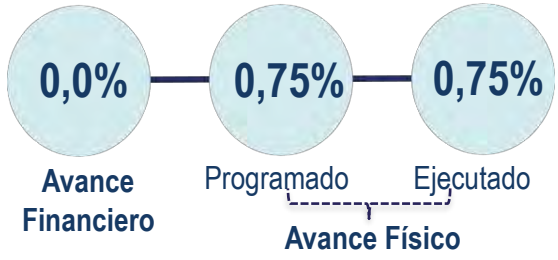

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06 Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOCA
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 12 DE MARZO DE 2021

Terminación: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 35

Local 11
73%

Foráneo 4
27%

Calificados 9

82%

No Calificados 2

18%

Calificados 3

75%

No Calificados 1

25%

0,0%

Avance
Financiero

6,76%

Programado

7,47%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1388-2020
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DIQUE 1

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 536.303.878,1967
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Adecuación Jarillón Temporal



Control Topográfico



ALCANCE

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 12 DE MARZO DE 2021

Terminación: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%


Foráneo 10
48%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 6
60%

No Calificados 4
40%

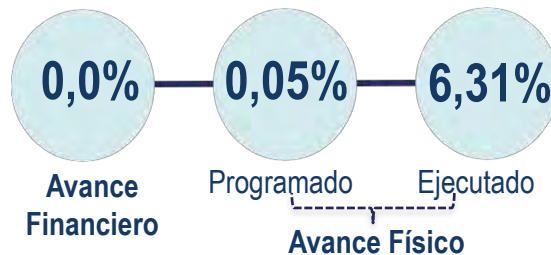

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.319.593.302,48 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO MURO RIO MOCOCA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.303.365,8033 (para este contrato) <hr/> Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mococa	



Manejo de aguas



Excavaciones



ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 16 DE MARZO DE 2021

Terminación: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5

Total Projectado: 35

Local: 3
60%

Foráneo: 2
40%

Calificados: 3

100%

No Calificados 0


0%

Calificados : 2

100%

No Calificados 0

0%

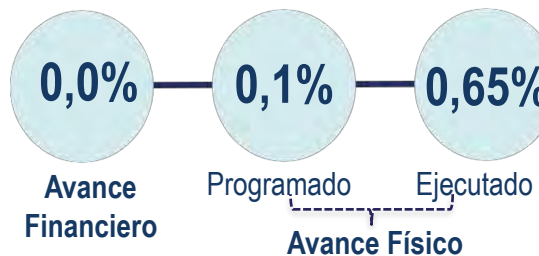

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1119-2020 Valor: \$ 5.280.966.838,95	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 426.384.755,43 (para este contrato)
Nombre del Contratista: A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



Topografía Cálculos de Volúmenes



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 16 DE MARZO DE 2021

Terminación: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 45

Local: 4
50%


Foráneo: 4
50%

Calificados: 4
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 3
75%

No Calificados 1
25%

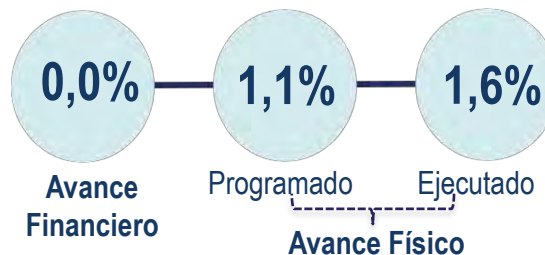

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68 <hr/> Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato) <hr/> Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



Adecuación de accesos a Obras



Adecuación Campamento



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Inicio: 28 DE ABRIL DE 2021
 Terminación: 27 DE OCTUBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de jarillón y espolones.

Estado Actual:

El contratista de obra continúa realizando los ajustes requeridos por la interventoría a los documentos del PMT, PMA y Protocolo de Bioseguridad.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
 Total Projectado: 61

Local 6

75%

Calificados 3

50%

No Calificados 3

50%

Foráneo 2

25%

Calificados 2

100%

No Calificados 0

0%



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1382-2020
 Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO DRAGADO
 MOCOA 2020

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-205-2021
 Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO
 INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



El futuro
 es de todos

Presidencia
 de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 03 DE MAYO DE 2021

Terminación: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25
 Total Projectado: 37

Local: 12
48%


Foráneo: 13
52%

Calificados: 11
92%

No Calificados 1
8%

Calificados : 13
100%

No Calificados 0
0%

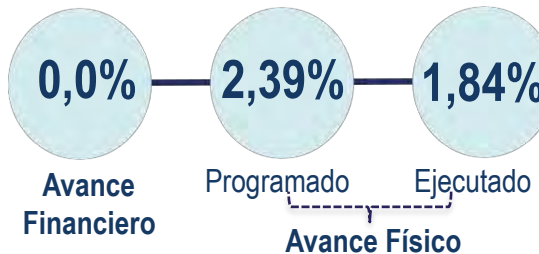

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.478.287,36	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.807.563,26 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE • Azud 10, Sector Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 15 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 14 DE OCTUBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones

CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 7
Total Projectado:30

Local: 4
57%

Foráneo: 3
43%

Calificados: 4


100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 2

67%

No Calificados 1
33%

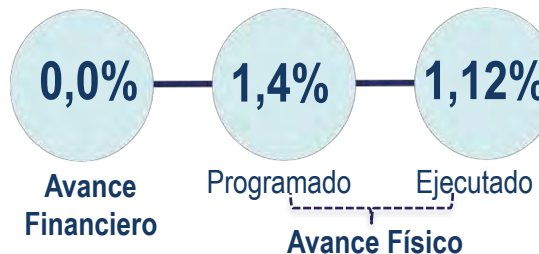

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1330-2020
Valor: \$ 1.938.876.092,45

Nombre del Contratista:
CONSORCIO OBRAS POR
COLOMBIA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-133-2021
Valor: \$ 157.336.269,67

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER –
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



Adecuación de sitio del campamento



Realización de Comités Técnicos



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 15 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 14 DE OCTUBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5
 Total Projectado:30

Local: 1 20%	Calificados: 1 100%
	No Calificados 0 0%
Foráneo: 4 80%	Calificados : 4 100%
	No Calificados 0 0%

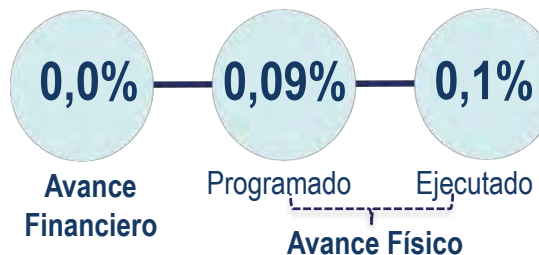

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10



El futuro
 es de todos

Presidencia
 de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 8.991.999.385,27

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 23 DE MARZO DE 2021

Terminación: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

Estado Actual:

Se encuentra en cambio de consorciado para
 ajustar contrato de obra por parte de la
 Fiduprevisora.



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.317.396.139,27	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 674.603.246,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOCA 520	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.474.375.500,46

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 6 DE MAYO DE 2021

Terminación: 6 DE NOVIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

Estado Actual:

Se encuentra en expedición de pólizas por parte del contratista.

45.589
 Personas beneficiadas

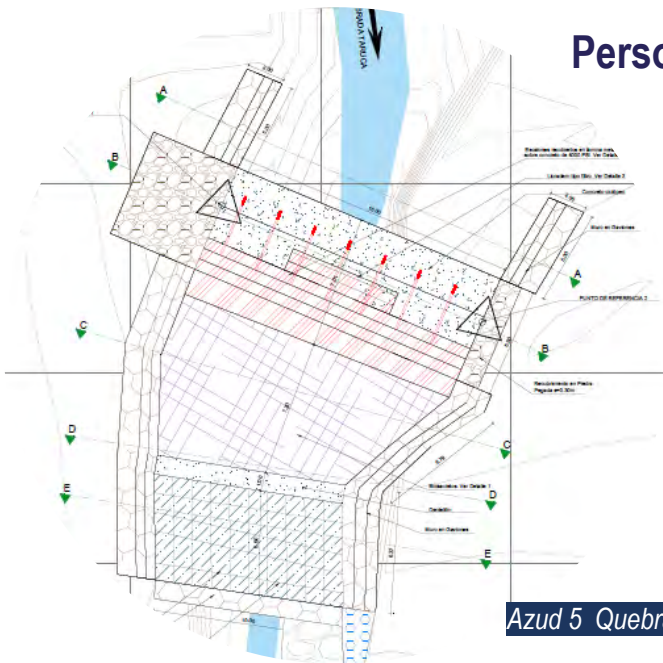

Azud 5 Quebrada, Taruca

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.841.500.569,72	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.874.930,74 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD
 Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Inicio: 10 DE MAYO DE 2021

Terminación: 9 DE MAYO DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Revisión de estudios y diseños

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-183-2021
 Valor: \$ 4.452.771.492,00

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-743-2021
 Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre del Contratista:
 CONSTRUVAL
 INGENIERÍA S.A.S.

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INGENIERÍA DE
 MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa




Sector a intervenir



45.589

Personas beneficiadas

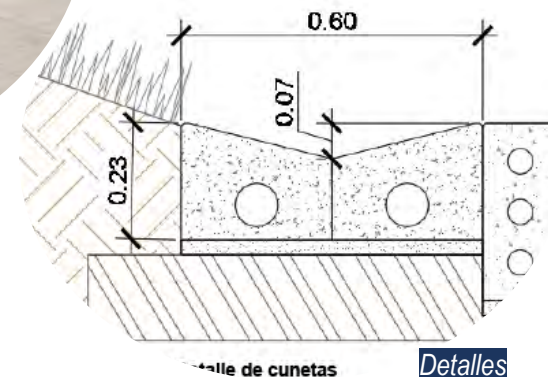

ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.2

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y
ALCANTARILLADO EN
EJECUCIÓN**

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIEZ (10) MESES

Inicio: 7 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 7 DE FEBRERO DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

Estado Actual:

Se realizó visita con profesionales de la alcaldía y el ejército para verificar uno de los tramos a intervenir, adicional hubo mesa de trabajo con el PMAMO, se está coordinando reunión con alcaldía y aguas Mocoa. Contratista de obra e interventoría se encuentran adelantando revisión de los documentos técnicos. Pendiente por firmar acta de inicio por situación del paro nacional.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-366-2021
Valor: \$ 8.272.681.997

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-555-2021
Valor: \$ 567.850.150

Nombre del Contratista:
CONSORCIO VIAS MOCOCA 040

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER VIAS

Supervisor UNGRD
Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



Mesa de trabajo con PMAMO



45.589

Personas beneficiadas



Reunión con alcaldía y ejército



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE


ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

 Plazo: CUATRO (4) MESES
Inicio: 19 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 18 DE AGOSTO DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:
Los contratos se encuentran suspendidos, se adelanta revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad y adecuación de campamento. Se adelanta trámite de anticipo.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Tramos a intervenir



 **45.589**
Personas beneficiadas

 **ALCANCE**

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
 - Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

 Plazo: SEIS (6) MESES
Inicio: 13 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 12 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2** sectores

Estado Actual:

No se ha dado inicio al contrato de obra ya que el contrato de interventoría se encuentra suspendido. Se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Tramos a intervenir



 **45.589**
Personas beneficiadas

 **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
 - Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
 - Barrio Piñayaco Z4 - 3.
 - Barrio Piñayaco Z4 - 4.
 - Barrio Peñón Z5 - 1.
 - Barrio Peñón Z5 - 2B.
 - Barrio Peñón Z5 - 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: CINCO (5) MESES

Inicio: 27 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

Estado Actual:

Los contratos se encuentran suspendidos, se adelanta revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad, se realizó levantamiento topográfico.



45.589

Personas beneficiadas

Levantamiento Topográfico

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-407-2021
Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre del Contratista:
ALEX ALBERTO CALVACHE
MENA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 72.268.367

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Inicio: 7 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 7 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación 7 VÍAS en 2 SECTORES

Estado Actual:


No se ha dado inicio al contrato de obra ya que el contrato de interventoría se encuentra suspendido. Se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Sectores a intervenir

45.589
Personas beneficiadas

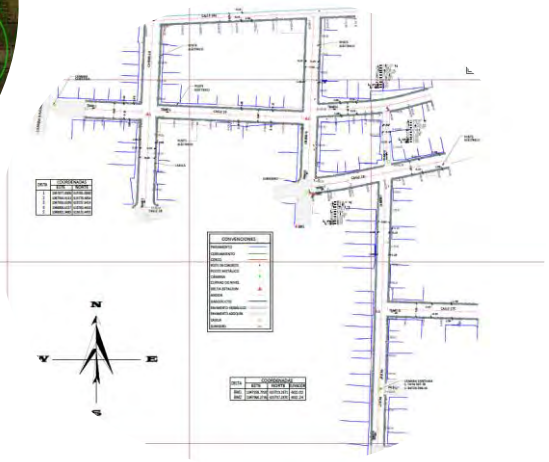

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

 Plazo: SEIS (6) MESES
Inicio: 19 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 18 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Los contratos se encuentran suspendidos, se adelanta revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad y adecuación de campamento y puntos de acopio de material. Se adelanta trámite de anticipo.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-518-2021 Valor: \$ 1.206.210.066	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 85.658.245
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL CAIMARON	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	

 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.



 **45.589**
Personas beneficiadas

Sector a intervenir

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

Plazo: OCHO (8) MESES
Inicio: 19 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 18 DE DICIEMBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación 8 VÍAS en 3 SECTORES

Estado Actual:
Los contratos se encuentran suspendidos, se adelanta revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad, se realizó visita conjuntamente con la Alcaldía para verificación de líneas de paramentos.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Recorrido con personal de Alcaldía

 **45.589**
Personas beneficiadas



 **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7ª.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
 - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: SIETE (7) MESES

Inicio: 26 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Los contratos se encuentran suspendidos, sin embargo se adelanta revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad, levantamiento de actas de vecindad e instalación de valla informativa.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-636-2021
Valor: \$ 1.253.593.696

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.085.329

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS
CAPITAL

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



45.589

Personas beneficiadas



Tramo a ejecutar

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: **OCHO (8) MESES**

Inicio: 27 DE MAYO DE 2021

Terminación: 26 DE ENERO DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.


Estado Actual:

Revisión de Información técnica, planos localización y detalles así mismo estudios y diseños.

45.589

Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOCA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	

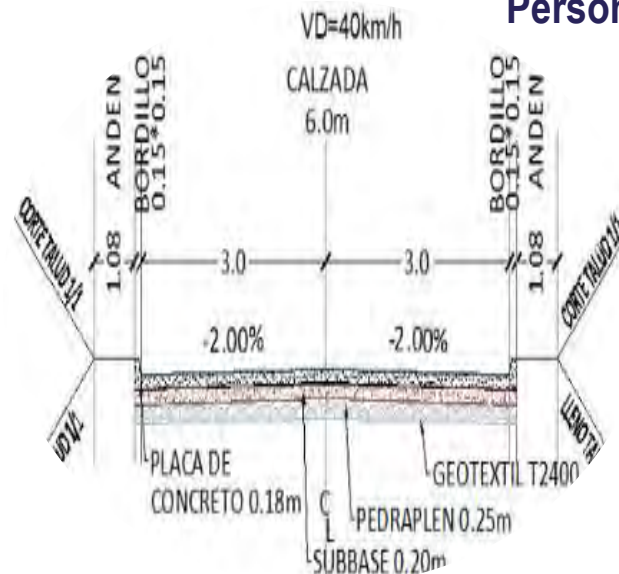

ALCANCE

Ciudadela deportiva entre CII 12 y Cra 7, y Cra 6 entre CII 4 barrio Jose Homero y CII 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y CII 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: CINCO (5) MESES

Inicio: 27 DE MAYO DE 2021

Terminación: 26 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

No se ha dado inicio al contrato de obra ya que el contrato de interventoría se encuentra suspendido. Se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-549-2021
Valor: \$1.830.025.649

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS
MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 130.312.324

(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Sector a intervenir

 **45.589**

Personas beneficiadas



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.769.435.891

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: OCHO (8) MESES

Inicio: 18 DE JUNIO DE 2021

Terminación: 17 DE FEBRERO DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR**
intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Revisión de Información técnica, planos localización y
detalles, así mismo estudios y diseños.

Inicio obra física:

21 de junio de 2021

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-550-2021
Valor: \$ 1.282.970.234

Nombre del Contratista:
DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-969-2021
Valor: \$ 82.948.494
(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD
Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa




ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la
reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

 **45.589**

Personas beneficiadas

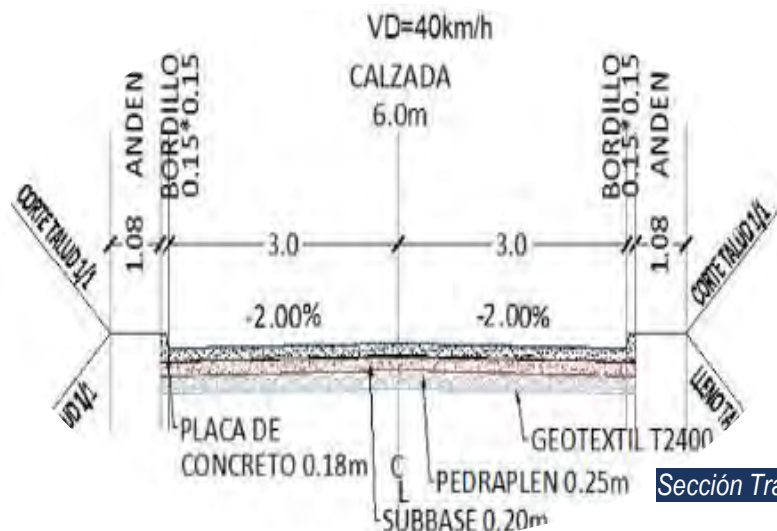

Sección Transversal Típica

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.644.745.708,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Inicio: 15 DE JUNIO DE 2021

Terminación: 15 DE JUNIO DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Revisión de Información técnica, planos localización y detalles así mismo estudios y diseños.

Inicio obra física:

25 de junio de 2021

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-900-2021
 Valor: \$ 6.241.228.546


Nombre del Contratista:
 CONSORCIO VIAS 897

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-969-2021
 Valor: \$ 403.517.162,94

Nombre de la Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 PAVIMENTOS 063

45.589

Personas beneficiadas

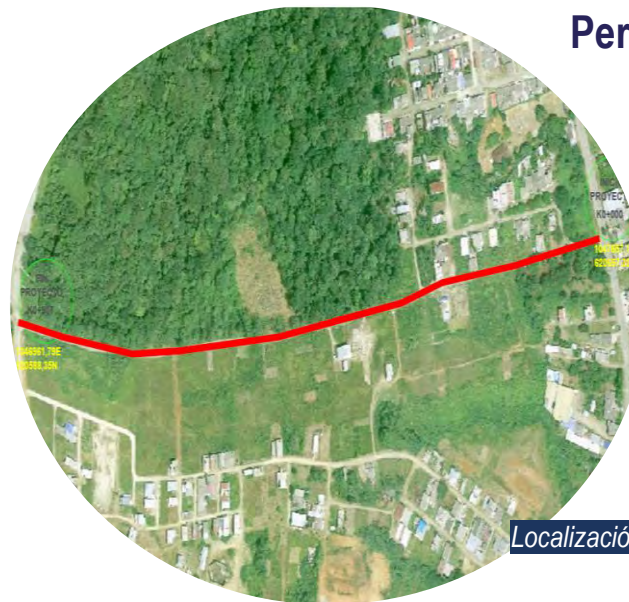

Localización del Sector



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco



1.3

SEGUIMIENTO VÍAS Y ALCANTARILLADO

1

Mejoramiento de la vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.



Obra

Interventoría

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones

*Avance



30,07%

Avance financiero



0%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%



0%

total de
viviendas



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

*Avance estudios, diseños y construcción preliminares primera fase constructiva del proyecto. Consorcio puede cobrar \$1.400 mil.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$ 4.852 millones

Avance financiero

30,05%

CRONOGRAMA

FECHA DE
TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



519

909

PERSONAL
PROYECTADO



82

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Continúa movimiento de tierras 11.240,79 m3 de tierra (incluido expansión)
- Consorcio radica RTA CORPOAMAZONIA ronda hídrica.
- Plan de choque cumplimiento cronograma de obra y terminación fase I diseños.
- Vinculación Director de Obra, Residente Ambiental, Fortalecimiento Residente Social.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	9	2	11
No calificado	16	0	16
Total	25	2	27



VIVIENDAS URBANAS



VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



VIVIENDA RURAL NUCLEADA



\$9.516'549.300 En convenio con **Banco Agrario**

\$15.436.450.700 Recursos faltantes

AVANCES

- Desglose cronograma General Ejecutivo de actividades.
- Continúa elaboración de documentos precontractuales para contratación persona jurídica/natural que formule, elabore estudios y diseños, tramite licencias y construya el proyecto de vivienda.
- Continúa elaboración de documentos precontractuales para contratación persona jurídica/natural que realice la interventoría del proyecto de vivienda.

AVANCES

Mocoa Disperso: se envió el **11-06-2021** los anexos técnicos, análisis del sector y estudios previos para revisión del Jurídico designado; fue devuelto para subsanación y se espera tenerlo corregido para envío nuevamente el viernes **18-06-21**. La **alcaldía** se encuentra convocando a los beneficiarios de Mocoa disperso para la socialización del prototipo el día **20-06-21** en la casa de justicia

Mocoa Nucleada: Se continúa con la **subsanación de la documentación de los beneficiarios** que hacen parte del proyecto con el fin de obtener viabilidad del banco, se trabaja en conjunto con la alcaldía para ello. La alcaldía se comprometió a entregar el **certificado de disponibilidad** de servicios para hoy **16-06-21**.

Se obtuvo visto bueno del poder por la **Notaría Única de Mocoa** para radicar y proyectar la minuta correspondiente al **desenglobe del lote**; para ello la abogada designada por la Fidupervisora se desplazará a Mocoa para la firma del desenglobe.

SPIA se encuentra realizando los ajustes a los diseños para cumplir con los requerimientos del **BAC**.



3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

 Inicio: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
Terminación: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN


CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado Actual:

En trámite de ampliación de suspensión por dos meses (12/06/21 al 12/08/21) por falta de materiales y problemas de orden nacional.

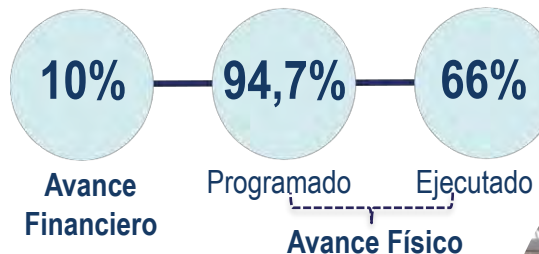

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00


Nombre del Contratista:
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00




Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.


Supervisor UNGRD
Yineth Arinda Cumplido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo

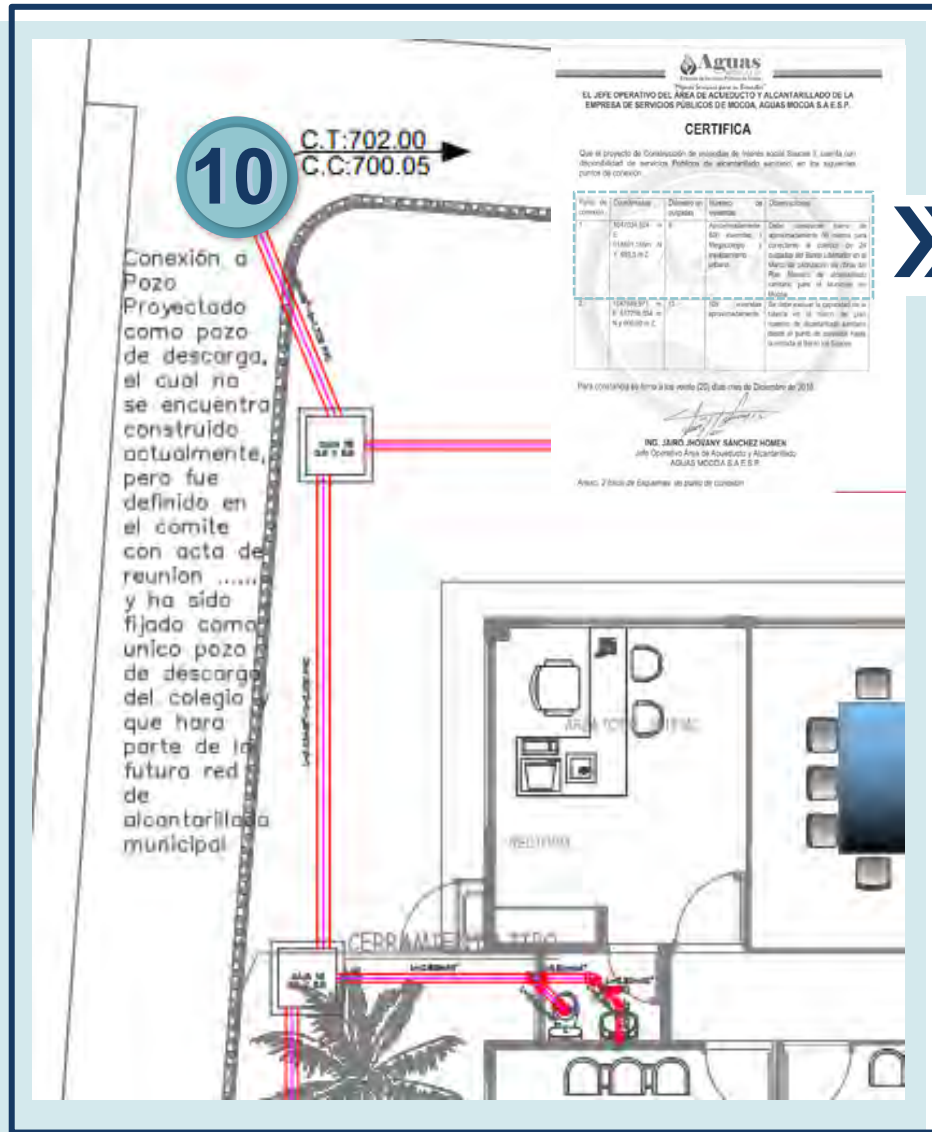



-  **PUNTO DE CONEXIÓN**
1
-  **COORDENADAS**
**1047034,524 m E
618101,165m N
Y 651,5m Z.**
-  **DIÁMETRO EN PULGADAS**
8
-  **NÚMERO DE VIVIENDAS**
Aproximadamente 800 viviendas, 1 Megacolegio y equipamiento urbano.
-  **OBSERVACIONES**
Debe construirse tramo de aproximadamente 86 metros para conectarse al colector de 24 pulgadas del barrio Libertador en el marco de priorización de obras del plan maestro de alcantarillado sanitario para el municipio de Mocoa.

-  Construcción de red alcantarillado por contratista de Sauces II
ENTREGA: (30/11/2021)
-  Cámaras a construir por Sauces II
-  Descarga construida por contratista de Megacolegio

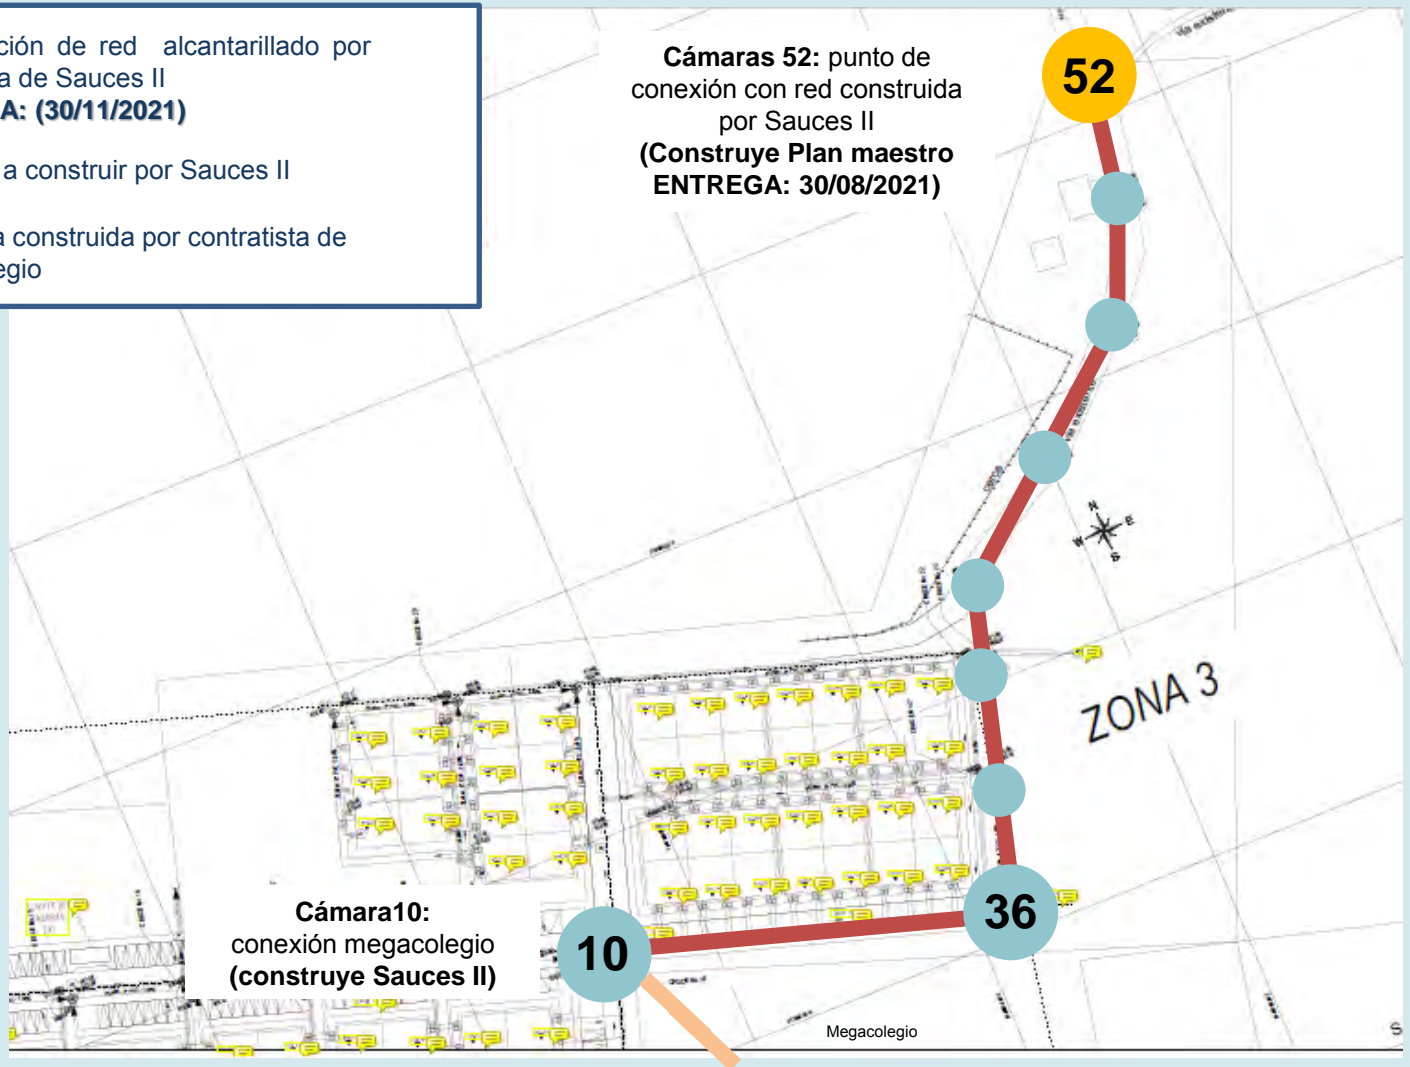

PROYECTO PLAZA DE MERCADO



INVERSIÓN
\$6.000.000,00*

*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.




PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56



AVANCES

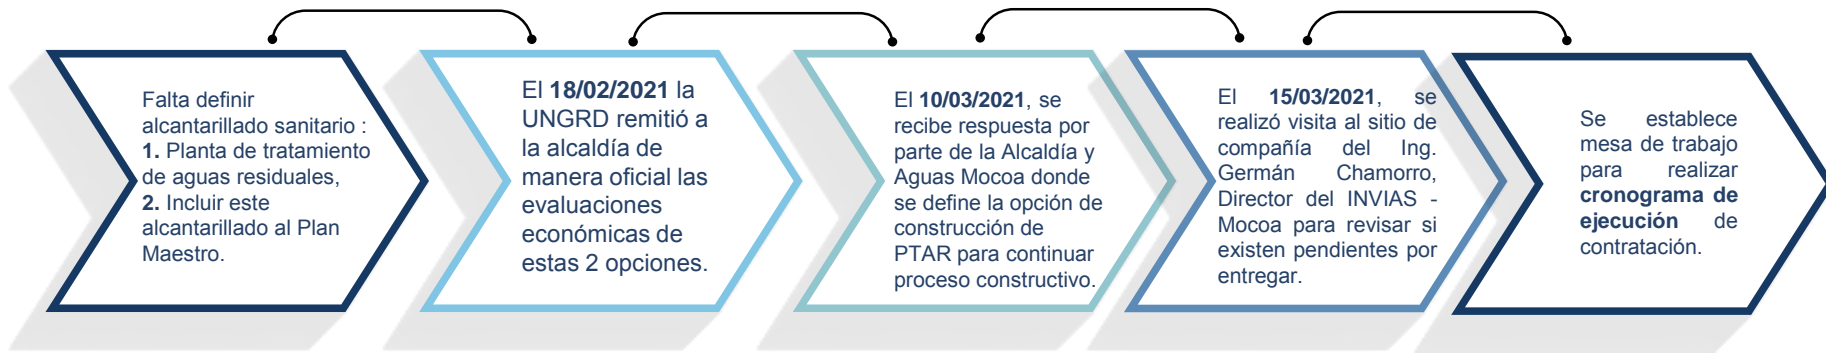

CRONOGRAMA



El futuro es de todos

Presidencia de la República

COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO



AVANCES



INVERSIÓN

\$ 1.257.921.000,00* lote

\$ 80.000.000.000,00 Construcción

* Estos recursos serán gestionados por el **FNGRD** para su adquisición.



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO

Reconstrucción del sistema de acueducto del municipio de Mocoa

CONTRATISTA

Mario Germán García García

INTERVENTOR

Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S

CONSULTOR

CDM Smith

VALOR TOTAL DEL CONVENIO

\$31.108 millones

PLAZO

Plazo inicial: 12 meses
Prórrogas: 5: 22 meses
Acta de inicio: 27/06/17
Suspensiones (3): 7 meses
Reinicio: 15/10/20
Terminación: 17/10/20

ALCANCE

- Construcción bocatoma.
- Construcción de desarenador de alta tasa y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.



ESTADO ACTUAL CONTRATO AGUAS MOCOCA




Actualmente se adelanta por parte de Aguas Mocoa S.A. E.S.P., la **expedición de las respectivas pólizas** que amparan el contrato y la revisión conjunta con la interventoría de las **hojas de vida, programación y APU's del contrato.**

Una vez avalados los anteriores documentos, se procederá con la **suscripción del acta de inicio** respectiva.

4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

	OBRAS EN EJECUCIÓN	32
	EMPLEO GENERADO A LA FECHA	306
	PERSONAL PROYECTADO	802

	09/06/21	16/06/21		09/06/21	16/06/21
MANO DE OBRA LOCAL	213	206	MANO DE OBRA FORÁNEA	96	100
CALIFICADOS	133	135	CALIFICADOS	87	87
NO CALIFICADOS	80	71	NO CALIFICADOS	9	13
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	69%	67%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	31%	33%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	551	1.444
EMPLEOS INDUCIDOS	122	321
TOTAL EMPLEOS	673	1.765

GRACIAS

