

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Junio 2 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos:

18 de obra

Ejecución

18

% en Perfeccionamiento ejecución

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones

17
CONTRATOS



Total de contratos:

13 de obra.

4 de interventoría.

Ejecución

10

3

Contratación

2

1

Perfeccionamiento

1

0

% en Perfeccionamiento ejecución

84,6%

75,0%

Inicio total de las obras de vías y alcantarillado:

15 de junio 2021

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra,
Interventoría y supervisión



Plazo. VEINTRES MESES (23) MESES

Inicio: 27 JUNIO DE 2019

Terminación: 14 DE JUNIO 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de Muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada 457 m3

Estado de la Obra:

La Alcaldía de Mocoa presenta acta de suspensión No. 03 del contrato de Obra No. 063 del 2019; esto sustentado en la falta de materiales en la zona, producto de los cierres viales que ha generado el paro nacional.



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
Contrato No. 063 del 2019
Valor: \$ 3.841.235.901

Nombre de Contratista:
Virgilio Bravo Sosa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-261-2019
Valor: \$ 360.589.960

Nombre de la Interventoría:
Yahara Maritza Viveros Ortiz

Supervisor UNGRD

Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Máquina para anclajes

ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra,



Interventoría
 Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Inicio: 15 DICIEMBRE DE 2020
 Terminación: 14 DE JUNIO DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de
1050 ml

| | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| PERSONAL EN OBRA Total Obra: 93 Total Projectado: 100 | Local 65 70% | Calificados 32 49% |
| | | No Calificados 33 51% |
| | Foráneo 28 30% | Calificados 26 93% |
| | | No Calificados 2 7% |



45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-977-2020
 Valor: \$ 30.418.456.852,86
 Nombre de Contratista:
 INGECON SA

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-1365-2020
 Valor: \$ 2.425.702.429,00
 Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER
 JARILLON 2020

Supervisor UNGRD
 Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE • Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Inicio: **12 DE FEBRERO DE 2021**
Terminación: **11 DE ABRIL DE 2022**

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

| | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 30 | Local 19 79% | Calificados 15 79% |
| | | No Calificados 4 21% |
| | Foráneo 5 21% | Calificados 5 100% |
| | | No Calificados 0 0% |



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1025-2020
Valor: \$4.302.041.377,00

Nombre de Contratista:
CONSORCIO RECUPERACIÓN
MOCOA LH 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD
Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Inicio: **12 DE FEBRERO DE 2021**
Terminación: **11 DE ABRIL DE 2022**

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

Estado Actual: No se registra avance físico de obra para esta semana toda vez que la misma está en trámite de suspensión desde el pasado **14/05/21**, fecha en la cual el contratista de obra solicita suspensión. Por lo anterior, los datos de avance registrados son los mismos de la semana anterior.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 30

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Local 10 83% | Calificados 10 100% |
| | No Calificados 0 0% |
| Foráneo 2 17% | Calificados 2 100% |
| | No Calificados 0 0% |



45.589
Personas beneficiadas



Condiciones en las cuales queda el río después de suspender actividades

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43



EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 08 DE MARZO DE 2021

Terminación: 07 DE SEPTIEMBRE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

Obra física:

Se avanza con la realización de las actas de vecindad y con la revisión de implantación de la estructura (Dique abierto 1) sobre terreno para ajustar dimensiones. Paralelamente se continua con el trabajo social en la zona.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26
Total Projectado: 35

Local 18
69%

Foráneo 8
31%

Calificados 14
78%

No Calificados 4
22%

Calificados 8
100%

No Calificados 0
0%



45.589
Personas beneficiadas



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1334-2020
Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre de Contratista:
CONSORCIO RIO MULATO.

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-141-2021
Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
RÍO MULATO.

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Inicio: 9 DE MARZO DE 2021
Terminación: 8 DE JULIO 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

| | | |
|---|-----------|------------------|
| PERSONAL EN OBRA Total Obra: 14 Total Projectado: 40 | Local 12 | Calificados 8 |
| | 86% | 67% |
| | | No Calificados 4 |
| | | 33% |
| | Foráneo 2 | Calificados 2 |
| 14% | 100% | No Calificados 0 |
| | | 0% |



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-988-2020
Valor: \$ 10.192.609.812,85

Nombre de Contratista:
CDF INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-116-2021
Valor: \$ \$ 823.179.153,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERDIQUE
2020

Supervisor UNGRD
Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Dique Abierto 3
- Muro 1
- Azud 05
- Muro 2
- Azud 04
- Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: **DIECIOCHO (18) MESES**

Inicio: **9 DE MARZO DE 2021**

Terminación: **8 DE SEPTIEMBRE 2022**

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

Estado Actual:

Se adelantan actividades para la gestión social, ambiental y de seguridad social. Se continua con la realización de las actas de vecindad, Se trabaja en la elaboración del Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 16
Total Projectado: 45

Local 12
75%

Foráneo 4
25%

Calificados 6
50%

No Calificados 6
50%

Calificados 4
100%

No Calificados
0%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-201-2021
Valor: \$ 11.334.163.511,06


Nombre de Contratista:
CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-344-2021
Valor: \$ 929.229.966,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO MUROS MOCOCA

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa

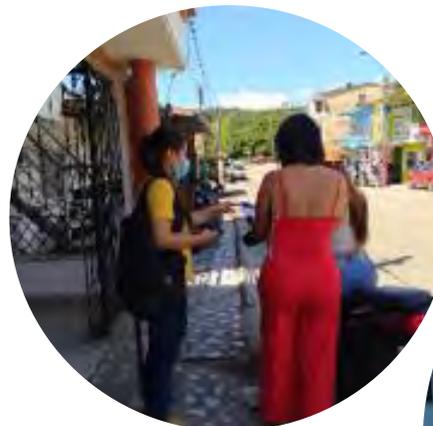

45.589
Personas beneficiadas



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: **DIECIOCHO (18) MESES**
Inicio: **12 DE MARZO DE 2021**
Terminación: **11 DE SEPTIEMBRE 2022**

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 35

Local 11
73%

Foráneo 4
27%

Calificados 9
82%

No Calificados 2
18%

Calificados 3
75%

No Calificados 1
25%

0,0%

Avance
Financiero

6,5%

Programado

7,1%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1388-2020
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre de Contratista:
CONSORCIO DIQUE 1

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 536.303.878,1967
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Movimiento de Tierra



Control Topográfico



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Inicio: 12 DE MARZO DE 2021
Terminación: 11 DE SEPTIEMBRE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Foráneo 10
48%

Calificados 6
60%

No Calificados 4
40%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre de Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOCA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: 508.303.365,8033
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Manejo de aguas



Excavaciones

ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
 – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: **DIECIOCHO (18) MESES**
 Inicio: 16 DE MARZO DE 2021
 Terminación: 15 DE SEPTIEMBRE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| PERSONAL EN OBRA Total Obra: 5 Total Projectado: 35 | Local: 3 60% | Calificados: 3 100% |
| | | No Calificados 0 0% |
| | Foráneo: 2 40% | Calificados : 2 100% |
| | | No Calificados 0 0% |



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1119-2020
 Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre de Contratista:
 A&A CONSULTORIA E
 INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-154-2021
 Valor: \$ 426.384.755,43
 (para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORES
 DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD
 Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOYA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 16 DE MARZO DE 2021

Terminación: 15 DE SEPTIEMBRE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón, azud y muros

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8

Total Projectado: 45

Local: 4
50%

Foráneo: 4
50%

Calificados: 4

100%

No Calificados 0

0%

Calificados : 3

75%

No Calificados 1

25%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1064-2020
Valor: \$ 15.407.631.114,68

Nombre de Contratista:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS
RIO SANGOYACO 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 1.244.010.656,57
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOYA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción MocoYA



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 28 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 27 DE OCTUBRE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

Estado Actual:

Actualmente la interventoría se encuentra en revisión de documentos y contrato de obra.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 61

Local 6
75%

Foráneo 2
25%

Calificados 3
50%

No Calificados 3
50%

Calificados 2
100%

No Calificados 0
0%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre de Contratista:
CONSORCIO DRAGADO MOCOA
2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERDRAGADOS
MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 03 DE MAYO DE 2021

Terminación: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25
Total Projectado: 37

Local: 12
48%

Foráneo: 13
52%

Calificados: 11
92%

No Calificados 1
8%

Calificados : 13
100%

No Calificados 0
0%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-311-2021
Valor: \$ 2.723.478.287,36

Nombre de Contratista:
CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-110-2021
Valor: \$ 219.807.563,26
(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mococho



45.589
Personas beneficiadas



ALCANCE

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 15 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 14 DE OCTUBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro protección

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 7

Total Projectado: 30

Local: 4

57%

Foráneo: 3

43%

Calificados: 4

100%

No Calificados 0

0%

Calificados : 2

67%

No Calificados 1

33%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1330-2020
Valor: \$ 1.938.876.092,45

Nombre de Contratista:
CONSORCIO OBRAS POR
COLOMBIA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-133-2021
Valor: \$ 157.336.269,67
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER – MOCOCA
2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 15 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 14 DE OCTUBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5
Total Projectado: 30

Local: 1
20%

Foráneo: 4
80%

Calificados: 1
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 4
100%

No Calificados 0
0%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-323-2021
Valor: \$ 6.202.006.626,11

Nombre de Contratista:
CONSORCIO EVI5

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-133-2021
Valor: \$ 503.281.561,33
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER – MOCOA
2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



45.589
Personas beneficiadas



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 8.991.999.385,27

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 23 DE MARZO DE 2021

Terminación: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

Estado Actual:

En elaboración de PMA, PMT, Plan de gestión social, cronograma de obra y permiso de protocolos de bioseguridad.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1342-2020
Valor: \$ 8.317.396.139,27

Nombre de Contratista:
CONSORCIO AZUD MOCOCHA 520

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-098-2021
Valor: \$ 674.603.246,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MUROS MOCOCHA 2020

Supervisor UNGRD
Ing. Brenda Karin Peña



Ubicación Azud 03



45.589

Personas beneficiadas



Mojones - Ubicación Dique azud 3
Quebrada Taruca



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 8.474.375.500,46



EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría

Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 6 DE MAYO DE 2021

Terminación: 6 DE NOVIEMBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de azud y muros

Estado Actual:

En elaboración de PMT, PMA, cronograma de obra, permisos de protocolos de bioseguridad, plan de gestión social.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-639-2021
Valor: \$ 7.841.500.569,72

Nombre de Contratista:
CONSORCIO

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-110-2021
Valor: \$ 632.874.930,74
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD
Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mococho

ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.



Ubicación Azud 5 Q. Taruca

45.589
Personas beneficiadas

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
 – MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: DOCE (12) MESES
 Contrato de interventoría
 Perfeccionado: 11 DE MAYO DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de Drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Se realizó reunión virtual el día **28/05/21** con el contratista de obra e interventoría, con el fin de realizar revisión de los estudios y diseños, se solicitó a Corpoamazonia la complementación de los estudios y diseños de las estructuras.

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-183-2021
 Valor: \$ 4.452.771.492,00

Nombre de Contratista:
 CONSTRUVAL
 INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-743-2021
 Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INGENIERÍA
 DE MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD


Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

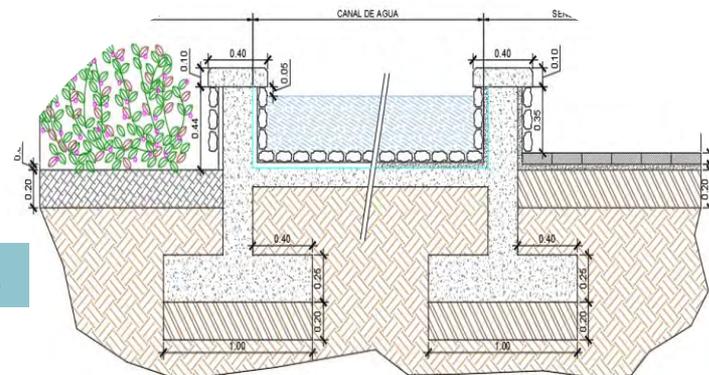

Detalles de las obras a ejecutar

Figura 4-4. Esquema canal.

1.2

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y
ALCANTARILLADO EN
EJECUCIÓN**

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto
\$ 8.840.532.147

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES
Inicio: 7 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 7 DE FEBRERO DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

Estado Actual:
Se realizó revisión y verificación de las ubicaciones de las vías indicadas en el objeto del contrato con las coordenadas registradas en la localización e informe de topografía del paquete técnico entregado por la Alcaldía de Mocoa.
Contratista de obra e interventoría se encuentran adelantando revisión de los documentos técnicos.
Pendiente por firmar acta de inicio por situación del paro nacional.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-366-2021
Valor: \$ 8.272.681.997

Nombre de Contratista:
CONSORCIO VIAS MOCOCA 040

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-555-2021
Valor: \$ 567.850.150

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER VIAS

Supervisor UNGRD
Ing. Natalia Cárdenas



Visitas e identificación de los tramos a intervenir

 **45.589**
Personas beneficiadas



 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: CUATRO (4) MESES

Inicio: 19 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 18 DE AGOSTO DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería
de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:

Se adelanta trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría.

En revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad.

El contratista adelanta actividades de construcción de campamento e implementación de protocolo de bioseguridad.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-378-2021
Valor: \$ 1.258.851.707

Nombre de Contratista:
JAVIER GUSTAVO OSPINA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.396.558

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

 **45.589**

Personas beneficiadas



Campamento de obra



ALCANCE

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario :

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaverál y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto



\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: SEIS (6) MESES
Inicio: 13 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 12 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2** sectores

Estado Actual:
No se ha dado inicio al contrato debido al desabastecimiento de materiales de construcción y combustible en el municipio de Mocoa a razón del PARO NACIONAL y PROTESTAS SOCIALES. Se adelanta por parte de interventoría revisión de estudios, diseños y presupuesto.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-399-2021
Valor: \$ 2.320.900.325

Nombre de Contratista:
CONSORCIO NOMADAS
PUTUMAYO

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 164.817.270

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Revisión sector a intervenir



45.589

Personas beneficiadas

✓ ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
- Barrio Piñayaco Z4 - 3.
- Barrio Piñayaco Z4 - 4.
- Barrio Peñón Z5 - 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 - 3.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto



\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: CINCO (5) MESES
Inicio: 27 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

Estado Actual:
Se adelanta trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría.
En revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad.



Tramos a intervenir



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-407-2021
Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre de Contratista:
ALEX ALBERTO CALVACHE
MENA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 72.268.367

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD
Eliana Montes Peña– Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404



EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: **SEIS (6) MESES**

Inicio: 7 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 7 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

Estado Actual:
No se ha dado inicio al contrato debido al desabastecimiento de materiales de construcción y combustible en el municipio de Mocoa a razón del PARO NACIONAL y PROTESTAS SOCIALES. Se adelanta por parte de interventoría revisión de estudios, diseños y presupuesto.



Revisión sector a intervenir

 **45.589**
Personas beneficiadas



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-492-2021
Valor: \$ 2.824.604.874

Nombre de Contratista:
CONSORCIO VIAS DE MOCOCA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 200.587.530

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311



EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: SEIS (6) MESES

Inicio: 19 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 18 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de 1 vía

Estado Actual:

Se adelanta trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría.

En revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad.

El contratista adelanta adecuación de sitios para acopio de materiales.

**Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-518-2021
Valor: \$ 1.206.210.066**

**Nombre de Contratista:
UNION TEMPORAL CAIMARON**

**Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 85.658.245**

**Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG**

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Sitios para acopio de materiales



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Inicio: 19 DE ABRIL DE 2021
Terminación: 18 DE DICIEMBRE DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación 8 VÍAS en 3 SECTORES

Estado Actual:

Se adelanta trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría.

En revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad.

Se adelantaron elaboración de actas de vecindad del barrio Villa Daniela.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-518-2021
Valor: \$ 2.696.280.960

Nombre de Contratista:
CONSORCIO ORC 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 191.474.688

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña– Reconstrucción Mocoa



45.589

Personas beneficiadas



Elaboración actas de vecindad



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7ª.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR
 – MUNICIPIO DE MOCOCHA**

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra**



**Plazo: SIETE (7) MESES
 Inicio: 26 DE ABRIL DE 2021
 Terminación: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de 1 vía

Estado Actual:

Se adelanta trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría.
 En revisión por parte de interventoría del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad.
 El contratista adelanta actividades de levantamiento topográficas.

**Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-636-2021
 Valor: \$ 1.253.593.696**

**Nombre de Contratista:
 CONSORCIO PAVIMENTOS
 CAPITAL**

**Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 89.085.329**

**Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER 5HG**

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña– Reconstrucción Mococho



45.589

Personas beneficiadas



Levantamiento topográfico



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
Obra



Plazo: **OCHO (8) MESES**
Inicio: **27 DE MAYO DE 2021**
Terminación: **26 DE ENERO DE 2022**

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES**
intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Revisión de Información técnica, planos localización y
detalles así mismo estudios y diseños.

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-532-2021
Valor: \$ 4.268.718.305

Nombre de Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS
MOCOCA


Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-774-2021
Valor: \$ 495.382.720

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERPAVIMENTOS EDUPAC



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7,
y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y
Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a
y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y
Cra 8

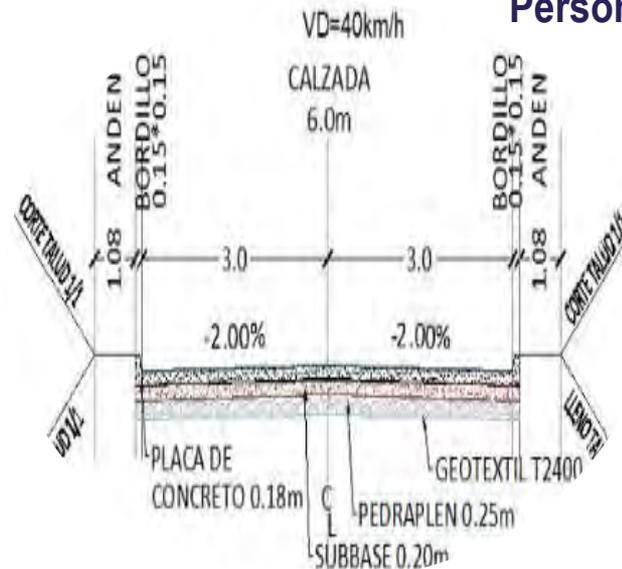

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR
 – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.959.956.,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 Obra



Plazo: CINCO (5) MESES
 Inicio: 27 DE MAYO DE 2021
 Terminación: 26 DE OCTUBRE DE 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervención de vías urbanas.

Estado Actual:

Revisión de Información técnica, planos localización y detalles así mismo estudios y diseños.

45.589


Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-549-2021
 Valor: \$1.830.025.649

Nombre de Contratista:
 CONSORCIO PAVIMENTOS
 MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 129.930.605,94

Para este contrato
 Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER 5HG

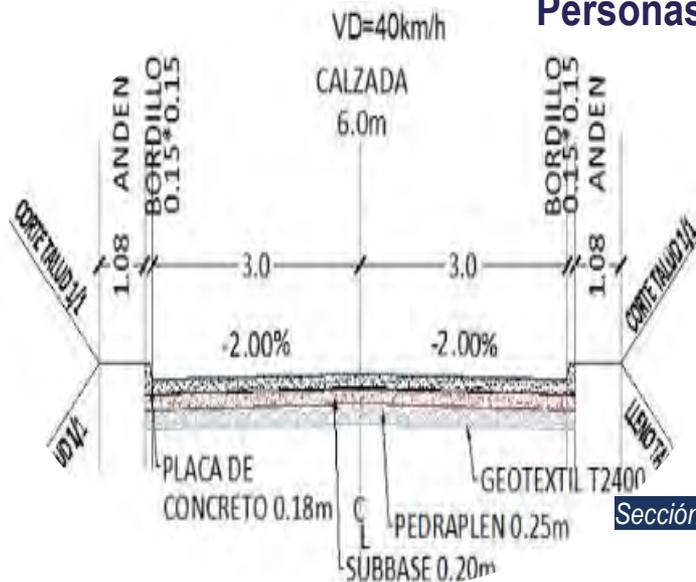

Sección Transversal Típica



ALCANCE

El cruce de vía nacional (Mocoa-Pitalito) entrada a la vereda nueva esperanza hasta finalizar en la abscisa k1+132,92 de la vereda nueva esperanza en el municipio de San Miguel de Agreda.

1.3

SEGUIMIENTO VÍAS Y ALCANTARILLADO

| | PROYECTO | VALOR OBRA | VALOR INTERVENTORÍA | ESTADO PROCESO |
|---|--|------------------|---------------------|---|
| 1 | Mejoramiento de la vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina. | \$ 2.435.104.449 | \$ 496.564.842 | SUBSANACIONES EN VERIFICACIÓN |
| 2 | Mejoramiento de vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la calle 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco. | \$ 6.241.228.546 | \$ 486.465.657 | MINUTA DE CONTRATO EN ELABORACIÓN (FIDUPREVISORA) |
| 3 | Mejoramiento de vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en el barrio chiparos, zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a) | \$ 1.282.970.234 | | CONTRATO PERFECCIONADO |
| | | | | INSTRUCCIÓN DE CONTRATO EN ELABORACIÓN |

 Obra
 Interventoría

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones

*Avance



30,05%

Avance financiero



0%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%



0%

total de
viviendas



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

*Avance estudios, diseños y construcción preliminares primera fase constructiva del proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$ 4.702 millones

Avance financiero

27%

CRONOGRAMA

FECHA DE
TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



519

909

PERSONAL
PROYECTADO



82

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Continúa movimiento de tierras 10.551,75 m3 de tierra.
- Impresión e instalación vallas del proyecto.
- Revisión comunicado CORPOAMAZONIA (Obra-Inter)
- Elaboración plan de choque cumplimiento cronograma de obra y terminación fase I diseños, por Consorcio.

| Personal | Local | Foráneo | Total |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| Calificado | 7 | 1 | 8 |
| No calificado | 16 | 0 | 16 |
| Total | 23 | 1 | 24 |



VIVIENDAS URBANAS



VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



VIVIENDA RURAL NUCLEADA



\$9.516'549.300 En convenio con **Banco Agrario**

\$15.436.450.700 Recursos faltantes

AVANCES

- Desglose cronograma General Ejecutivo de actividades.
- Continúa elaboración de documentos precontractuales para contratación persona jurídica/natural que formule, elabore estudios y diseños, tramite licencias y construya el proyecto de vivienda.
- Continúa elaboración de documentos precontractuales para contratación persona jurídica/natural que realice la Interventoría del proyecto de vivienda.
- Para el 03 de junio nuevamente se cita a comité de supervisión, FNGRD/FNV

AVANCES

- **Mocoa Nucleada:** Se recibió por parte de la alcaldía el día 26/05/21 en físico la documentación de los beneficiarios, la cual fue revisada por la **UNGRD** encontrándose inconsistencias en 82 beneficiarios y 44 sustituciones pendientes, se iniciará con fase 1 presentando la documentación de 91 beneficiarios al **BAC**, para primer aval técnico. Pendiente la remisión de certificación de disponibilidad de servicio de Acueducto y alcantarillado (Unidad de Planeación de la alcaldía). Se proyecta poder para designar al abogado que se encargará de realizar el desglose por parte de la Fiduprevisora. Se envía a SPIA oficio de solicitud de ajuste a los productos entregados en atención al cumplimiento de la NSR10, de acuerdo a lo establecido en el contrato y la revisión del **BAC**.
- **Mocoa Disperso:** Se trabaja en las últimas subsanaciones de los beneficiarios para obtener viabilidad técnica total antes de finalizar la presente semana. Se trabaja en la etapa precontractual con el fin de remitir lo pertinente al grupo de Gestión Contractual para revisión y apertura del proceso.

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: 11 .194 millones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
Asistencia técnica

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión



Inicio: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

Terminación : 11 DE JUNIO DE 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** Alumnos 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

\$ 11.194 millones

Estado Actual:

Proyecto suspendido del 12/05/21 al 12/06/21 por falta de materiales y problemas de orden nacional.



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018

Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre de Contratista:
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018

Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

Supervisor UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo



PROYECTO PLAZA DE MERCADO


INVERSIÓN
\$6.000.000,00*

*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.

PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56

AVANCES

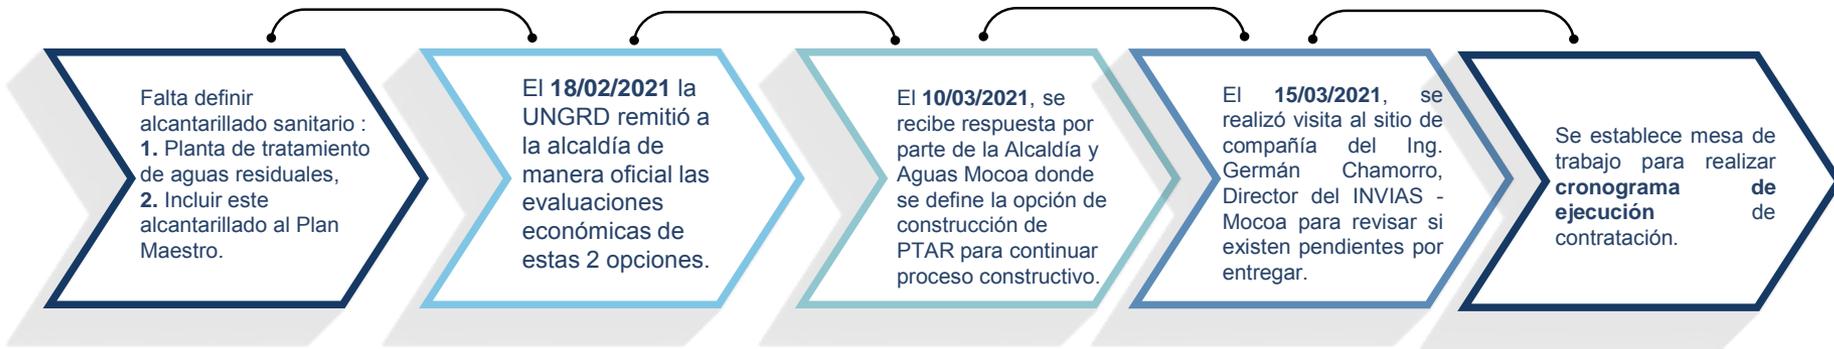

CRONOGRAMA



COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO



AVANCES



INVERSIÓN

\$ 1.257.921.000,00* lote

\$ 80.000.000.000,00 Construcción

* Estos recursos serán gestionados por el FNGRD para su adquisición.



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO

Reconstrucción del sistema de acueducto del municipio de Mocoa

CONTRATISTA

Mario Germán García García

INTERVENTOR

Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S

CONSULTOR

CDM Smith

VALOR TOTAL DEL CONVENIO

\$31.108 millones

PLAZO

Plazo inicial: 12 meses
Prórrogas: 5: 22 meses
Acta de inicio: 27/06/17
Suspensiones (3): 7 meses
Reinicio: 15/10/20
Terminación: 17/10/20

ALCANCE

- Construcción bocatoma.
- Construcción de desarenador de alta tasa y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.



ESTADO ACTUAL CONTRATO AGUAS MOCOCA

Actualmente se adelanta por parte de Aguas Mocoa S.A. E.S.P., la **expedición de las respectivas pólizas** que amparan el contrato y la revisión conjunta con la interventoría de las **hojas de vida, programación y APU's del contrato.**

Una vez avalados los anteriores documentos, se procederá con la **suscripción del acta de inicio** respectiva.

4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

| | | |
|---|-----------------------------------|------------|
|  | OBRAS EN EJECUCIÓN | 28 |
|  | EMPLEO GENERADO A LA FECHA | 353 |
|  | PERSONAL PROYECTADO | 802 |

| | 26/05/21 | 02/06/21 | | 26/05/21 | 02/06/21 |
|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|
| MANO DE OBRA LOCAL | 234 | 246 | MANO DE OBRA FORÁNEA | 107 | 107 |
| CALIFICADOS | 142 | 147 | CALIFICADOS | 91 | 91 |
| NO CALIFICADOS | 92 | 99 | NO CALIFICADOS | 16 | 16 |
| PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 69% | 70% | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 31% | 30% |

| | ACTUALES | PROYECTADOS TOTAL |
|----------------------|------------|-------------------|
| EMPLEOS INDIRECTOS | 635 | 1.444 |
| EMPLEOS INDUCIDOS | 141 | 321 |
| TOTAL EMPLEOS | 776 | 1.765 |

GRACIAS

