

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Julio 21 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

18 de obra

18

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones



Total de contratos

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

13 de obra

13

100%

4 de interventoría

4

100%

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
Fecha de finalización actualizada por suspensión:
12 - AGO – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 26	Local 24 100%	Calificados 14 58%
		No Calificados 10 42%
	Foráneo 0 0%	Calificados 0 0%
		No Calificados 0 0%



45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960
Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa	Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Reinicio Actividades obra, anclajes

ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
 Fecha de finalización actualizada: 14 - JUN - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA


Total Obra: 126
 Total Projectado: 140

Local 90 71%	Calificados 40 44%
	No Calificados 50 56%
Foráneo 36 29%	Calificados 28 78%
	No Calificados 8 22%



45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	

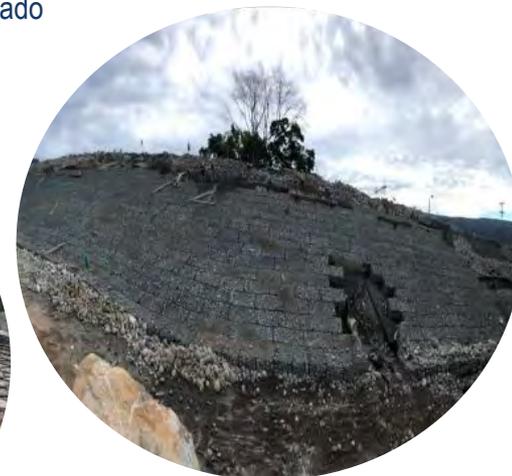

ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 27
Total Projectado: 32

Local 22 81%	Calificados 15 68%
	No Calificados 7 32%
Foráneo 5 19%	Calificados 5 100%
	No Calificados 0 0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOCA LH 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de colcho gaviones del muro No. 6



Suministro de triturado para la losa de concreto del muro n°6



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 17
Total Projectado: 20

Local 12
71%

Foráneo 5
29%

Calificados 7
58%

No Calificados 5
42%

Calificados 1
20%

No Calificados 4
80%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-980-2020 Valor: \$ 5.710.699.339,98 <hr/> Nombre del Contratista: HAROLD MUÑOZ MUÑOZ	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de gavión de muro 7



Excavación mecánica y suministro de materiales

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

Estado actual:

En elaboración de reprogramación de obra. Se está a la espera de la visita de HIDROCONSULTA S.A.S al sitio de ejecución de la obra.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26
 Total Projectado: 35

Local 18
69%

Foráneo 8
31%

Calificados 14
78%

No Calificados 4
22%

Calificados 8
100%

No Calificados 0
0%



45.589
 Personas beneficiadas



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1334-2020
 Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO RIO MULATO.

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-141-2021
 Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 RÍO MULATO

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
 Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 08 - JUL - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 14 Total Proyectado: 40	Local 12 86%	Calificados 8 67%
		No Calificados 4 33%
	Foráneo 2 14%	Calificados 2 100%
		No Calificados 0 0%



45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE**

- Dique Abierto 3
- Muro 1
- Azud 05
- Muro 2
- Azud 04
- Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 16 Total Projectado: 45	Local 12 75%	Calificados 6 50%
		No Calificados 6 50%
	Foráneo 4 25%	Calificados 4 100%
		No Calificados 0%



45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00 ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOA
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15

Total Projectado: 35

Local 11
73%

Foráneo 4
27%

Calificados 9

82%

No Calificados 2

18%

Calificados 3

75%

No Calificados 1

25%

0,0%

Avance
Financiero

7,79%

Programado

8,48%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1388-2020
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DIQUE 1

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 536.303.878,1967

(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



*Perfilación de terreno para
realización de solado*



Fundación de Solado.



ALCANCE

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%

Foráneo 10
48%

Calificados 6

55%

No Calificados 5

45%

Calificados 6

60%

No Calificados 4

40%

0,0%

Avance
Financiero

3,55%

Programado

9,70%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOCA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 508.303.365,8033
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Fundición dentellón



Fundición 1er tercio dentellón



ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020

Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5
Total Projectado: 35

Local: 3
60%

Foráneo: 2
40%

Calificados: 3
100%

No Calificados 0
0%

Calificados: 2
100%

No Calificados 0
0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.384.755,43

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOCHA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mococho



Seguimiento actividades ambientales



Control SST



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
 Total Projectado: 45

Local: 4
50%

Foráneo: 4
50%

Calificados: 4
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 3
75%

No Calificados 1
25%



45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68 <hr/> Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



Accesos Jarillón 02, Azud 12



Compra materiales Dique Azud 13



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

Estado Actual:

Está en formalización el documento para la constitución de servidumbre y autorización de paso para poder dar inicio a obra física.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 61

Local 6

75%

Calificados 3

50%

No Calificados 3

50%

Foráneo 2

25%

Calificados 2

100%

No Calificados 0

0%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO
MOCOA 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021

Fecha de finalización actualizada: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 27

Total Projectado: 37

Local: 11
41%

Foráneo: 16
59%

Calificados: 9
82%

No Calificados 2
18%

Calificados : 15
94%

No Calificados 1
6%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.478.287,36	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.807.563,26 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	



Conformación de material de protección ribera derecha



Construcción de campamento de obra.



ALCANCE • Azud 10, Sector Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones

CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12

Total Projectado: 30

Local: 6
50%

Foráneo: 6
50%

Calificados: 6
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 6
100%

No Calificados 0
0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Campamento



Excavación para cimentación



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 4
Total Projectado:30

Local: 0
0%

Foráneo: 4
100%

Calificados: 0
0%

No Calificados 0
0%

Calificados : 4
100%

No Calificados 0
0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Actas de vecindad



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

Fecha acta de inicio: Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

Estado Actual:
 Se encuentra en trámite de adquisición de pólizas para presentar a Fiduprevisora.

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.027	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100
Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOCA 520	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	

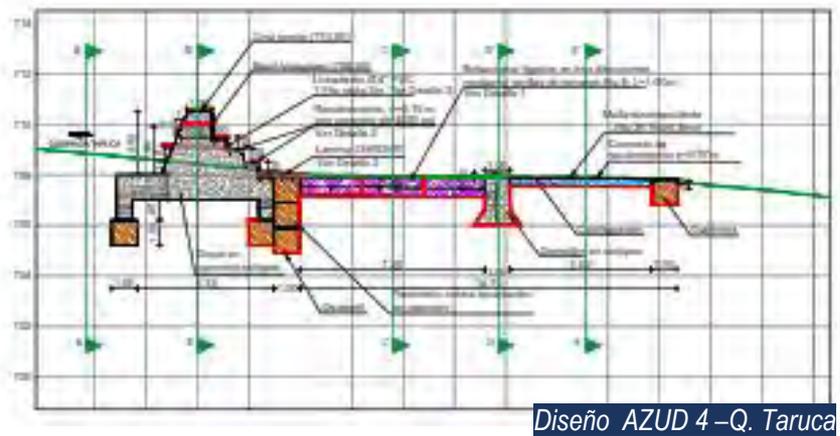

ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021
 Fecha acta de inicio: 15- JUL - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 14 - ENE - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

Estado Actual:

Visita de reconocimiento y localización topográfica obra e interventoría.



45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020
---	---

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa

Visitas de localización y reconocimiento.



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR – 2021

Fecha acta de inicio: Se está a la espera de aclaración con Corpoamazonía para dar inicio.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

En espera de respuesta por parte de Corpoamazonía sobre aclaración de los estudios y diseños entregados, a la fecha se han realizado 4 solicitudes formales.

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-183-2021
 Valor: \$ 4.452.771.492,00

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-743-2021
 Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre del Contratista:
 CONSTRUVAL
 INGENIERÍA S.A.S.

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INGENIERÍA DE
 MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD
 Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

45.589
 Personas beneficiadas



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.2

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y
ALCANTARILLADO EN
EJECUCIÓN**

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021

Fecha de finalización actualizada: 16 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local 5	Calificados 4
	45%	80%
		No Calificados 1
		20%
	Foráneo 6	Calificados 6
55%	100%	No Calificados 0
		0%



 **45.589**
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra</p> <p>No. 9677-PPAL001-366-2021</p> <p>Valor: \$ 8.272.681.997</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista:</p> <p>CONSORCIO VIAS MOCOA 040</p>	<p>Contrato de Interventoría</p> <p>No. 9677-PPAL001-555-2021</p> <p>Valor: \$ 567.850.150</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría:</p> <p>CONSORCIO INTER VIAS</p>
<p>Supervisor UNGRD</p> <p>Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



Actas de Vecindad Vda Pepino



Topografía B/San Andrés

 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES
Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



18 - OCT – 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:

El contratista reinició el **18/07/2021**, la interventoría adelanta revisión del PMA, plan de gestión social, plan SST, protocolo de bioseguridad y levantamiento topográfico, el contratista adelantó acopio de materiales en obra.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-378-2021
Valor: \$ 1.258.851.707

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.396.558

Nombre del Contratista:
JAVIER GUSTAVO OSPINA

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Llegada de material a obra

 **45.589**

Personas beneficiadas



ALCANCE

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021
Fecha de finalización : 18 – ENE – 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

Estado Actual:
Se suscribe acta de inicio el **19/07/2021**
Se envió oficio el **16/07/21** a la Unidad de Planeación,
Gestión y Evaluación municipal de Mocoa Putumayo
solicitando aclaración de algunos detalles de los diseños.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Tramos a intervenir

45.589
Personas beneficiadas

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



26 - OCT - 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 9
Total Projectado: 25

Local 7
78%

Foráneo 2
22%

Calificados 4

58%

No Calificados 3

42%

Calificados 2

100%

No Calificados 0

0%



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-407-2021
Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre del Contratista:
ALEX ALBERTO CALVACHE
MENA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 72.268.367

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Recorrido para movimiento de postes



Construcción de cámara de inspección red pluvial

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de finalización actualizada: 05 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

Estado Actual:

Se realizó socialización el **16/07/2021**, se han adelantado levantamiento de actas de vecindad, el **19/07/21** se realizó visita técnica con Planeación para verificación de líneas de paramentos.



Levantamiento actas de vecindad

 **45.589**

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOCA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Socialización con la comunidad

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.
- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:
18 - NOV - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 10
Total Projectado: 25

Local 9
90%

Foráneo 1
10%

Calificados 7
78%

No Calificados 2
22%

Calificados 1
100%

No Calificados 0
0%



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-518-2021
Valor: \$ 1.206.210.066

Nombre del Contratista:
UNION TEMPORAL
CAIMARON

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 85.658.245

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Cajeo para instalación de tubería 12" red pluvial



Cajeo de la vía, instalación de geotextil y pedraplén

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión:
18 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

Estado Actual:

Se realizó reunión con la Alcaldía, Aguas Mocoa, PMAMO, para revisar temas pendientes de los tramos de a intervenir, el contratista adecua terreno para instalación de campamento y puntos de acopio de materiales.



Instalación de cerramiento, adecuación de terreno para campamento y puntos de acopios de materiales

 **45.589**

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-554-2021
Valor: \$ 2.696.280.960

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 191.474.688

Nombre del Contratista:
CONSORCIO ORC 2020

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Reunión con Alcaldía, Aguas Mocoa y PMAMO

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



09 - ENE - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 11
Total Projectado: 25

Local 11
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 7

64%

No Calificados 4

36%

Calificados 0

0%

No Calificados 0

0%



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.329
Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Instalación de tubería 12" para red pluvia



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
 Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
 Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
 Fecha de Finalización: 07 – MAR -2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Acta de inicio firmada el **08/07/2021**.
 Se adelantó elaboración de PMT y protocolos de bioseguridad ante la Alcaldía.



Localización de Obra Barrio
 Quinta Paredes

45.589

Personas beneficiadas



Localización sector Ciudadela

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-532-2021
 Valor: \$ 4.268.718.305

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-774-2021
 Valor: \$ 495.382.720

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO PAVIMENTOS
 MOCOCA

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO
 INTERPAVIMENTOS EDUPAC

Supervisor UNGRD
 Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión:
05 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Se realizó socialización con la comunidad el **12/07/2021**, interventoría adelanta revisión del PMA, plan de gestión social, plan SST, protocolo de bioseguridad, se adelanta levantamiento de actas de vecindad.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-549-2021
Valor: \$1.830.025.649

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS
MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 130.312.324

(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Socialización con la comunidad

 **45.589**

Personas beneficiadas



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.
Aguas Mocoa adelanta intervenciones de la red de acueducto antes del inicio de las obras de pavimento.



Intervenciones de Aguas Mocoa previas al inicio del contrato de pavimentación

 **45.589**

Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166 ----- Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto. Se han tenido reuniones con Alcaldía y Aguas Mocoa.



Estado inicial de la vía a intervenir

45.589

Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897	Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.435.104.449

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
 Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
 Fecha acta de inicio: 30 – JUL -2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Revisión técnica de diseños, verificación de coordenadas y localización de los sectores a pavimentar. Elaboración de PMA, PMT, PGS.

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1113-2021
 Valor: \$ 2.435.104.449

Nombre del Contratista:
 MEGACONSTRUCCIONES
 S.A.S

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-774-2021
 Valor: \$ 495.382.720

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO
 INTERPAVIMENTOS EDUPAC



Localización urbanización Quintas de la Colina



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones

*Avance



30,15%

Avance financiero



0%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%



0%

total de
viviendas



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

Avance estudios, diseños, construcción preliminares primera fase constructiva del proyecto. Seguimiento compromisos Comité General de Obra 7/7/21. Citación a Contratista posible incumplimiento fase I, 23/07/2021.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$7.049.420.065

Avance financiero

20,05%

CRONOGRAMA

FECHA DE
TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



519

909

PERSONAL
PROYECTADO



82

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Continúa movimiento de tierras 18.461,6 m3 de tierra (incluido expansión).
- En revisión por Alcaldía concepto emitido por CORPOAMAZÓNÍA.
- A la espera de adoptar Programación de Obra definitiva.
- Gerente del Proyecto, Director de Obra, Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente Social vinculados.
- Llegada a la obra tubería de alcantarillado fluvial y sanitario para primera fase constructiva.
- Terraceo primera fase constructiva.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	3	2	5
No calificado	13	0	13
Total	16	2	18





N° DE VIVIENDAS



87

INVERSIÓN



5.764 millones

valor otorgado por FONVIVIENDA a través del Convenio No. 9677-PPAL001-783-2018



AVANCES

- Elaboración de Documentos para contratación derivada Convenio 783. Fue trasladada la documentación e información a la Subdirección General UNGRD. En revisión.

Derivado de obra

- Justificación Contratación Obra
- Anexo Técnico
- F1 Formatos del 1 al 6B
- F2 Formatos Excel 8-10
- F3 Formato 11

Derivado de interventoría

- Justificación Contratación Interventoría
- Metodología y Plan de Cargas
- F1 Formatos del 1 al 6B
- F2 Formatos Excel 7-10
- F3 Formato 11
- Presupuesto oficial interventoría.





AVANCES

VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO

N° DE VIVIENDAS



37

INVERSIÓN



\$3.850.882.740,00

VIVIENDA RURAL NUCLEADA

N° DE VIVIENDAS



215

Urbanismo **6.453 mill**
 Vivienda **13.500 mill**
 PTAR: **1.500 mill**
 Subestación eléctrica: **3.500 mill**

INVERSIÓN



Total: **\$ 24.953 millones**

\$9.516.549.300 En convenio con **Banco**

\$15.436.450.700 Recursos faltantes

- **Mocoa Disperso:** Se publicó en el SECOB la primera fase del proceso - presentación de cotizaciones (<https://bit.ly/3rmjilr>) que finaliza el 23/07/21 para la publicación de la segunda fase del proceso en SECOP del pliego del proceso (2 meses para adjudicación).

- **Mocoa Nucleada:** En atención a requerimiento del **BAC**, se realizó la reorganización y envío de 68 postulaciones de vivienda rural nucleada y de 14 casos de solicitudes de sustitución de beneficiarios de vivienda rural nucleada. Se envió al **BAC** base de datos de 208 postulados para cruce de información, con el fin de verificar duplicidad de subsidios. Como resultado se encontró que 172 postulados ya han recibido subsidios (82%) y 36 postulados (17%) son aptos para recibir el subsidio del BAC, los cuales corresponden a 32 postulados que ingresaron por proceso de sustitución y 4 postulados presentan inconsistencia en número de documento y/o nombres apellidos en la base de datos de Banco Agrario. Se solicita al **BAC** realizar el ajuste correspondiente en su base de datos, suministrando las copias de cédula de estos jefes de hogar.

El proceso de desenglobe avanza, se encuentran en proceso de escritura de parcelación, trámite necesario para que cada uno de los proyectos que se encuentran dentro de la licencia de parcelación se genere con una matrícula inmobiliaria independiente; el día de hoy **21/07/21** el apoderado de Fiduprevisora viaja para firmar las escrituras y realizar el proceso de registro; con esto se puede proceder a realizar la escrituración del CDI y el proceso de sesión a título gratuito de cada uno de los predios.



3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



12 - SEP - 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado Actual:

Se está en trámite de prórroga por 3 meses más para poder terminar esta fase contractual del proyecto, por lo tanto el proyecto tendrá reprogramación de obra.



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-225-2018 Valor: \$ 10.462.078.032,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-228-2018 Valor: \$732.329.530,00
Nombre del Contratista: Consorcio Colegio Mocoa	Nombre de la Interventoría: INGEVAL S.A.S.
Supervisor UNGRD Yineth Arinda Cumplido Botello – Subdirección para la Reducción del Riesgo	



PROYECTO PLAZA DE MERCADO

INVERSIÓN
\$6.000.000,00*

*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.




PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56



AVANCES

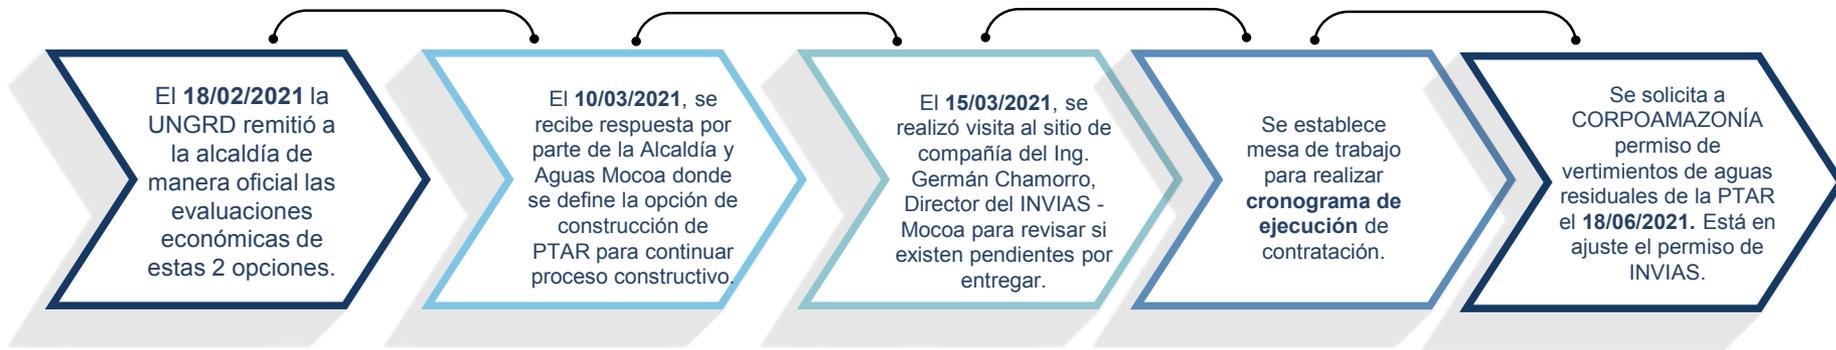

CRONOGRAMA



COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO



AVANCES



INVERSIÓN

\$ 1.310.921.000* lote

\$ 80.000.000.000,00 Construcción

* Estos recursos serán gestionados por el FNGRD para su adquisición.



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12
ESTADO	Terminado



ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente 107 l/s.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% AVANCE PROGRAMADO	3%
% AVANCE EJECUTADO	2%
ESTADO	En ejecución



4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

	OBRAS EN EJECUCIÓN	32
	EMPLEO GENERADO A LA FECHA	409
	PERSONAL PROYECTADO	918

	14/07/21	21/07/21		14/07/21	21/07/21
MANO DE OBRA LOCAL	264	290	MANO DE OBRA FORÁNEA	110	119
CALIFICADOS	140	169	CALIFICADOS	92	100
NO CALIFICADOS	124	121	NO CALIFICADOS	18	19
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	71%	71%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	29%	29%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	736	1.652
EMPLEOS INDUCIDOS	164	367
TOTAL EMPLEOS	900	2.019

GRACIAS

