

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Febrero 22 de 2022



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento ejecución
18 de obra	18	100%
13 de interventoría	13	100%
Estamos ejecutando 57 intervenciones en total		

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$43.778 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento ejecución
13 de obra	13	100%
4 de interventoría	4	100%

1.1

PROYECTOS FINALIZADOS

CONSTRUCCIÓN MURO DE ESTABILIZACIÓN BARRIO MODELO.

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Proyecto finalizado

Obras de control de protección y/o estabilización

En **desarrollo del proyecto** se construyeron 2569,88 m2 de pantallas ancladas para la mitigación, estabilización y consolidación de los taludes aferentes al hospital psiquiátrico San Camilo, barrio Villa del Prado.
 Empleos Generados: **26**

Contrato de Obra
 No. 063 del 2019
 Valor: \$ 3.841.235.901

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-261-2019
 Valor: \$ 360.589.960

Nombre del Contratista:
 Virgilio Bravo Sosa

Nombre de la Interventoría:
 Yahara Maritza Viveros Ortiz

Antes

INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 4.201.825.861,00

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589 

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
 Fecha de terminación: 28- DIC- 2021
 Avance financiero: 35%
 Avance físico: 100%



Proyecto finalizado

Obras de Pavimentación

En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 349 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes y una longitud de 436,7 metros lineales de alcantarillado pluvial.

Empleos Generados: **38**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-407-2021

Valor: \$ 1.017.658.395

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 72.268.367

Nombre del Contratista:

CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG.

Antes

INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 1.089.926.762

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589 

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 27 - ABR - 2021
 Fecha de terminación: 18- ENE- 2022
 Avance financiero: 49,41%
 Avance físico: 100%

Obras de Pavimentación



En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 318,65 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes.

Empleos Generados: **40**

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-518-2021
 Valor: \$ 1.206.210.066

Nombre del Contratista:
 UNIÓN TEMPORAL CAIMARON

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 85.658.245

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER 5HG.

INVERSIÓN
 Valor total del proyecto
\$ 1.291.868.311

POBLACIÓN BENEFICIADA
45.589

ESTADO TERMINADO
 Fecha acta de inicio: 19 - ABR - 2021
 Fecha de terminación: 18- NOV- 2022
 Avance financiero: 90%
 Avance físico: 100%

1.2

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.844.159.281,86	21,74%	32,47%	\$ 10.664.498.518,82	83,80%	\$ 27.523.405.478,20	+51,33%
3	\$ 4.706.751.939,00	11,96%	40,00%	\$ 1.882.700.775,60	32,56%	\$ 1.532.518.431,34	-7,44%
4	\$ 6.115.409.901,98	0%	46,95%	\$ 2.871.184.948,98	41,31%	\$ 2.526.275.830,51	-5,64%
5	\$ 7.488.477.539,43	6,22%	24,19%	\$ 1.811.462.716,79	20,50%	\$ 1.535.137.895,58	-3,69%
6	\$ 11.015.788.965,85	20,83%	35,08%	\$ 3.864.338.769,22	33,01%	\$ 3.636.311.937,63	-2,07%
7	\$ 12.263.393.477,06	20,67%	29,66%	\$ 3.637.322.505,30	24,94%	\$ 3.058.490.333,18	-4,72%
8	\$ 7.204.019.704,53	35,40%	46,11%	\$ 3.321.773.485,76	45,44%	\$ 3.273.506.553,74	-0,67%
9	\$ 6.827.896.668,28	36,37%	45,33%	\$ 3.095.085.559,73	43,39%	\$ 2.962.624.364,37	-1,94%
10	\$ 5.707.351.594,38	20,00%	48,77%	\$ 2.783.475.372,58	52,20%	\$ 2.979.237.532,27	3,43%
11	\$ 16.651.641.771,25	15,00%	35,44%	\$ 5.901.341.843,73	47,48%	\$ 7.906.199.512,99	12,04%
12	\$ 26.536.775.722,39	25,79%	32,34%	\$ 8.581.993.268,62	36,94%	\$ 9.802.684.951,85	4,60%
13	\$ 2.943.285.850,62	19,19%	61,68%	\$ 1.815.418.712,66	47,23%	\$ 1.390.113.907,25	-14,45%
14	\$ 2.096.212.362,12	0%	27,84%	\$ 576.039.157,11	10,42%	\$ 218.425.328,13	-17,06%
15	\$ 6.705.288.187,44	0%	1,02%	\$ 68.393.939,51	0,32%	\$ 21.456.922,20	-0,70%
16	\$ 8.981.109.127,00	0%	0,95%	\$ 85.320.536,71	0,95%	\$ 85.320.536,71	0,00%
17	\$ 8.470.387.014,00	0%	25,18%	\$ 2.132.843.450,13	9,88%	\$ 836.874.236,98	-15,30%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	2,01%	\$ 96.807.393,56	1,02%	\$ 49.126.140,02	-0,99%
TOTAL	\$ 171.374.237.344,19			\$ 53.190.000.954,81		\$ 69.337.709.892,93	
				31,03%		40,46%	

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
Fecha de terminación: 14 - JUN - 2022
Fecha de Inicio suspensión: 24-DIC-2021



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

Estado Actual:

El 20 de diciembre del 2021 se radicó trámite de suspensión del contrato de obra e interventoría, por un tiempo de 4 meses.

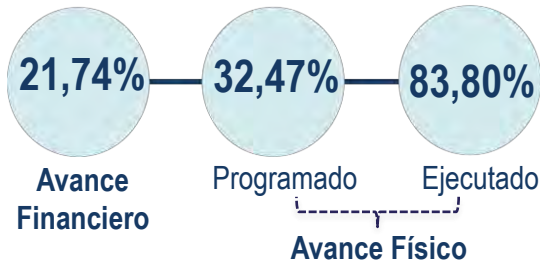

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-977-2020
Valor: \$ 30.418.456.852,86

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-1365-2020
Valor: \$ 2.425.702.429,00

Nombre del Contratista:
INGECON SA

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER JARILLON 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará 4 intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA Total Obra:28 Total Proyectado:30	Local: 23 82%	Calificados: 9 39%
		No Calificados: 14 61%
	Foráneo: 5 18%	Calificados: 5 100%
		No Calificados: 0 0%

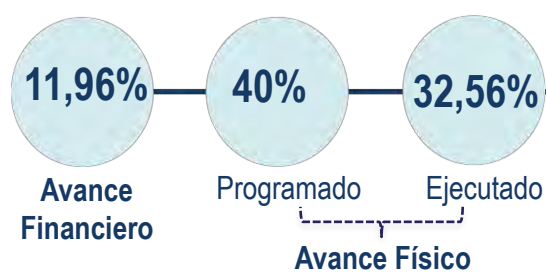

 **45.589**
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOCA LH 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



 **ALCANCE**

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
 Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
 Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
 Total Projectado: 25

Local: 16
84%


Foráneo: 3
16%

Calificados: 5
31%

No Calificados: 11
69%

Calificados: 3
100%

No Calificados: 0
0%

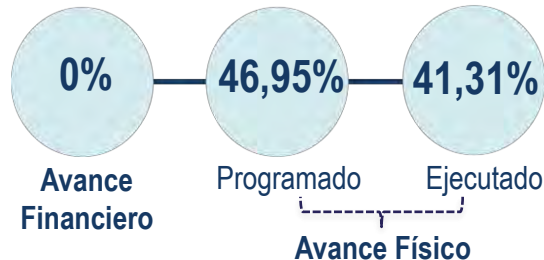

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-980-2020
 Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre del Contratista:
 HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-139-2020
 Valor: \$ 404.710.562,00
 (valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD
 Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



Fundición de Azud



ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 30 Total Projectado: 35	Local: 22 73%	Calificados: 14 64%
		No Calificados: 8 36%
	Foráneo: 8 27%	Calificados: 8 100%
		No Calificados: 0 0%

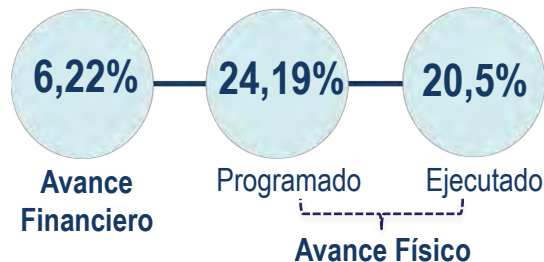

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.924.254.899,43	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 564.222.640,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO MULATO.	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Vaciado de concreto del dique 2 y se continua con el armado de acero en módulos



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

6 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO 1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local: 30 79%	Calificados: 14 47%
		No Calificados: 16 53%
	Foráneo: 8 21%	Calificados: 8 100%
		No Calificados: 0 0%

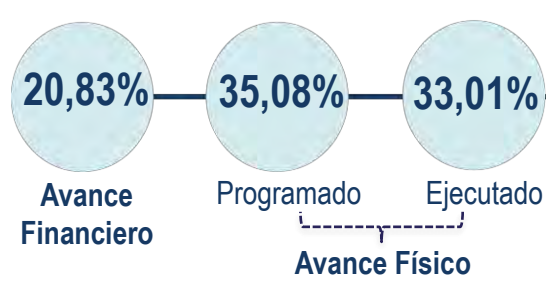


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Revestimiento de colchogavión en muro 1



Armado de acero en la zarpa del dique 3 abierto

-  **ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 22
Total Projectado: 45

Local: 18
82%


Foráneo: 4
18%

Calificados: 6
33%

No Calificados: 12
67%

Calificados: 4
100%

No Calificados: 0
0%

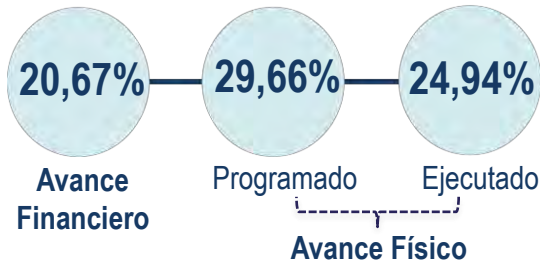

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOA</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Vaciado de concreto dentellón pata de elefante, Azud 12



Gaviones de cimentación muro 4



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención **CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 25 Total Proyectado: 35	Local: 18 72%	Calificados: 7 39%
		No Calificados: 11 61%
	Foráneo: 7 28%	Calificados: 5 71%
		No Calificados: 2 29%

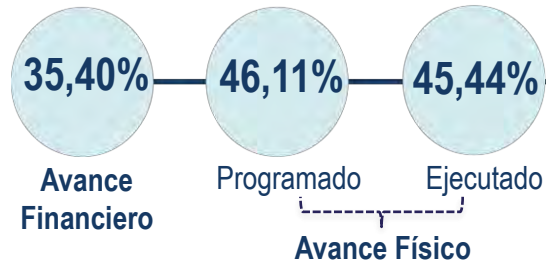


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE** • Dique Abierto 1 - Q. Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Proyectado: 35

Local: 11
52%


Foráneo: 10
48%

Calificados: 6
55%

No Calificados: 5
45%

Calificados: 6
60%

No Calificados: 4
40%

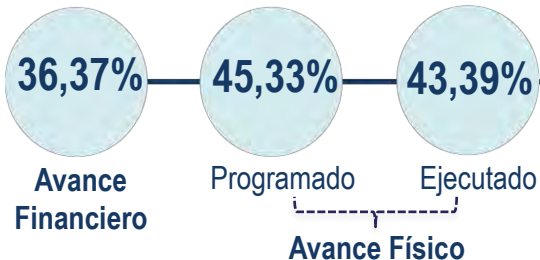

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOCA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 508.303.365,8033
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Desencofrado aleta izquierda



Fundición tabique



ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
Total Projectado: 35

Local: 14
74%


Foráneo: 5
26%

Calificados: 6
43%

No Calificados: 8
57%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

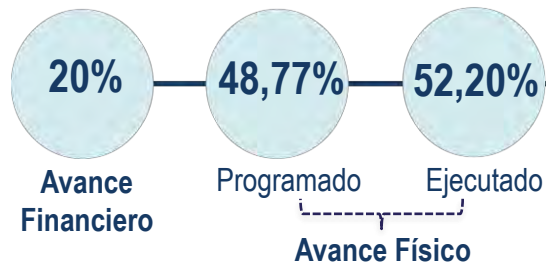

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.384.755,43
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORES DDA
MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Articulación de PMT de Obra con PMT del Plan Maestro de Alcantarillado Dique 11



Fundida Protección lateral Izquierda Dique 11



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 52 Total Projectado: 45	Local: 32 62%	Calificados: 6 19%
		No Calificados: 26 81%
	Foráneo: 20 38%	Calificados: 8 40%
		No Calificados: 12 60%

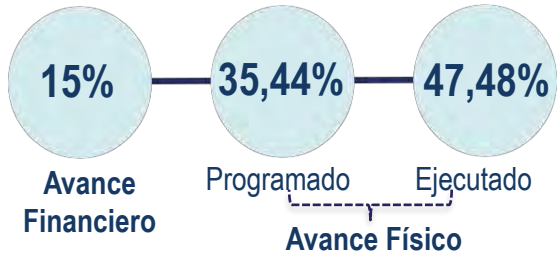

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato)
Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RÍO SANGOYACO 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



- ✓ ALCANCE**
- Jarillón 02 (200 m)
 - Azud 12
 - Muro 06
 - Azud 13
 - Azud 14
 - Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 61

Total Projectado: 61

Local: 47
77%


Foráneo: 14
23%

Calificados: 21
45%

No Calificados: 26
55%

Calificados: 12
86%

No Calificados: 2
14%

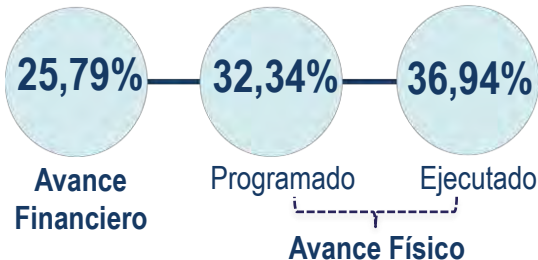

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO
MOCOCA 2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



Conformación de colchogavión y arena



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 09 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 03 – MAY – 2021
Fecha de terminación: 02 – NOV – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 38

Total Projectado: 37

Local: 19
50%


Foráneo: 19
50%

Calificados: 11
58%

No Calificados: 8
42%

Calificados: 18
95%

No Calificados: 1
5%

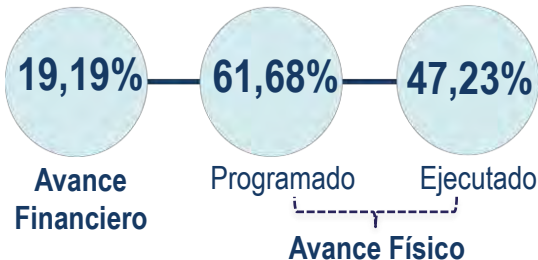

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.478.287,36</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.807.563,26 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición de zarpa y dentellones de cimentación
Segundo tercio Azud 10- Río Sangoyaco..



ALCANCE

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones

CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 30

Local: 10
67%

Foráneo: 5
33%

Calificados: 10
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

27,84%

Programado

10,42%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1330-2020
Valor: \$ 1.938.876.092,45

Nombre del Contratista:
CONSORCIO OBRAS POR
COLOMBIA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-133-2021
Valor: \$ 157.336.269,67
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER – MOCOCA
2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



Evacuación de aguas Dentellón Azud 15



Relleno de Piso Azud 15



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021
 Fecha acta de reinicio: 19 – OCT - 2021
 Fecha de terminación actualizada: 14 - MAR – 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5
 Total Projectado: 30

Local: 0
0%


Foráneo: 5
100%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

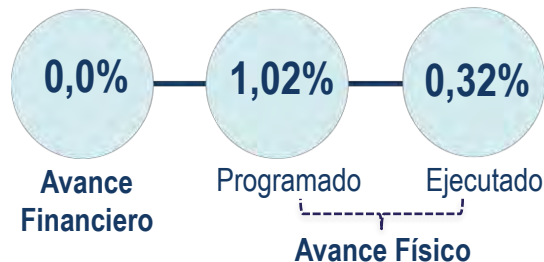

45.589
 Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021
Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021
Fecha de terminación: 10 - MAY -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 37

Local: 13
87%


Foráneo: 2
13%

Calificados: 9
69%

No Calificados: 4
31%

Calificados: 2
100%

No Calificados: 0
0%

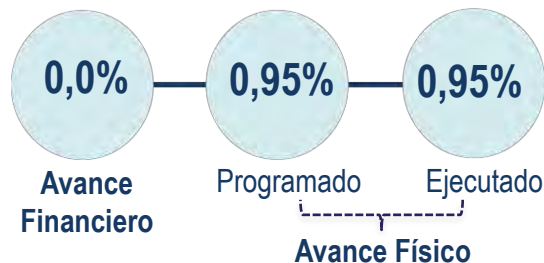

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1342-2020
Valor: \$ 8.307.462.027

Nombre del Contratista:
CONSORCIO AZUD
MOCOA 520

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-098-2021
Valor: \$ 673.647.100

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORIA MUROS
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



Verificación topográfica Aud 3 y 4 . –
Almacenamiento de mallas para gaviones



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 40

Local: 7
58%

Foráneo: 5
42%

Calificados: 7

100%

No Calificados: 0


0%

Calificados: 5

100%

No Calificados: 0

0%

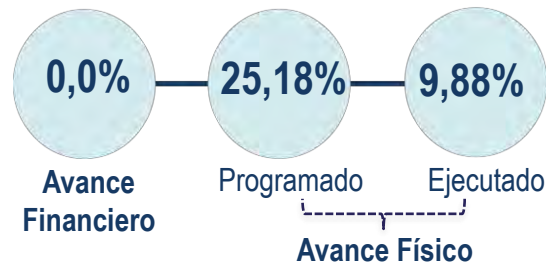

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Gaviones Azud 6-Q taruca.



Excavaciones Azud 05 – Q. Taruca.



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES
 Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 05- ENE – 2022
 Fecha de terminación: 05 - ENE - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Se aprueba enrocado y la interventoría revisa diseño presentado para evaluación.



45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-183-2021 Valor: \$ 4.452.771.492,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-743-2021 Valor: \$ 363.516.745,00
Nombre del Contratista: CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.3

SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$10.716.744.930,19	0,00%	68,31%	\$ 7.320.608.461,81	45,00%	\$ 4.822.535.218,58	-23,31%
2	\$1.348.270.441,00	89,01%	100,00%	\$ 1.348.270.441,00	100%	\$ 1.348.270.441,00	Finalizado*
3	\$2.561.992.020,00	0,00%	78,55%	\$ 2.012.444.731,71	62,01%	\$ 1.588.691.251,60	-16,54%
4	\$1.089.926.762,00	49,41%	100,00%	\$ 1.089.926.762,00	100%	\$ 1.089.926.762,00	Finalizado*
5	\$3.648.087.137,12	0,00%	100,00%	\$ 3.648.087.137,12	100%	\$ 3.648.087.137,12	Finalizado*
6	\$1.291.868.311,00	90,00%	100,00%	\$ 1.291.868.311,00	100%	\$ 1.291.868.311,00	Finalizado*
7	\$2.887.755.648,00	0,00%	32,99%	\$ 952.670.588,28	20,70%	\$ 597.765.419,14	-12,29%
8	\$1.492.702.508,00	69,75%	92,93%	\$ 1.387.168.440,68	82,09%	\$ 1.225.359.488,82	-10,84%
9	\$4.979.678.330,00	17,84%	57,84%	\$ 2.880.245.946,07	32,11%	\$ 1.598.974.711,76	-25,73%
10	\$1.960.337.973,00	38,37%	73,45%	\$ 1.439.868.241,17	69,30%	\$ 1.358.514.215,29	-4,15%
11	\$1.365.747.660,00	0,00%	22,09%	\$ 301.693.658,09	22,47%	\$ 306.883.499,20	+ 0,38%
12	\$6.644.038.095,94	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$3.791.334.750,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL	\$43.778.484.566,25			\$ 23.672.852.718,93		\$ 18.876.876.45,51	
				54,07%		43,11%	

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 10.716.744.930,19

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021
Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local: 5 45%	Calificados: 4 80%
		No Calificados: 1 20%
	Foráneo: 6 55%	Calificados: 6 100%
		No Calificados: 0 0%

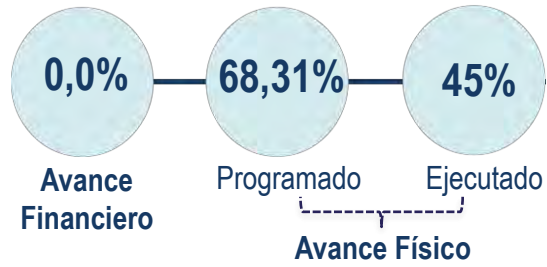

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 9.978.894.780	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 737.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Excavación para alcantarillado

 **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.
 - Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
 - Barrio Primero de Enero.
 - Barrio Venecia.
 - Barrio Obrero II Etapa.
 - Barrio San Andrés.
 - Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 18 - ENE – 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:
 Obra finalizada el 18/01/2022



45.589
 Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558</p>
<p>Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	



Canalización de aguas lluvias



Fundición de placa

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaverál y Prado Norte.

ALCANCE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$2.561.992.020,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 18 – ABR – 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 8 Total Projectado: 25	Local 8 100%	Calificados 5 62.5%
		No Calificados 3 37.5%
	Foráneo 0 0%	Calificados 0 0%
		No Calificados 0 0%

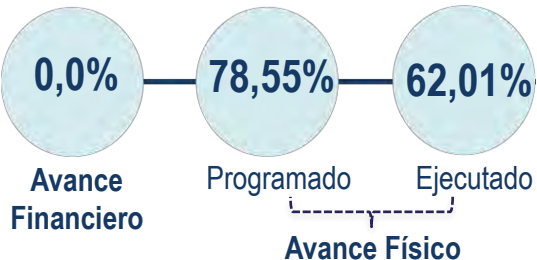


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.397.174.750	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	




ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 3.648.087.137,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**




Estado Actual:
Obra finalizada el 05/01/2022

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 3.447.499.607,12</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	



 **45.589**
Personas beneficiadas

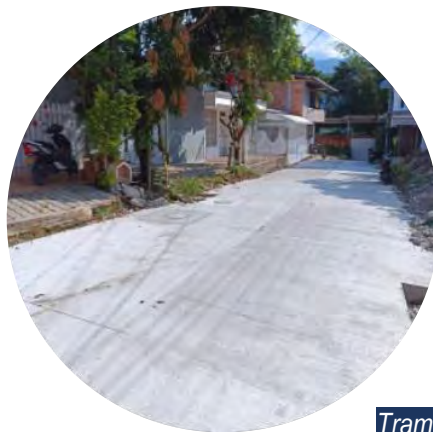

Tramos IV y VI



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización: 18 - MAY - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 23 Total Projectado: 25	Local: 22	Calificados: 3
	96%	14%
		No Calificados: 19
		86%
	Foráneo: 1	Calificados: 1
	4%	100%
		No Calificados: 0
		0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
 - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.492.702.508,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021

Fecha de finalización: 09 - MAR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 12 Total Proyectado: 25	Local: 12 100%	Calificados: 5 42%
		No Calificados: 7 58%
	Foráneo: 0 0%	Calificados: 0 0%
		No Calificados: 0 0%

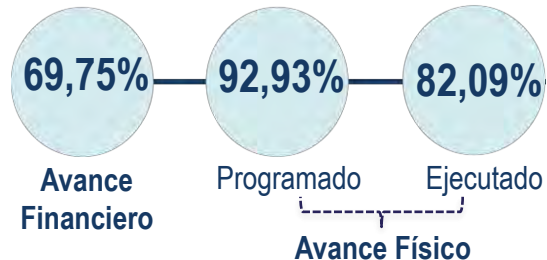

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.403.617.179	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.329
Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.979.678.330,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 07 – JUN -2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 37

Local: 27
90%

Foráneo: 3
10%

Calificados: 15

56%

No Calificados: 12


44%

Calificados: 3

100%

No Calificados: 0

0%

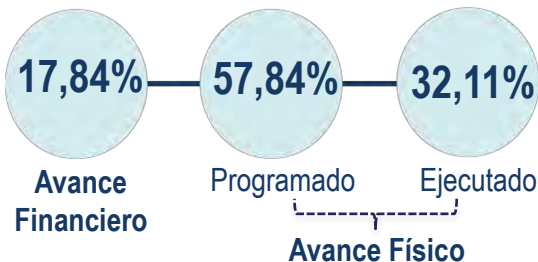

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.484.295.610</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición tramo 9 Quinta paredes



Instalación sub-base tramo 2 Quinta paredes



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de finalización actualizada: 03 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20

Total Projectado: 37

Local: 18
90%

Foráneo: 2
10%

Calificados: 4

22%

No Calificados: 14


78%

Calificados: 2

100%

No Calificados: 0

0%

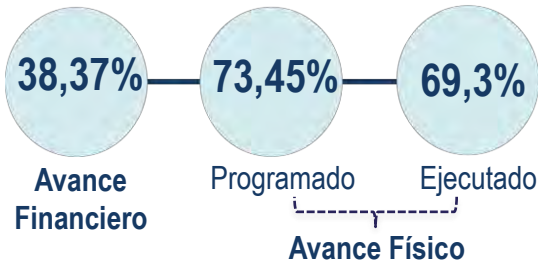

45.589

Personas beneficiadas



Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-549-2021

Valor: \$1.830.025.649

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS

MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 130.312.324

(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Santacruz Castro– Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021
Fecha de terminación: 16 - AGO - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25
Total Projectado: 20

Local: 18
72%

Foráneo: 7
28%

Calificados: 11
61%

No Calificados: 7
39%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-550-2021
Valor: \$ 1.282.799.166

Nombre del Contratista:
DIEGO DAVID
MELO CAMPIÑO

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-969-2021
Valor: \$ 82.948.494
(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERVENTORIA
PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD
Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



Vaciado de concreto para muros de sumidero de cámara No. 3

ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

La UNGRD ya dio los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario, en trámite para incorporarlos al contrato de obra y en aprobación ante la Alcaldía de Mocoa el ajuste del proyecto.

45.589

Personas beneficiadas



Toma de topografía



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897</p>	<p>Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$3.791.334.750,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
Fecha acta de inicio: Pendiente



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Ajustes radicados por contratista de obra el día 14/02/2022. En revisión de interventoría.

 **45.589**
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 3.295.952.030</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II

TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

NO. VIVIENDAS	CONTRATISTA	VALOR (Millones)	VALOR ADICIONAL FEBRERO 2022	*AVANCE	AVANCE FINANCIERO
436	CONSORCIO MOCOA 2019	\$25.731.568.960,00	\$ 17.868.431.040,00	33,29%	20%
473	CONSORCIO MOCOA 2019	\$27.915.211.280,00	\$ 19.384.788.720,00	30,89%	20%
		\$ 53.646.780.240,00	\$ 37.253.219.760,00		
TOTAL DE VIVIENDAS	909	VALOR TOTAL	\$ 90.900.000.000,00		

Estudios y diseños 98,23% (244), movimiento de tierras 226 terrazas para igual número de viviendas, manzanas intervenidas: T(24), U(24), I(24), J(24), K(24), V(24), W(24), X(24), AE(28), AF(28), AH(12), AG(16), No se reintegran completas las 4 cuadrillas de mano de obra y Cuadrillas mano de obra instalaciones, Se espera reinicio con los 4 frentes de movimiento de tierras para 21/02/22. Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, dos proveedores de concreto. UNGRD pagó cuenta pago estudios y diseños contrato 244 \$3,400 millones, pendiente por cobrar aprox \$640 millones (48 cimentaciones fundidas). Interventoría realizó observaciones a reprogramación de metas e insumos para 31/07/2022, en ajuste por consorcio. SE realizó comité de Supervisión CONVENIO 217 DE 2017 UNGRD/FNV aprobación adición de recursos \$38.000 millones. Consorcio inició pagos a subcontratistas y proveedores corte del 28/12/21. Visita a obra de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación Delegada para Territorios, 10 de febrero de 2022. Visita a obra Líder Auditoría Fiscal Convenio 217 de 2017 y contratos derivados Contraloría General de la República Delegada para Vivienda y Saneamiento Básico, 17 y 18 de febrero de 2022.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	CONTRATISTA HMV INGENIEROS LTDA
	VALOR \$7.049.420.065
	AVANCE FINANCIERO 30,00%

META JULIO 2022

La totalidad de las viviendas se entregarán antes de **finalizar el periodo de gobierno.**

La fecha de culminación no se altera.

 **Julio 31 / 2022**

909



Viviendas terminadas y entregadas en total

43



El futuro es de todos

Presidencia de la República




ACTIVIDADES RELEVANTES



Movimiento de tierras 49,885 m3 de tierra (incluido expansión). 226 terrazas

Consortio informó que Obra reinicia actividades el 21 de febrero de 2022, con cuadrillas de movimiento de tierras y mano de obra para cimentaciones, estructura, instalaciones, se espera lograr ALTO RENDIMIENTO lo antes posible. Se espera para principios de marzo la llegada de otra formaleta. Se realizaron dos reuniones extraordinarias de seguimiento, participaron Vicepresidencia, Minvivienda, UNGRD, Consortio e Interventoría. Consortio entregó reprogramación, UNGRD realizó 2 reuniones con Consortio e Interventoría para orientación trámites ambientales. Se realizó ejercicio para identificar número de viviendas que posiblemente no se podrían construir al continuar esas afectaciones: 200 unds, consorcio sugiere que son 315 unidades. Consortio se comprometió a entregar 272 viviendas en mayo y la totalidad de las viviendas en julio 31 de 2022. Se espera que las gestiones del consorcio ante Corpoamazonía confirmen lo prescrito en la licencia de urbanismo en el sentido de poder construir las 909 viviendas en el predio. Consortio debe terminar gestiones ambientales en febrero.

En proceso de cobro 48 cimentaciones \$640 millones aprox
UNGRD pagó hito estudios y diseños contrato 244 \$3.400 millones aprox

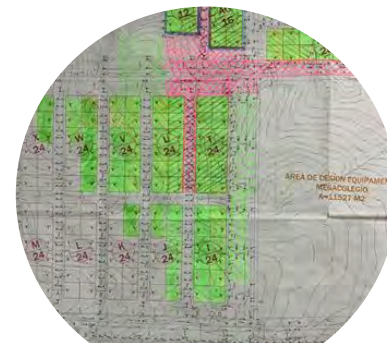

Avance movimiento de tierras



VIVIENDA URBANA SAUCES II



COMPROMISOS REUNIONES 12/25/28 DE ENERO 2022

VICEPRESIDENCIA-MINVIVIENDA-UNGRD.

1

Inventario de materiales para adelantarnos a los posibles problemas, insumos y otros.

Entregado 28 de enero, Interventoría emitió observaciones, en ajuste por Consorcio.

2

Mano de obra en todos los frentes a más tardar en una semana.

Consorcio informó que se normaliza el pago a subcontratistas de mano de obra, movimiento de tierras y proveedores. Reinicio de actividades en la semana del 21 al 25 de febrero. **Se espera ALTO RENDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS.**

3

Reunión con Corpoamazonía
26 de enero Consorcio, Interventoría, MINVIVIENDA, Gobernación, UNGRD

Temas ambientales:

Ocupación de cause costado occidental del predio, posible nacedero en costado sur del predio y captación de agua de un afluente local para proveer insumo hídrico en obra. Se realizó reunión de seguimiento, UNGRD presentó orientaciones a consorcio para el debido trámite de los permisos ante la Corporación. Consorcio presentó borrador a UNGRD e Interventoría para solicitud ante Corpoamazonía, en espera de los estudios para continuar el respectivo acompañamiento de UNGRD e INTERVENTORÍA.

4

A 30 de enero
4 formaletas en obra y 200 obreros activos.

Consorcio informa que para primera semana de marzo de 2022 completa las 4 formaletas en obra y los 200 obreros, las observaciones a la programación aún no la entregan.

5

Reporte diario de gestión

Incluir gestiones ante corporación y aspectos financieros a través de Informe diario de personal. Mantener informado a contratante del estado técnico y financiero de los contratistas de obra. **CUMPLIDO.**

VIVIENDA URBANA SAUCES II

PROYECTO SAUCES II		F-SST-67							
CONTROL DIARIO PERSONAL		Versión I							
SEMANA 3 DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DE 2022		11/03/2019							
PERSONAL STAFF		TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
CONSORCIO MOCOQ 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
CONSORCIO MOCOQ 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	2	2	2	2	2			2
INTERVENTORIA HMY	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	7	7	7	7	7			7
TOTAL		16	17	16	16	16	0		16

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
		L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO, CONSORCIO MOCOQ 2019	2	2	2	2	1			2
VIGILANCIA CM 2019	CELADURIA OBRA	2	2	2	2	2			2
CONSTRUCTORA EYJ SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
CASTAÑEDA COSNTRUCTORA SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
SINIESTERRA CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	0	0	0	0	0			0
ELECTROSERVIG	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	0	0	0	0	0			0
YFMI KONSTANZA MIGUEZ	ROMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	0	0	0	0	0			0
BCH HIDROSANITARIAS SAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	7	7	7	7	7			7
TEJA CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1	1	1	1	1			1
DAVID FRANCISCO ALVAREZ	APROVECHAMIENTO FORESTAL	0	0	0	0	0			0
SEBCO SAS	BOMBA MOVIL DE CONCRETO	0	0	0	0	0			0
TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		12	12	12	12	11	0	0	12
JYC CONSTRUCCIONES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
JYC CONSTRUCCIONES	OPERADORES, PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	OPERADORES	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
LEONEL OJEDA	OPERADORES, PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
WILSON PUENTES	OPERADORES, DESPACHADOR	0	0	0	0	0			0
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0			0
TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PERSONAL EN EL DIA		12	12	12	12	11	0		12

VIVIENDAS CON EXCAVACION MECANICA							TOTAL	
							226	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION							TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0	0	0	0	0	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	SINIESTERRA CONSTRUCTORES S.A.S	0	0	0	0	0	0	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0	0	0	0	0	
TOTAL							88	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO							TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	CONSTRUCTORA EAJ SAS	0	0	0	0	0	0	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	SINIESTERRA CONSTRUCTORA S.A.S	0	0	0	0	0	0	
VIVIENDAS FUNDIDAS MURO SEGUNDO PISO	CONSTRUCTORA EAJ SAS	0	0	0	0	0	0	
TOTAL							30	
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO							TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	0	0	0	0	0	0	
TOTAL							18	
VIVIENDAS MODULADAS (ACERO-INSTALACIONES) PARA CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO							TOTAL	
VIVIENDAS MODULADAS PARA(ACERO-INSTALACIONES) CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	0	0	0	0	0	0	
TOTAL							2	
TRAMITES ANTE ENTIDADES PUBLICAS							OBSERVACIONES	
CORPOAMAZONIA	Ocupacion de CAUCE	JORGE FAJARDO					En preparacion de informes	
CORPOAMAZONIA	SOLICITUD PRORROGA REFORESTACION Y EPFITAS	JORGE FAJARDO					Se envia carta a Corporacionel de 14 de Enero solicitando prorroga para reforestacion y recepcion de de egultos	
ALCALDIA	SOLICITUD PERMISO ABTECIMENTO DE AGUA, SOCIALIZACION VIA DE ACCESO Y FONTON DE INGRESO AL PREDIO	ING MAURICIO FLOREZ					Se envia carta a Alcaldia, haciendo solicitud de tramite mencionado anteriormente	
EJECUCION DE CONTRATACION							TOTAL VIVIENDAS EJECUTADAS	
ACTIVIDAD (VIVENDAS)	TOTAL VIVIENDAS EJECUTADAS							
	L	M	M	J	V	S	D	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO
EXCAVACION DE TERRAZAS	226	226	226	226	226	226		25%
CIMENTACIONES	88	88	88	88	88	88		10%
ESTRUCTURA PRIMER PISO	30	30	30	30	30	30		3%
PLACA DE ENTREPIE	18	18	18	18	18	18		2%
ESTRUCTURA SEGUNDO PISO	4	4	4	4	4	4		0.44%

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 32	Local: 16 50%	Calificados: 5 31%
		No Calificados: 11 69%
	Foráneo: 16 50%	Calificados: 5 31%
		No Calificados: 11 69%

36

**VIVIENDAS RURALES
EN SITIO PROPIO**



PROCESO CONTRATO DE OBRA

El 28/09/2021 se adjudicó el proceso N° FNGRD-LP-002-2021 al CONSORCIO OTES MOCOA 1.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>,

PROCESO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El 03/12/21 se adjudicó el proceso N° FNGRD-CMA-001-2021 al CONSORCIO APOYOS 2022.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376922&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Contrato de obra consorcio Otes Mocoa 1	\$ 2.406.425.590,00
Contrato de interventoría consorcio apoyos 2022	\$ 220.276.140,00
TOTAL INVERSIÓN	\$ 2.626.701.730,00

Nota: Se firmó por parte los contratistas acta de inicio con fecha 26/01/2022 y con fecha de finalización el 25/09/2022.

Los contratistas de obra e interventoría visitaron los 36 predios rurales con el propósito de establecer el diagnóstico inicial del estado de los predios.



3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$19.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 19.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018
Fecha de finalización: 30 - JUN - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 42

Local: 29
69%

Foráneo: 13
31%

Calificados: 6
21%

No Calificados: 23
79%

Calificados: 10
77%

No Calificados: 3
23%

39,97%

Avance
Financiero

68,76%

Programado

68,15%

Ejecutado

Avance Físico



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consorcio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

SUPERVISOR UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello -
Subdirección para la Reducción del Riesgo



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	31-MAY-2022
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	92 %
% EJECUTADO ETAPA I Y II	89%
ESTADO	Proyecto en ejecución, se adelanta actividades de instalación de micromedidores, empalmes en redes de distribución y líneas de conducción, así como empalmes de Valvulas Reguladoras de Presión.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

4.

PROYECTOS EN CONTRATACIÓN

Impacto

33 Intervenciones – obras de estabilización y recuperación



Actores e inversión

\$206.257 Millones

FNGRD - UNGRD



AVANCES

- Estudios y diseños de obras de mitigación para los sectores medio y alto de las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y parte alta de la quebrada Taruca.
- Se asignaron los recursos para la ejecución de las obras de mitigación.
- Estructuración de 11 procesos de obra y 11 de interventoría en etapa precontractual.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

2023

Mes:

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN -DIC

ENE - OCT

1

Estructuración de los procesos (Precontractual).

2

semanas

2

Proceso de contratación.

1.5

mes

3

Ejecución de obras.

18



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



AVANCES

Impacto **87 Familias**



Actores e inversión

\$ 9.309 Millones

- \$ 5.763 millones: Fonvivienda
- \$ 3.545 millones: FNGRD - UNGRD

- Se adelantan los trámites para la incorporación de los recursos al convenio.
- Equipo de trabajo de la UNGRD realizó desplazamiento al municipio de Mocoa para realizar visita al predio. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la UNGRD y la alcaldía con el fin de verificar los requisitos de postulación del predio.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración	2022												2023		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP-DIC	ENE-MAY	Mes:	Mes:			
1 Incorporación recursos al convenio	2 semanas															
2 Postulación y adquisición predio	4 meses															
3 Proceso precontractual contratación obra	3 semanas															
4 Proceso precontractual contratación interventoría	2 semanas															
5 Ejecución fase I contratos de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	3 meses															
6 Ejecución fase II contratos de obra - construcción proyecto 87 viviendas y obras de urbanismo	9 meses															

NOTA: Los tiempos anteriores dependerán de la postulación del predio por parte de la Alcaldía de Mocoa.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



AVANCES

- A la fecha se cuenta con el aval técnico del BAC para iniciar la ejecución del proyecto de vivienda.
- De las 216 viviendas presentadas al BAC se encuentran avaladas **211**. Pendientes por viabilizar 5 correspondiente a la comunidad indígena.

El 28 de enero mediante comunicación interna N° 2022IE00693, se radicó en el área de Gestión Contractual solicitud de información a proveedores a través del SECOP II. Esta a su vez fue cargada a la plataforma del SECOP II el 01/02/2022. Link de la publicación:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2806008&isFromPublicArea=True&isModal=False>.

Así mismo, el 10/02/2022 se recibieron 6 cotizaciones y teniendo en cuenta la metodología de la guía para la elaboración de estudios de sector de Colombia compra eficiente (media podada) el proyecto se calculó en veinticinco mil seiscientos veintiocho millones ciento cuarenta mil doscientos diez pesos M/CTE (\$25.628.140.210).

Impacto **216 Familias**

Actores e inversión

\$ 32.107 Millones

- \$ 22.590 millones: FNGRD - UNGRD
- \$ 9.517 millones: BAC

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración
(meses)

2022
Mes:

2023
Mes:

FEB MAR ABR MAY JUN JUL - DIC ENE-MAY

ACTIVIDAD	Duración (meses)	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-MAY
1 Proceso para la contratación de las obras de vivienda VISR.	2	■	■	□	□	□	□	□
2 Proceso para la contratación de la interventoría de vivienda VISR.	2	□	□	■	■	□	□	□
3 Ejecución fase I contrato de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	1	□	□	□	□	■	□	□
4 Ejecución fase II contrato de obra - construcción proyecto 216 viviendas y obras de urbanismo (20 viviendas por mes)	10	□	□	□	□	□	■	■



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO

Impacto

435 Comerciantes beneficiados de forma directa

Actores e inversión

\$18.976 Millones

FNGRD - UNGRD

• FNGRD – UNGRD y Municipio de Mocoa



AVANCES

- El 28 de enero de 2022 se suscribió el convenio 9677-PPAL001-522-2022, con el municipio de Mocoa.
- El jueves 10 de febrero de 2022 se publicó en SECOP II la solicitud de información a proveedores con el link <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2829531&isFromPublicArea=True&isModal=False>

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022							2023
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-NOV
1 Estructurar Convenio con Municipio de Mocoa	2	■	■						
2 Estructurar proceso licitatorio de obra e interventoría	2	■	■						
3 Publicación y adjudicación contrato de obra (Ley 80)	2			■	■				
4 Publicación y adjudicación contrato de Interventoría (Ley 80)	2				■	■			
5 Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	5 días					■			
6 Ejecución fase I contrato de obra - revision estudios y diseños	1					■	■		
7 Ejecución fase II contrato de obra - construcción de la galería de la plaza de mercado	17						■	■	



Impacto

16 barrios **2.522** usuarios

Actores e inversión

\$7.500 Millones

FNGRD - UNGRD

- Viceministerio de agua y Saneamiento Básico, Findeter y FNGRD – UNGRD.



AVANCES

- Se suscribió convenio No. 9677-PPAL001-463-2022, entre el FNGRD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El 16/02//2022 se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos No. 9677-PPAL001-609-2022, celebrado con Findeter.
- Se encuentra en trámite los procesos de contratación de estudios y diseños, obra e interventoría, por parte de Findeter.

CRONOGRAMA


ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



***NOTA:** De los 10 meses de ejecución de Findeter, 2 meses están programados para adelantar los procesos derivados de consultoría, obra e interventoría .




El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

5.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

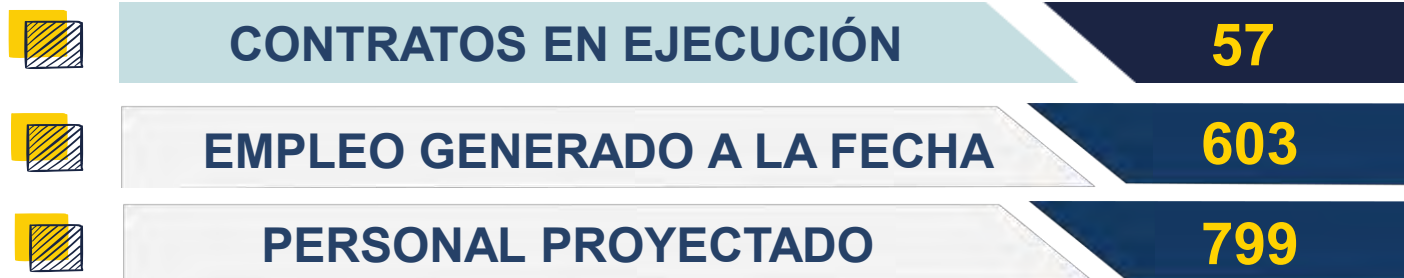

	9/02/22	22/02/22		9/02/22	22/02/22
MANO DE OBRA LOCAL	435	435	MANO DE OBRA FORÁNEA	157	168
CALIFICADOS	186	189	CALIFICADOS	122	133
NO CALIFICADOS	249	246	NO CALIFICADOS	35	35
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	73%	72%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	27%	28%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.085	1.438
EMPLEOS INDUCIDOS	241	320
TOTAL EMPLEOS	1.326	1.758

GRACIAS
