

# SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Marzo 23 de 2022



## UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

Sistema Integrado  
de Planificación y  
Gestión de la UNGRD  
certificado en:



**1.**

# SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

## OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

**\$175.603 millones**



Total de contratos

Ejecución

% en Perfeccionamiento

**18 de obra**

**18**

**100%**

**13 de interventoría**

**13**

**100%**

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

## OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

**\$43.778 millones**



Total de contratos

Ejecución

% en Perfeccionamiento

**13 de obra**

**13**

**100%**

**4 de interventoría**

**4**

**100%**

Estamos ejecutando **24** sectores en total  
 Aproximadamente 12 Km de pavimento

**1.1**

# PROYECTOS FINALIZADOS

# CONSTRUCCIÓN MURO DE ESTABILIZACIÓN BARRIO MODELO.

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Obras de control de protección y/o estabilización

Proyecto finalizado



Antes

En **desarrollo del proyecto** se construyeron 2569,88 m2 de pantallas ancladas para la mitigación, estabilización y consolidación de los taludes aferentes al barrio Modelo en el Municipio de Mocoa.

Empleos Generados: **26**

**Contrato de Obra**  
 No. 063 del 2019  
 Valor: \$ 3.841.235.901

**Nombre del Contratista:**  
 Virgilio Bravo Sosa

**Contrato de Interventoría**  
 No. 9677-PPAL001-261-2019  
 Valor: \$ 360.589.960

**Nombre de la Interventoría:**  
 Yahara Maritza Viveros Ortiz

## ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019  
 Fecha de terminación programada: 28 - DIC - 2021  
 Fecha de terminación real: 28- DIC- 2021  
 Avance financiero: 35%  
 Avance físico: 100%

## INVERSIÓN

Valor total del proyecto  
**\$ 4.201.825.861,00**

## POBLACIÓN BENEFICIADA

**45.589**



El futuro es de todos

Presidencia de la República

Proyecto finalizado

Obras de Pavimentación

En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 349 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes y una longitud de 436,7 metros lineales de alcantarillado pluvial.

Empleos Generados: **38**

**Contrato de Obra**

No. 9677-PPAL001-407-2021

Valor: \$ 1.017.658.395

**Contrato de Interventoría**

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 72.268.367

**Nombre del Contratista:**

CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA

**Nombre de la Interventoría:**

CONSORCIO INTER 5HG.

Antes

**ESTADO TERMINADO**

Fecha acta de inicio: 27 - ABR – 2021  
 Fecha de terminación programada: 18- ENE- 2022  
 Fecha de terminación real: 18- ENE- 2022  
 Avance financiero: 49,41%  
 Avance físico: 100%

**INVERSIÓN**

Valor total del proyecto  
**\$ 1.089.926.762**

**POBLACIÓN BENEFICIADA**

**45.589** 



El futuro es de todos

Presidencia de la República

**Obras de Pavimentación**



En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 318,65 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes.

Empleos Generados: **40**

**Contrato de Obra**  
 No. 9677-PPAL001-518-2021  
 Valor: \$ 1.206.210.066

**Nombre del Contratista:**  
 UNIÓN TEMPORAL CAIMARON

**Contrato de Interventoría**  
 No. 9677-PPAL001-551-2021  
 Valor: \$ 85.658.245

**Nombre de la Interventoría:**  
 CONSORCIO INTER 5HG.

**ESTADO TERMINADO**

Fecha acta de inicio: 19 - ABR – 2021  
 Fecha de terminación programada: 18- NOV- 2022  
 Fecha de terminación real: 18 – NOV – 2021  
 Avance financiero: 90%  
 Avance físico: 100%

**INVERSIÓN**

Valor total del proyecto  
**\$ 1.291.868.311**

**POBLACIÓN BENEFICIADA**


**45.589**

# 1.2

## SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN



# AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN

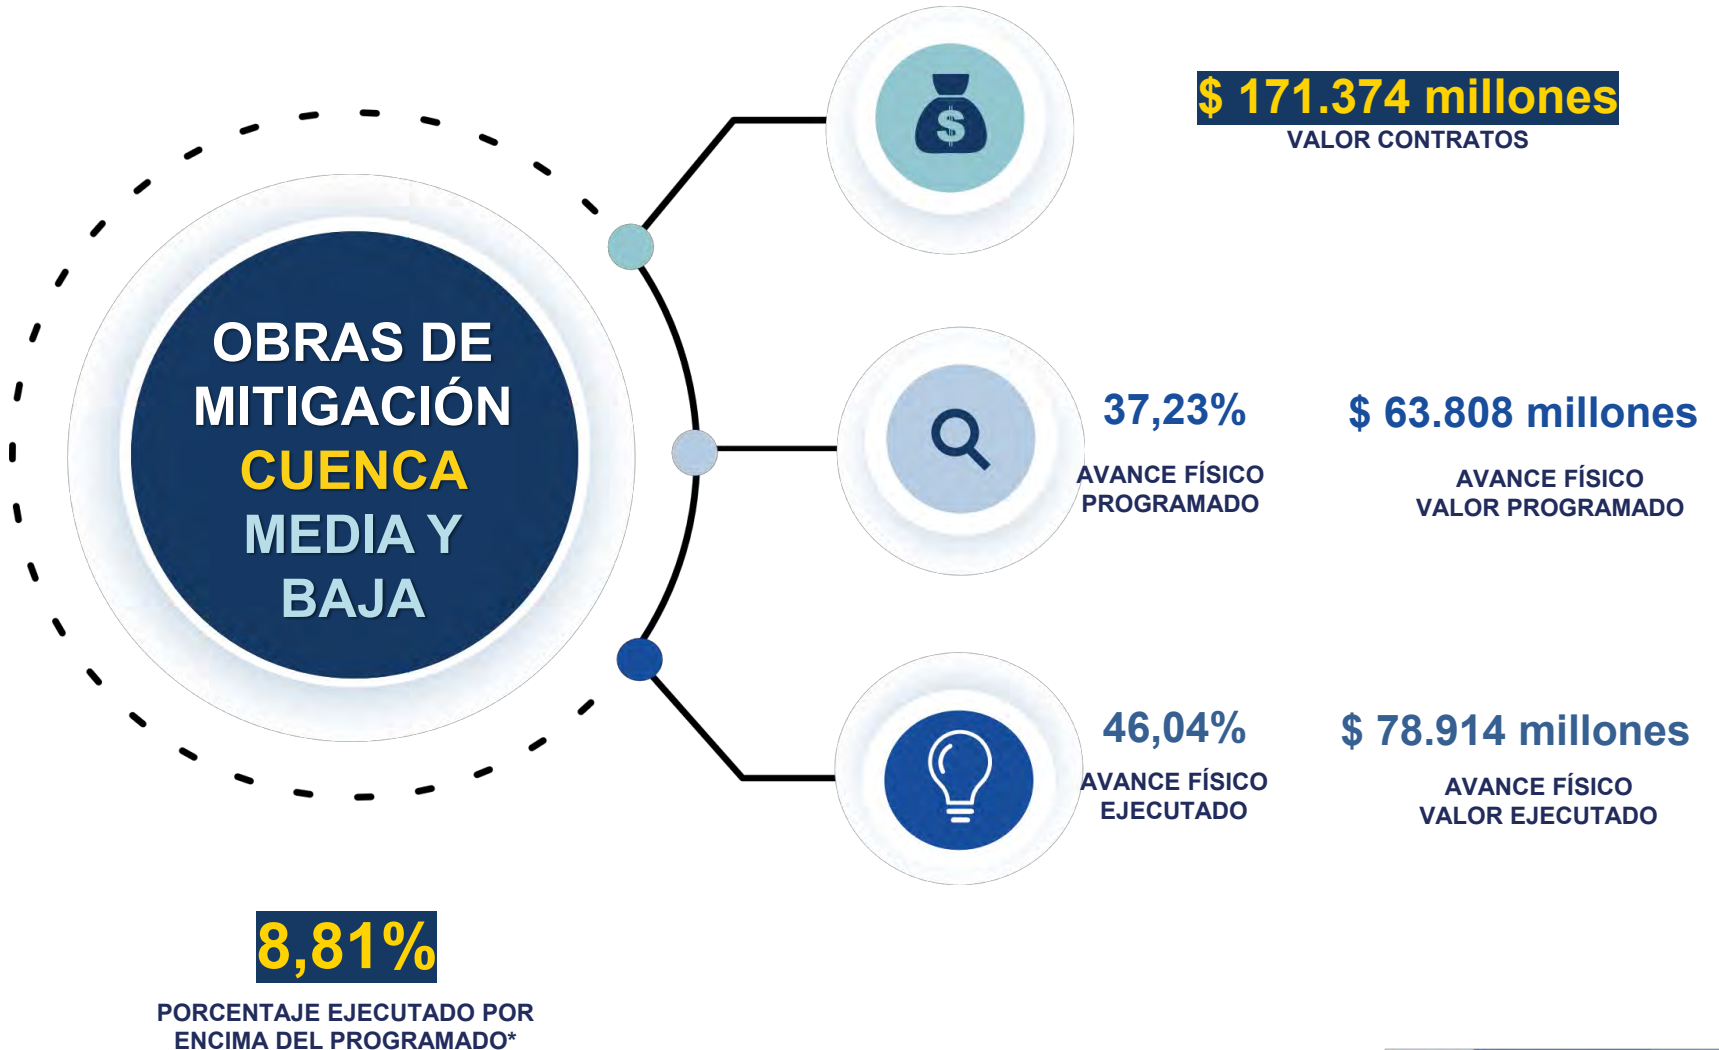

# CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN\*

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.844.159.281,86	21,74%	32,47%	\$ 10.664.498.518,82	83,80%	\$ 27.523.405.478,20	+ 51,33%
3	\$ 4.706.751.939,00	11,96%	47,10%	\$ 2.216.880.163,27	37,03%	\$ 1.742.910.243,01	-10,07%
4	\$ 6.115.409.901,98	0%	57,04%	\$ 3.488.229.808,09	43,09%	\$ 2.635.130.126,76	-13,95%
5	\$ 7.488.477.539,43	11,80%	30,38%	\$ 2.274.999.476,48	24,79%	\$ 1.856.393.582,02	-5,59%
6	\$ 11.015.788.965,85	20,83%	52,00%	\$ 5.728.210.262,24	47,00%	\$ 5.177.420.813,95	-5,00%
7	\$ 12.263.393.477,06	20,67%	41,10%	\$ 5.040.254.719,07	37,06%	\$ 4.544.813.622,60	-4,04%
8	\$ 7.204.019.704,53	35,40%	52,51%	\$ 3.782.830.746,85	46,12%	\$ 3.322.493.887,73	-6,39%
9	\$ 6.827.896.668,28	36,37%	55,37%	\$ 3.780.606.385,23	43,42%	\$ 2.964.672.733,37	-11,95%
10	\$ 5.707.351.594,38	27,32%	62,32%	\$ 3.556.821.513,62	62,34%	\$ 3.557.962.983,94	+ 0,02%
11	\$ 16.651.641.771,25	20,49%	43,78%	\$ 7.290.088.767,45	55,98%	\$ 9.321.589.063,55	+ 12,20%
12	\$ 26.536.775.722,39	25,79%	38,00%	\$ 10.083.974.774,51	45,77%	\$ 12.145.882.248,14	+ 7,77%
13	\$ 2.943.285.850,62	19,19%	69,23%	\$ 2.037.636.794,38	56,89%	\$ 1.674.435.320,42	-12,34%
14	\$ 2.096.212.362,12	0%	33,04%	\$ 692.588.564,44	11,73%	\$ 245.885.710,08	-21,31%
15	\$ 6.705.288.187,44	0%	3,20%	\$ 214.569.222,00	1,66%	\$ 111.307.783,91	-1,54%
16	\$ 8.981.109.127,00	0%	3,97%	\$ 356.550.032,34	3,68%	\$ 330.504.815,87	-0,29%
17	\$ 8.470.387.014,00	20%	29,55%	\$ 2.502.999.362,64	20,19%	\$ 1.710.171.138,13	-9,36%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	2,01%	\$ 96.807.393,56	1,02%	\$ 49.126.140,02	-0,99%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 171.374.237.344,19</b>	<b>\$ 32.523.747.647,24</b>		<b>\$ 63.808.546.504,99</b>		<b>\$78.914.105.691,69</b>	
		<b>18,98 %</b>		<b>37,23%</b>		<b>46,04%</b>	

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**  
**\$ 32.844.159.281,86**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra  
**Plazo:** DIECIOCHO (18) MESES  
**Fecha de suscripción:** 14 - SEP - 2020  
**Fecha acta de inicio:** 15 - DIC - 2020  
**Fecha de terminación:** 14 - JUN - 2022  
**Fecha de Inicio suspensión:** 24-DIC-2021  
**Fecha de reinicio:** 25 - ABR - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**


Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

**CONSTRUCCIÓN** de 1 Jarillón de **1050 ml**



**Estado Actual:**  
 El 20 de diciembre del 2021 se radicó trámite de suspensión del contrato de obra e interventoria, por un tiempo de 4 meses.

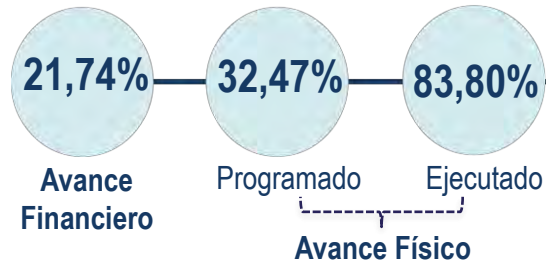

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-977-2020                  Valor: \$ 30.418.456.852,86</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b>                  INGECON SA</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-1365-2020                  Valor: \$ 2.425.702.429,00</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTER JARILLON 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

**\$ 4.706.751.939,00**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra**

Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020  
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021  
Fecha de terminación: 11 - ABR – 2022  
Solicitud de prórroga : 10 - MAR - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra:28  
Total Projectado:30

Local: 23  
**82%**


Foráneo: 5  
**18%**

Calificados: 9  
**39%**

No Calificados: 14  
**61%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

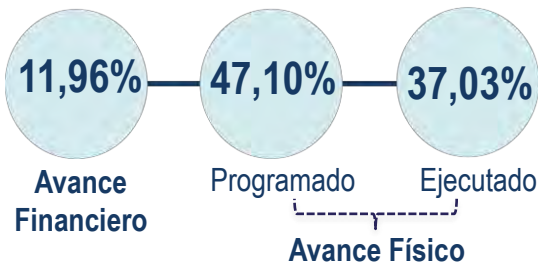

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOCA LH 2020</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**  
**\$ 6.115.409.901,98**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
 Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020  
 Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021  
 Fecha de terminación: 11 - ABR – 2022  
 Solicitud de prórroga : 11 - MAR - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

**Obras estabilización y recuperación**

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 13 Total Projectado: 25	<b>Local: 3</b> <b>23%</b>	Calificados: 3 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>
	<b>Foráneo: 10</b> <b>77%</b>	Calificados: 4 <b>40%</b>
		No Calificados: 6 <b>60%</b>

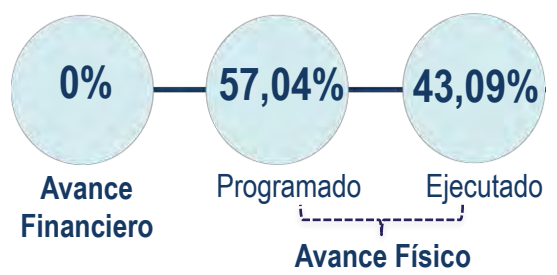

**45.589**  
Personas beneficiadas



<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-980-2020 Valor: \$ 5.710.699.339,98	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)
<b>Nombre del Contratista:</b> HAROLD MUÑOZ MUÑOZ	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO HECAD VIAL
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



**Construcción: 1/3 Azud 9**



**Construcción; Muro 7**

**ALCANCE**

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 7.488.477.539,43**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022




**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

**CONSTRUCCIÓN** de 2 diques

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 30 Total Projectado: 35	Local: 22 <b>73%</b>	Calificados: 14 <b>64%</b>
		No Calificados: 8 <b>36%</b>
	Foráneo: 8 <b>27%</b>	Calificados: 8 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

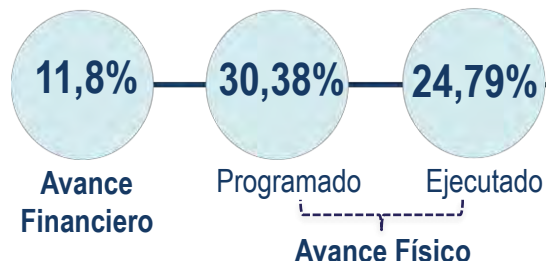

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.924.254.899,43	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 564.222.640,00
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO RIO MULATO.	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO
<b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



Vaciado de concreto en la aleta y excavación para nuevos módulos



**ALCANCE**

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 11.015.788.965,85**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES  
 Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020  
 Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021  
 Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local: 30 <b>79%</b>	Calificados: 14 <b>47%</b>
		No Calificados: 16 <b>53%</b>
	Foráneo: 8 <b>21%</b>	Calificados: 8 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

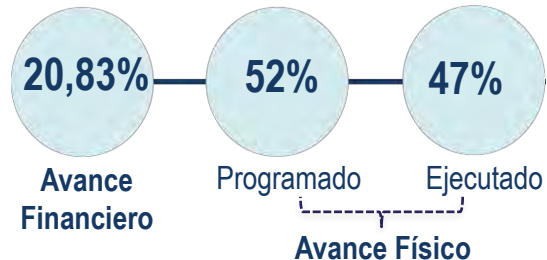


**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
<b>Nombre del Contratista:</b> CDF INGENIERIA SAS	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERDIQUE 2020
<b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
  - Muro 1
  - Azud 05
  - Muro 2
  - Azud 04
  - Muro 3

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 12.263.393.477,06**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021  
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 22  
Total Projectado: 45

Local: 18  
**82%**


Foráneo: 4  
**18%**

Calificados: 6  
**33%**

No Calificados: 12  
**67%**

Calificados: 4  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

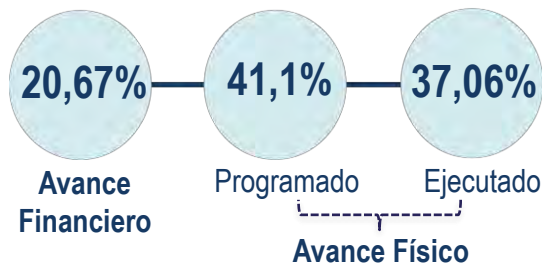

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO MUROS MOCOCA</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Armado de colchagaviones muro 10



Armado de formaleta del cuerpo azud 6



**ALCANCE**

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje



### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

**\$ 7.204.019.704,53**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021  
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención **CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 25 Total Projectado: 35	Local: 18 <b>72%</b>	Calificados: 7 <b>39%</b>
		No Calificados: 11 <b>61%</b>
	Foráneo: 7 <b>28%</b>	Calificados: 5 <b>71%</b>
		No Calificados: 2 <b>29%</b>

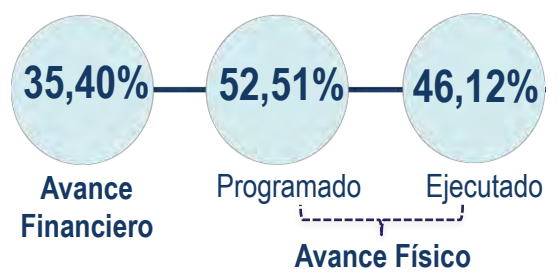

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato)
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO DIQUE 1	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Jarillón temporal para desvío del río



**ALCANCE** • Dique Abierto 1 - Q. Taruca

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto  
**\$ 6.827.896.668,28**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021  
 Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021  
 Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 21 Total Proyectado: 35	Local: 11 <b>52%</b>	Calificados: 6 <b>55%</b>
		No Calificados: 5 <b>45%</b>
	Foráneo: 10 <b>48%</b>	Calificados: 6 <b>60%</b>
		No Calificados: 4 <b>40%</b>

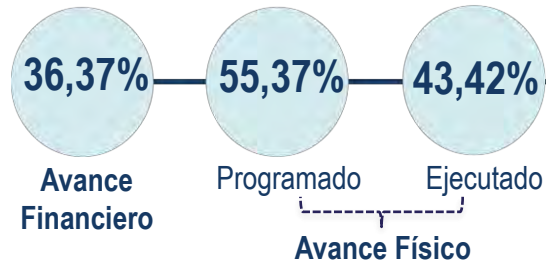

**45.589**  
 Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.319.593.302,48	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.303.365,8033 (para este contrato)
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO MURO RIO MOCOA	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



*Desencofrado aleta izquierda*



*Fundición tabique*

**ALCANCE** • Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 5.707.351.594,38**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020  
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19  
Total Projectado: 35

Local: 14  
**74%**


Foráneo: 5  
**26%**

Calificados: 6  
**43%**

No Calificados: 8  
**57%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

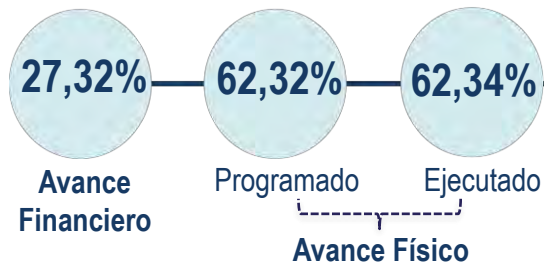

**45.589**  
Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-1119-2020  
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:  
A&A CONSULTORIA E  
INGENIERIA SAS

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-154-2021  
Valor: \$ 426.384.755,43  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO  
INTERVENTORES DDA  
MOCOCA

**Supervisor UNGRD**

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Fundida dentellones e instalación de láminas Anti desgaste. Dique 11



**ALCANCE**

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 16.651.641.771,25**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020  
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021  
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 52  
Total Projectado: 45

Local: 32  
**62%**

Foráneo: 20  
**38%**

Calificados: 6


**19%**

No Calificados: 26  
**81%**

Calificados: 8

**40%**

No Calificados: 12  
**60%**

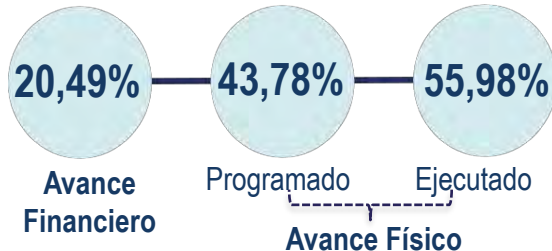

**45.589**  
Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-1064-2020  
Valor: \$ 15.407.631.114,68

Nombre del Contratista:  
UNIÓN TEMPORAL OBRAS  
RIO SANGOYACO 2020

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-154-2021  
Valor: \$ 1.244.010.656,57  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO  
INTERVENTORES  
DDA MOCOCA

**Supervisor UNGRD**

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mococa



Construcción Jarillón 02



Construcción Azud 14



## ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 26.536.775.722,39**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 68

Total Projectado: 68

Local: 54  
**79%**


Foráneo: 14  
**21%**

Calificados: 21  
**39%**

No Calificados: 33  
**61%**

Calificados: 12  
**86%**

No Calificados: 2  
**14%**

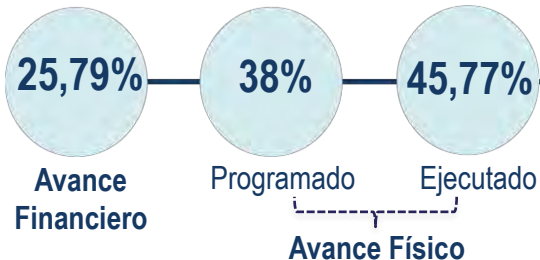

**45.589**  
Personas beneficiadas

#### Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1382-2020  
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO DRAGADO  
MOCOCA 2020

#### Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-205-2021  
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO  
INTERDRAGADOS MOCOCA

#### Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



Conformación de colchogavión y arena



### ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 2.943.285.850,62**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021  
Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021  
Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de azud.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 38  
Total Projectado: 37

Local: 19  
**50%**


Foráneo: 19  
**50%**

Calificados: 11  
**58%**

No Calificados: 8  
**42%**

Calificados: 18  
**95%**

No Calificados: 1  
**5%**

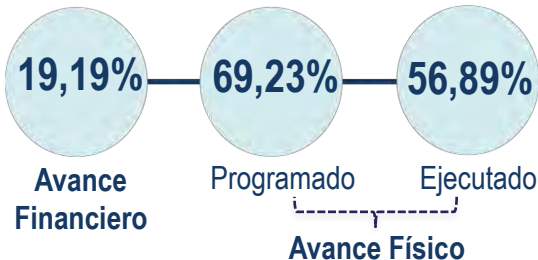

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.478.287,36</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO MIRAVALLE</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.807.563,26 (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Formaleta y recubrimiento de gaviones Ribera izquierda Azud 10- Río Sangoyaco.



Visita Departamento Nacional de Planeación -DNP



**ALCANCE**

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 2.096.212.362,12**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto y muro de protección.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 15 Total Projectado: 30	Local: 10 <b>67%</b>	Calificados: 10 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>
	Foráneo: 5 <b>33%</b>	Calificados: 5 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

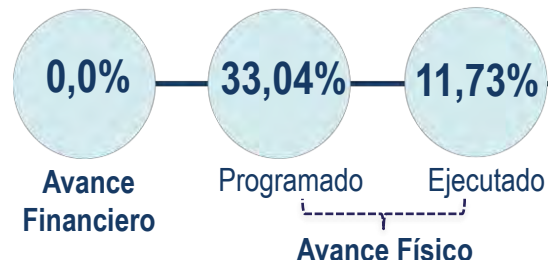

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato)
----- <b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	----- <b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Construcción Azud 15



**ALCANCE**

- Azud 15
- Muro 09

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 6.705.288.187,44**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 08 – MAR – 2021  
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021  
 Fecha de suspensión: 18 – JUL – 2021  
 Fecha acta de reinicio: 19 – OCT – 2021  
 Fecha de terminación actualizada: 14 - MAR – 2023



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 5  
Total Projectado: 30

Local: 0  
**0%**


Foráneo: 5  
**100%**

Calificados: 0  
**0%**

No Calificados: 0  
**0%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

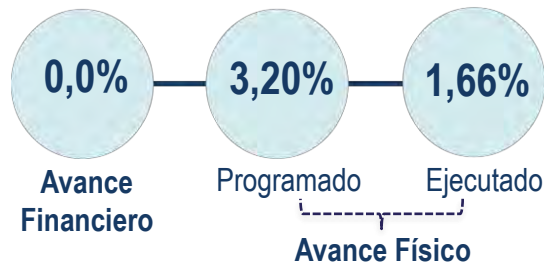

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO EVI5</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



**Excavaciones Azud 16 – Muro 10**



**Trabajos de Ataguías para inicio excavaciones Muro 10 y Azud 16**



**ALCANCE**

- Azud 16 y 17
- Muro 10





### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 8.981.109.127**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021

Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021

Fecha de terminación: 10 - MAY -2023

Firma otrosí: 07 – ENE- 2022 Cambio de NIT



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15  
Total Projectado: 37

Local: 13  
**87%**

Foráneo: 2  
**13%**

Calificados: 9  
**69%**

No Calificados: 4  
**31%**

Calificados: 2  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

0,0%

Avance  
Financiero

3,97%

Programado

3,68%

Ejecutado

Avance Físico

**45.589**

Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-1342-2020  
Valor: \$ 8.307.462.027

**Nombre del Contratista:**  
CONSORCIO AZUD  
MOCOCA 520

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-098-2021  
Valor: \$ 673.647.100

**Nombre de la Interventoría:**  
CONSORCIO  
INTERVENTORIA MUROS  
MOCOCA 2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



Excavaciones y construcción de gaviones de cimentación  
Dique Azud 4-Quebrada Taruca

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 8.470.387.014**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12  
Total Projectado: 40

Local: 7  
**58%**


Foráneo: 5  
**42%**

Calificados: 7  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

Calificados: 5  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

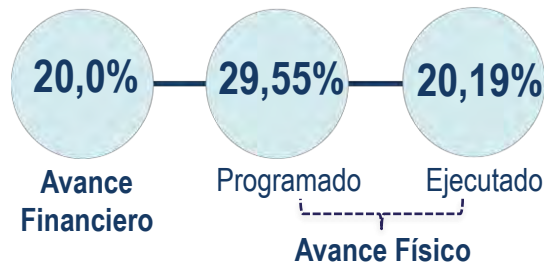


**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición cuerpo Azud 6-Q taruca.

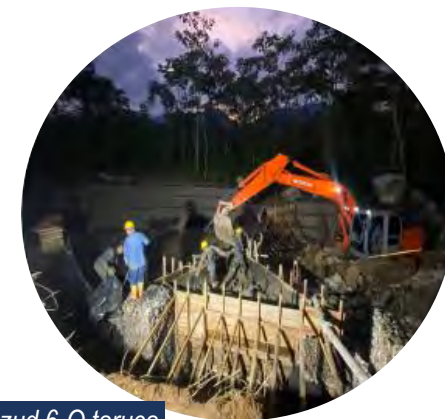

### ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 4.816.288.237,00**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES  
 Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021  
 Fecha acta de inicio: 05- ENE – 2022  
 Fecha de terminación: 05 - ENE - 2023

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras de drenaje

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

**Estado Actual:**

Se aprueba enrocado y la interventoría revisa diseño presentado para evaluación. Se iniciarán obras una vez se aprueben diseños puntuales de drenajes.



**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-183-2021                  Valor: \$ 4.452.771.492,00</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-743-2021                  Valor: \$ 363.516.745,00</p>
<p>-----  <b>Nombre del Contratista:</b>                  CONSTRUVAL                  INGENIERÍA S.A.S.</p>	<p>-----  <b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INGENIERÍA DE                  MITIGACIÓN</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

**Construcción:**

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

**1.3**

# SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

# AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



# CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$10.716.744.930,19	0,00%	73,28%	\$ 7.853.230.684,84	49,50%	\$ 5.304.788.740,44	-23,78%
2	\$1.348.270.441,00	89,01%	100,00%	\$ 1.348.270.441,00	100,00%	\$ 1.348.270.441,00	Finalizado
3	\$2.561.992.020,00	0,00%	89,35%	\$ 2.289.139.869,87	70,57%	\$ 1.807.997.768,51	-18,78%
4	\$1.089.926.762,00	49,41%	100,00%	\$ 1.089.926.762,00	100,00%	\$ 1.089.926.762,00	Finalizado
5	\$3.648.087.137,12	0,00%	100,00%	\$ 3.648.087.137,12	100,00%	\$ 3.648.087.137,12	Finalizado
6	\$1.291.868.311,00	90,00%	100,00%	\$ 1.291.868.311,00	100,00%	\$ 1.291.868.311,00	Finalizado
7	\$2.887.755.648,00	0,00%	45,36%	\$ 1.309.885.961,93	27,83%	\$ 803.662.396,84	-17,53%
8	\$1.492.702.508,00	69,75%	96,22%	\$ 1.436.278.353,20	89,90%	\$ 1.341.939.554,69	-6,32%
9	\$4.979.678.330,00	22,24%	61,86%	\$ 3.080.429.014,94	36,56%	\$ 1.820.570.397,45	-23,30%
10	\$1.960.337.973,00	38,37%	92,60%	\$ 1.815.272.963,00	83,52%	\$ 1.637.274.275,05	-9,08%
11	\$1.365.747.660,00	0,00%	27,69%	\$ 378.175.527,05	27,74%	\$ 378.858.400,88	0,05%
12	\$6.644.038.095,94	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$3.791.334.750,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$43.778.484.566,25</b>	<b>\$ 32,523,747,647.24</b>		<b>\$ 25.540.565.025,95</b>		<b>\$ 20.473.244.184,99</b>	
		<b>18,98%</b>		<b>58,34%</b>		<b>46,77%</b>	

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

**\$ 10.716.744.930,19**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES  
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021  
Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022




**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 11 Total Projectado: 26	<b>Local: 5</b> <b>45%</b>	Calificados: 4 <b>80%</b>
		No Calificados: 1 <b>20%</b>
	<b>Foráneo: 6</b> <b>55%</b>	Calificados: 6 <b>100%</b>
		No Calificados: 0 <b>0%</b>

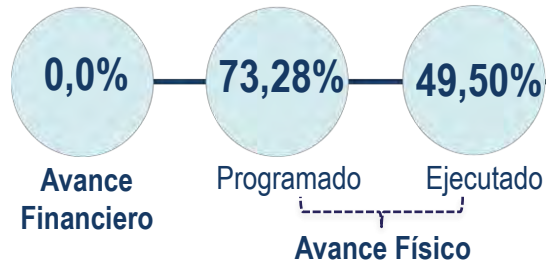

**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 9.978.894.780	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 737.850.150
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO VIAS MOCOA 040	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER VIAS
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



**Sub base**



**Fundición andenes**

**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.
- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$1.348.270.441**

**EJECUTOR**


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 18 - ENE – 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

**IMPACTO**

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

**Estado Actual:**  
 Obra finalizada el 18/01/2022



**45.589**  
 Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-378-2021                  Valor: \$ 1.258.851.707</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-551-2021                  Valor: \$ 89.396.558</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b>                  JAVIER GUSTAVO OSPINA</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	



Canalización de aguas lluvias



Fundición de placa

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaverál y Prado Norte.

**ALCANCE**



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto  
**\$2.561.992.020,00**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES  
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021  
Fecha de terminación: 18 – ABR – 2022




## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 19 Total Projectado: 25	Local 19 <b>100%</b>	Calificados 5 <b>26%</b>
		No Calificados 14 <b>74%</b>
	Foráneo 0 <b>0%</b>	Calificados 0 <b>0%</b>
		No Calificados 0 <b>0%</b>

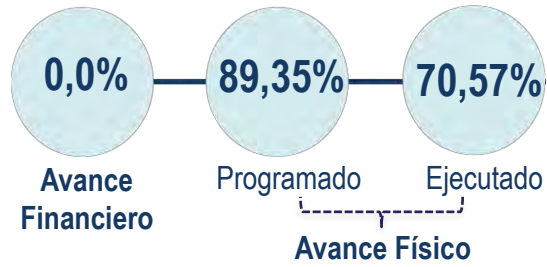


**45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.397.174.750	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

**\$ 3.648.087.137,12**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES  
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021  
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**


**Estado Actual:**

Obra finalizada el 05/01/2022



**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 3.447.499.607,12</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO VIAS DE MOCOA</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	

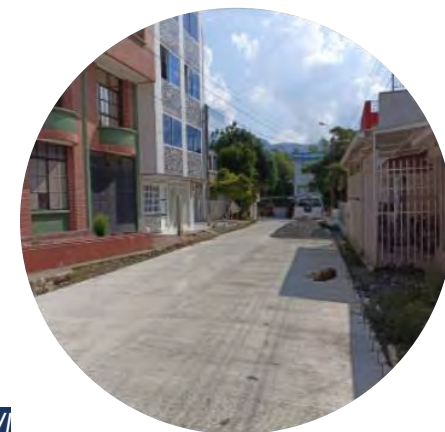

Tramos IV y VI



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.

### ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 2.887.755.648**

### EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización: 18 - MAY - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

### IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 23 Total Projectado: 25	Local: 22	Calificados: 3
	<b>96%</b>	<b>14%</b>
		No Calificados: 19
		<b>86%</b>
	Foráneo: 1	Calificados: 1
	<b>4%</b>	<b>100%</b>
		No Calificados: 0
		<b>0%</b>

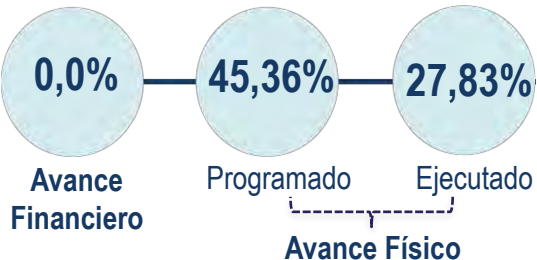

 **45.589**  
Personas beneficiadas

<b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	<b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
<b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO ORC 2020	<b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
  - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
  - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
  - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
  - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
  - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
  - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$1.492.702.508,00**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES  
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021  
Fecha de finalización: SUSPENDIDO



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación de **1 vía**

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 12  
Total Proyectado: 25

Local: 12  
**100%**


Foráneo: 0  
**0%**

Calificados: 5  
**42%**

No Calificados: 7  
**58%**

Calificados: 0  
**0%**

No Calificados: 0  
**0%**

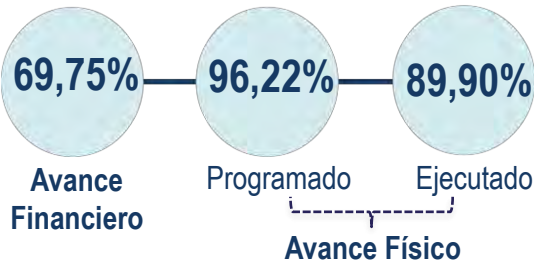

**45.589**  
Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-636-2021  
Valor: \$ 1.403.617.179

**Nombre del Contratista:**  
CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-551-2021  
Valor: \$ 89.085.329

**Nombre de la Interventoría:**  
CONSORCIO INTER 5HG

**Supervisor UNGRD**  
Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 4.979.678.330,00**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra**



Plazo: OCHO (8) MESES  
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021  
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021  
Fecha de terminación: 07 – JUN -2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 30  
Total Projectado: 37

Local: 27  
**90%**

Foráneo: 3  
**10%**

Calificados: 15

**56%**

No Calificados: 12


**44%**

Calificados: 3

**100%**

No Calificados: 0

**0%**

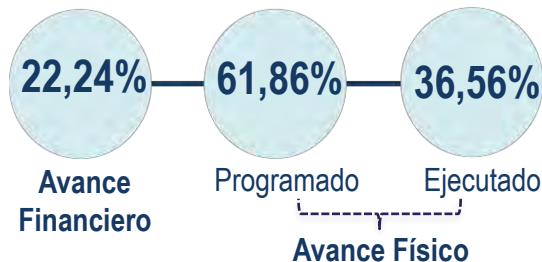

**45.589**  
Personas beneficiadas

<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.484.295.610</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



**Formaleta para cámara pluvial**



**Construcción de bordillos**



**ALCANCE**

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

## ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 1.960.337.973**

## EJECUTOR

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de finalización actualizada: 03 - ABR - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

## IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 14

Total Projectado: 37

Local: 14

**100%**

Foráneo: 0

**0%**

Calificados: 6

**43%**

No Calificados: 8


**57%**

Calificados: 0

**0%**

No Calificados: 0

**0%**

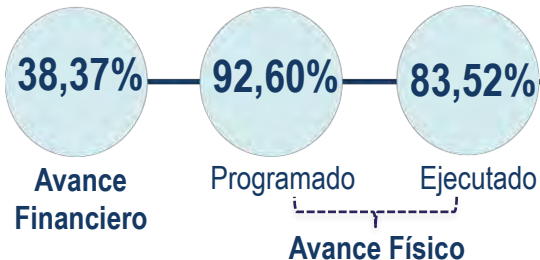

**45.589**

Personas beneficiadas

### Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-549-2021

Valor: \$1.830.025.649

### Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS

MOAC CONSTRUCCIONES

### Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 130.312.324

(Para este contrato)

### Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG

### Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Santacruz Castro– Reconstrucción Mocoa



## ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 1.365.747.660**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES  
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021  
Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021  
Fecha de terminación: 16 - AGO - 2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 26  
Total Projectado: 20

Local: 19  
**73%**


Foráneo: 7  
**27%**

Calificados: 11  
**58%**

No Calificados: 8  
**42%**

Calificados: 7  
**100%**

No Calificados: 0  
**0%**

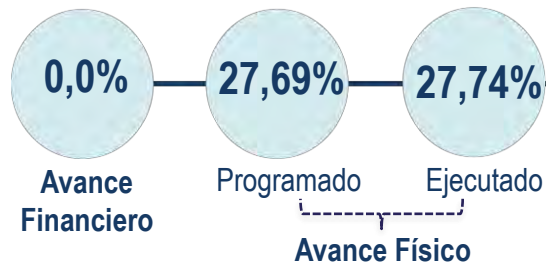

**45.589**  
Personas beneficiadas

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-550-2021  
Valor: \$ 1.282.799.166

Nombre del Contratista:  
DIEGO DAVID  
MELO CAMPIÑO

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-969-2021  
Valor: \$ 82.948.494  
(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO  
INTERVENTORIA  
PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD  
Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)



Construcción bordillos.



Construcción de Recamaras

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 6.644.038.095,94**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra



**Plazo:** DOCE (12) MESES

**Fecha de suscripción:** 15 – JUN - 2021

**Fecha acta de inicio:** No cuenta aún con fecha de acta.

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

**Estado Actual:**

La UNGRD ya dio los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario, en trámite para incorporarlos al contrato de obra y en aprobación ante la Alcaldía de Mocoa el ajuste del proyecto.

**45.589**  
 Personas beneficiadas



*Toma de topografía*



<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-900-2021                  Valor: \$ 6.240.520.933</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-969-2021                  Valor: \$ 403.517.162,94</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b>                  CONSORCIO VIAS 897</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría</b>                  CONSORCIO INTERVENTORIA                  PAVIMENTOS 063</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



**ALCANCE**

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$3.791.334.750,00**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES  
Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021  
Fecha acta de inicio: Pendiente



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

### Estado Actual:

Visita técnica con Alcaldía de Mocoa para trámite de permiso de intervención de estructura por donde se proyecta construir el descole del Alcantarillado Pluvial de Quintas de la Colina.

**45.589**  
Personas beneficiadas



Visita técnica con alcaldía Municipal-  
interventoría y supervisión



<p><b>Contrato de Obra</b> No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 3.295.952.030</p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b> No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



## ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

**2.**

# SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

## CONTRATOS DE OBRA SAUCES II

TOTAL VIVIENDAS

**1.209**



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

**300**

NO. VIVIENDAS	CONTRATISTA	VALOR (Millones)	VALOR ADICIONAL FEBRERO 2022	AVANCE	AVANCE FINANCIERO
436	CONSORCIO MOCOA 2019	\$25.731.568.960,00	\$ 17.868.431.040,00	33,45%	20%
473	CONSORCIO MOCOA 2019	\$27.915.211.280,00	\$ 19.384.788.720,00	30,91%	17,4%
		<b>\$ 53.646.780.240,00</b>	<b>\$ 37.253.219.760,00</b>		
<b>TOTAL DE VIVIENDAS</b>	<b>909</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 90.900.000.000,00</b>		

Estudios y diseños 98,23% (244), movimiento de tierras 266 terrazas para igual número de viviendas, manzanas intervenidas: T(24), U(24), I(24), J(24), K(24), V(24), W(24), X(24), AE(28), AF(28), AH(12), AG(16), 4 cuadrillas de mano de obra, 2 cuadrillas de movimiento de tierras, Se espera 2 frentes de movimiento de tierras para 23/03/22. Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, dos proveedores de concreto, llegada a obra de manera progresiva formaletas 3 y 4. Pendiente de cobro aprox \$640 millones (48 cimentaciones fundidas). Interventoría emitió concepto con observaciones a reprogramación de metas, nueva fecha de terminación 30 de septiembre 2022 (para julio 2022 436 viviendas) en ajuste por consorcio. En proceso de perfeccionamiento otrosíes de adición Convenio 217 y contratos 243 y 244. Con la expedición de otrosíes de los contratos 243 y 244 se liberan aproximadamente \$10.000 millones de pesos, mayor valor de lo pagado a la fecha. Continúa procesos de declaratoria de posible incumplimiento, contratos 243 y 244 de 2018.

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	<b>CONTRATISTA</b> <b>HMV INGENIEROS LTDA</b>
	<b>VALOR</b> <b>\$7.049.420.065</b>
	<b>AVANCE FINANCIERO</b> <b>30,00%</b>

## META JULIO 2022

La totalidad de las viviendas se entregarán antes de **finalizar el periodo de gobierno.**

La fecha de culminación no se altera.

 **Julio 31 / 2022**

**909**



Viviendas terminadas y entregadas en total

43



**El futuro es de todos**


Presidencia de la República



## ACTIVIDADES RELEVANTES



**Movimiento de tierras 53,484 m3 de tierra (incluido expansión). 266 terrazas**

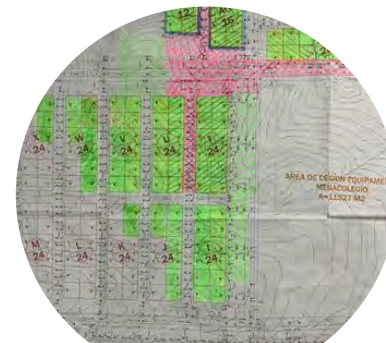

*Avance movimiento de tierras*

**Obra presenta ingreso de personal, promedio semanal de 96 trabajadores (Administrativos, mano de obra y maquinaria amarilla). Llegada progresiva de formaletas 3 y 4.** UNGRD realizó acompañamiento diario a Consorcio orientado a facilitar ingreso de personal de obra, Consorcio presentó solicitud de trámites ambientales ante la Corporación. Consorcio se comprometió a entregar 272 viviendas en mayo.

Se espera que las gestiones del consorcio ante Corpoamazonía confirmen lo prescrito en la licencia de urbanismo en el sentido de poder construir las 909 viviendas en el predio. El consorcio radicó ante la corporación la solicitud ambiental, esta en estudio de parte de la corporación.



En proceso de **cobro 48 cimentaciones \$640 millones** aprox UNGRD pagó hito estudios y diseños contrato 244 **\$3.400 millones** aprox Con la expedición de los otrosíes de adición a los contratos de obra 243 y 244 se liberan por mayor valor de los contratos, aproximadamente **10.000 millones** de pesos para pronto pago.

# VIVIENDA URBANA SAUCES II



COMPROMISOS REUNIONES 12, 25 y 28 DE ENERO 2022

VICEPRESIDENCIA-MINVIVIENDA-UNGRD.

1

Inventario de materiales para adelantarnos a los posibles problemas, insumos y otros.

Entregado 28 de enero, Interventoría emitió observaciones, en ajuste por Consorcio.

2

Mano de obra en todos los frentes a más tardar en una semana.

96 trabajadores promedio esta semana. Se espera **ALTO RENDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS.**

3

Reunión con Corpoamazonía 26 de enero Consorcio, Interventoría, MINVIVIENDA, Gobernación, UNGRD

**Temas ambientales:**  
Ocupación de cause costado occidental del predio, posible nacedero en costado sur del predio. Consorcio radicó solicitud de trámite ante la corporación.

4

A 30 de enero 4 formaletas en obra y 200 obreros activos.

Llegada progresiva a obra de juego de formaletas 3 y 4.

5

Reporte diario de gestión

Incluir gestiones ante corporación y aspectos financieros a través de informe diario de personal. Mantener informado a contratante del estado técnico y financiero de los contratistas de obra. **CUMPLIDO.**

# VIVIENDA URBANA SAUCES II

PROYECTO SAUCES II CONTROL DIARIO PERSONAL		F-SST-67 Versión I 11/03/2019							
SEMANA 3 DEL 14 AL 19 DE MARZO DE 2022		TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
CONSORCIO MOCOYA 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	10	10	10	10	10	10		10
CONSORCIO MOCOYA 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	2	2	3	3	3	3		3
INTERVENTORIA HMY	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	8	8	8	8	8	8		8
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							PROMEDIO
		L	M	M	J	V	S	D	
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MOCOYA 2019	2	2	2	2	2	2		2
VIGILANCIA CM 2019	CELADURIA OBRA	2	2	2	2	2	2		2
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	8	8	9	10	8	8		9
CASTAÑEDA COSNTRUCTORA SAS	CIMENTACION	10	10	10	10	10	9		10
SINIESTERRA CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	15	15	15	17	17	17		16
RDL LOGISTICA Y SOLUCIONES	ESTRUCTURA	0	4	4	7	7	7		5
ELECTROSERVIG	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	4	4	4	4	4	4		4
YENI CONSTANZA MIGUEZ	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	0	0	0	0	0	0		0
BCH HIDROSANITARIAS SAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5	6	5	5	5	5		5
TEJA CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1	1	1	1	1	2		1
DAVID FRANCISCO ALVAREZ	APROVECHAMIENTO FORESTAL	0	0	0	0	0	2		0
SEBCO SAS	BOMBA MOVIL DE CONCRETO	0	1	1	1	1	1		1
<b>TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>		<b>47</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
JUAN PABLO GUERRERO	CONDUCTORES DE VOLQUETA	10	11	11	0	10	0		7
JUAN PABLO GUERRERO	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	4	4	4	1	4	2		3
JUAN PABLO GUERRERO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1	1	1	0	1	0		0
EDUARDO MORA	OPERADORES	0	0	0	0	0	0		0
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0	0		0
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	0	1	0	0		0
LEONEL OJEDA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	4	4	4	0	2	0		2
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	10	9	12	0	0	0		5
LEONEL OJEDA	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1	1	2	1	1	0		1
WILSON PUENTES	DESPACHADOR, LIMPIALLANTAS	0	0	0	0	1	0		0
WILSON PUENTES	OPERADOR MINICARGADOR	0	1	1	1	1	1		1
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	1	0	0	0	0	0		0
<b>TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL PERSONAL EN EL DIA</b>		<b>98</b>	<b>104</b>	<b>109</b>	<b>84</b>	<b>98</b>	<b>83</b>		<b>75</b>

VIVIENDAS CON EXCAVACION MECANICA										TOTAL	
										230	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0	0	2	0	0				94
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	SINIESTERRA CONSTRUCTORES S.A.S	2	0	0	0	2	0				
VIVIENDAS FUNDIDAS EN CIMENTACION	CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0	0	0	0	0				
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	CONSTRUCTORA E&J SAS	0	0	0	0	0	0				32
VIVIENDAS FUNDIDAS EN MURO PRIMER PISO	SINIESTERRA CONSTRUCTORA S.A.S	0	0	2	0	0	0				
VIVIENDAS FUNDIDAS MURO SEGUNDO PISO	CONSTRUCTORA E&J SAS	0	0	0	0	0	0				4
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO										TOTAL	
VIVIENDAS FUNDIDAS LOSA ENTRE PISO	SINIESTERRA CONSTRUCTORA S.A.S	0	0	2	0	0	0				20
0											
VIVIENDAS MODULADAS (ACERO-INSTALACIONES) PARA CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO										TOTAL	
VIVIENDAS MODULADAS PARA(ACERO-INSTALACIONES) CIMENTACION EN PLACA ENTRE PISO	FRENTE I CONSTRUCTORA EYJ SAS	2	0	0	0	0	0				2

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 96	<b>Local: 65</b> <b>68%</b>	Calificados: 26 <b>40%</b>
		No Calificados: 39 <b>60%</b>
	<b>Foráneo: 31</b> <b>32%</b>	Calificados: 12 <b>39%</b>
		No Calificados: 19 <b>61%</b>

**36**

**VIVIENDAS RURALES  
EN SITIO PROPIO**



## PROCESO CONTRATO DE OBRA

El 28/09/2021 se adjudicó el proceso N° FNGRD-LP-002-2021 al CONSORCIO OTES MOCO A 1.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>,

## PROCESO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El 03/12/21 se adjudicó el proceso N° FNGRD-CMA-001-2021 al CONSORCIO APOYOS 2022.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376922&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Contrato de obra consorcio Otes Mocoa 1	\$ 2.406.425.590,00
Contrato de interventoría consorcio apoyos 2022	\$ 220.276.140,00
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 2.626.701.730,00</b>

**Nota:** Se firmó por parte los contratistas acta de inicio con fecha 26/01/2022 y con fecha de finalización el 25/09/2022.

El contratista de obra presentó los 36 informes diagnóstico de los predios rurales correspondientes a las visitas realizadas. Se adelanta logística y compra de materiales para el inicio de las obras.



**3.**

# SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$19.194 millones  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

**\$ 19.194 millones**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES  
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018  
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018  
Fecha de finalización: 30 - JUN - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

**CONSTRUCCIÓN** de infraestructura educativa.

## IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

## PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 48

Local: 31  
**65%**

Foráneo: 17  
**35%**

Calificados: 6  
**19%**

No Calificados: 25  
**81%**

Calificados: 11  
**65%**

No Calificados: 6  
**35%**

**39,97%**

Avance Financiero

**73,07%**

Programado

**71,11%**

Ejecutado

Avance Físico



Fotos: Avance Fase 2

**Contrato de Obra**  
No. 9677-PPAL001-225-2018  
Valor: \$ 10.462.078.032,00

**Nombre del Contratista:**  
Consorcio Colegio Mocoa

**Contrato de Interventoría**  
No. 9677-PPAL001-228-2018  
Valor: \$732.329.530,00

**Nombre de la Interventoría:**  
INGEVAL S.A.S.

## SUPERVISOR UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello -  
Subdirección para la Reducción del Riesgo

# PROYECTO CENTRO PENITENCIARIO



**ENTIDADES PARTICIPANTES:**  
 USPEC - INPEC - ALCALDIA DE MOCOA - UNGRD

**ALCANCE:**  
 Compra de predio de 11 hectáreas para la construcción de nuevo ERON y su escrituración y registro.

**ESTADO:**  
 La UNGRD cumplió con su compromiso de financiación al **100%**

La Alcaldía de Mocoa se encuentra en proceso de adquisición del predio.

## OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO

### ETAPA

1

#### ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



#### ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

### ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	31-MAY-2022
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	94.7%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	90.4%
AVANCE FINANCIERO ETAPA I Y II	86%
ESTADO	Proyecto en ejecución, se adelanta actividades de instalación de micromedidores, así como empalmes de válvulas reguladoras de presión.



**4.**

# PROYECTOS EN CONTRATACIÓN

## Impacto

**33** Intervenciones – obras de estabilización y recuperación



Actores e inversión

**\$206.257 Millones**

FNGRD - UNGRD

## CRONOGRAMA

### ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

2023

Mes:

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN -DIC

ENE - OCT

**1**

Estructuración de los procesos (Precontractual).

**1**

mes

**2**

Proceso de contratación.

**2**

meses

**3**

Ejecución de obras.

**18**

meses



## AVANCES

- Estudios y diseños de obras de mitigación para los sectores medio y alto de las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y parte alta de la quebrada Taruca.
- Se asignaron los recursos para la ejecución de las obras de mitigación.
- Estructuración de 11 procesos de obra y 11 de interventoría en etapa precontractual.
- Invitación 8 procesos de obra el 18 de marzo de 2022.



## AVANCES

Impacto **87 Familias**



Actores e inversión

**\$ 9.309 Millones**

- \$ 5.763 millones: Fonvivienda
- \$ 3.545 millones: FNGRD - UNGRD

- Se adelantan los trámites para la incorporación de los recursos al convenio.
- Equipo de trabajo de la UNGRD realizó desplazamiento al municipio de Mocoa para realizar visita al predio. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la UNGRD y la alcaldía con el fin de verificar los requisitos de postulación del predio.

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración	2022												2023		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP-DIC	ENE-MAY	Mes:	Mes:			
1 Incorporación recursos al convenio	2 semanas															
2 Postulación y adquisición predio	4 meses															
3 Proceso precontractual contratación obra	3 semanas															
4 Proceso precontractual contratación interventoría	2 semanas															
5 Ejecución fase I contratos de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	3 meses															
6 Ejecución fase II contratos de obra - construcción proyecto 87 viviendas y obras de urbanismo	9 meses															

**NOTA:** Los tiempos anteriores dependerán de la postulación del predio por parte de la Alcaldía de Mocoa.



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República



## AVANCES

- A la fecha se cuenta con el aval técnico del BAC para iniciar la ejecución del proyecto de vivienda.
- De las 216 viviendas presentadas al BAC se encuentran avaladas **211**. Pendientes por viabilizar 5 correspondiente a la comunidad indígena.

El 28 de enero mediante comunicación interna N° 2022IE00693, se radicó en el área de Gestión Contractual solicitud de información a proveedores a través del SECOP II. Esta a su vez fue cargada a la plataforma del SECOP II el 01/02/2022. Link de la publicación:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2806008&isFromPublicArea=True&isModal=False>.

Así mismo, el 10/02/2022 se recibieron 6 cotizaciones y teniendo en cuenta la metodología de la guía para la elaboración de estudios de sector de Colombia compra eficiente (media podada) el proyecto se calculó en veinticinco mil seiscientos veintiocho millones ciento cuarenta mil doscientos diez pesos M/CTE (\$25.628.140.210).

Impacto **216 Familias**

Actores e inversión

**\$ 32.107 Millones**

- \$ 22.590 millones: FNGRD - UNGRD
- \$ 9.517 millones: BAC

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022					2023	
		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-MAY
1 Proceso para la contratación de las obras de vivienda VISR.	2	■	■	□	□	□	□	□
2 Proceso para la contratación de la interventoría de vivienda VISR.	2	□	□	■	■	□	□	□
3 Ejecución fase I contrato de obra - elaboración estudios y diseños proyecto	1	□	□	□	□	■	□	□
4 Ejecución fase II contrato de obra - construcción proyecto 216 viviendas y obras de urbanismo (20 viviendas por mes)	10	□	□	□	□	□	■	■



# CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO

## Impacto

**435** Comerciantes beneficiados de forma directa

### Actores e inversión

**\$18.976 Millones**

FNGRD - UNGRD

• FNGRD – UNGRD y Municipio de Mocoa



## AVANCES

- Se estructura solicitud de Otrosí de adición al convenio por ajustes de precios recibidos en el proceso de solicitud de información a proveedores.

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022						2023	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL - DIC	ENE-NOV
1 Estructurar Convenio con Municipio de Mocoa	2	■	■						
2 Estructurar proceso licitatorio de obra e interventoría	2	■	■						
3 Publicación y adjudicación contrato de obra (Ley 80)	2			■	■				
4 Publicación y adjudicación contrato de Interventoría (Ley 80)	2				■	■			
5 Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	5 días					▬			
6 Ejecución fase I contrato de obra - revision estudios y diseños	1					▬	■		
7 Ejecución fase II contrato de obra - construcción de la galería de la plaza de mercado	17						▬	■	■





Impacto

**16** barrios **2.522** usuarios

Actores e inversión

**\$7.500 Millones**

FNGRD - UNGRD

- Viceministerio de agua y Saneamiento Básico, Findeter y FNGRD – UNGRD.



## AVANCES

- Se suscribió convenio No. 9677-PPAL001-463-2022, entre el FNGRD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El 16/02//2022 se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos No. 9677-PPAL001-609-2022, celebrado con Findeter.
- Se inicia proceso de publicación de pliegos de contratación y adjudicación de estudios y diseños, obra e interventoría, por parte de Findeter.

## ACTIVIDAD

2022

Mes:

Duración

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY-NOV

DIC

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY-NOV	DIC
<b>1</b>	Suscripción del convenio con el Viceministerio de agua y saneamiento básico	2 semanas					
<b>2</b>	Suscripción del contrato con Findeter para la ejecución del proyecto	2 semanas					
<b>3</b>	Creación del patrimonio autónomo y trámites precontractuales	4 semanas					
<b>4</b>	Proceso de contratación obra e interventoría	4 semanas					
<b>5</b>	Legalización de los contratos de obra e interventoría	1 semana					
<b>6</b>	Ejecución	8 meses y 3 semanas					



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República



Impacto

**45.589** Personas beneficiadas

Actores e inversión

**\$553 Millones**

FNGRD - UNGRD



## AVANCES

- Se asignaron los recursos para el fortalecimiento del SAT.
- Se adelanta proceso con el GGC para el envío de invitación a presentar propuestas.

## CRONOGRAMA

### ACTIVIDAD

Duración  
(meses)

2022

Mes:

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

1


Proceso contratación

2

2

Ejecución de actividades




3



**5.**

# GENERACIÓN DE EMPLEO

# GENERACIÓN DE EMPLEO

	<b>INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN</b>	<b>81</b>
	<b>EMPLEO GENERADO A LA FECHA</b>	<b>634</b>
	<b>PERSONAL PROYECTADO</b>	<b>1.892</b>

	9/03/22	23/03/22		09/03/22	23/03/22
<b>MANO DE OBRA LOCAL</b>	<b>460</b>	<b>448</b>	<b>MANO DE OBRA FORÁNEA</b>	<b>178</b>	<b>186</b>
CALIFICADOS	196	194	CALIFICADOS	139	138
NO CALIFICADOS	264	254	NO CALIFICADOS	39	48
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	72%	71%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	28%	29%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.141	1.548
EMPLEOS INDUCIDOS	254	344
<b>TOTAL EMPLEOS</b>	<b>1.395</b>	<b>1.892</b>

**GRACIAS**
