

# SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Junio 23 de 2021



# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**1.**

# SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

## OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

**\$175.603 millones**



Total de contratos:

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

**18 de obra**

**18**

**100%**

**13 de interventoría**

**13**

**100%**

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

## OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

**\$39.525 millones**

**17** →  
CONTRATOS

Total de contratos:

**13 de obra.**

**4 de interventoría.**

Ejecución

**12**

**4**

Contratación

**1**

**0**

Perfeccionamiento

**0**

**0**

% en Perfeccionamiento ejecución

**92,3%**

**100%**

**Inicio total de las obras de vías y alcantarillado:**

**30 de junio 2021**

**1.1**

# SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 4.201.825.861**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES  
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019  
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019  
Fecha de finalización actualizada por suspensión:  
: 12 - AGO – 2021



## TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

**CONSTRUCCIÓN** de muro de contención  
**77.20 ml** Pantalla inclinada **457 m3**

### Estado de la Obra:

La Alcaldía de Mocoa presenta acta de suspensión No. 03 al contrato de Obra No. 063 del 2019; esto sustentado en la falta de materiales en la zona, producto de los cierres viales que ha generado el paro nacional.

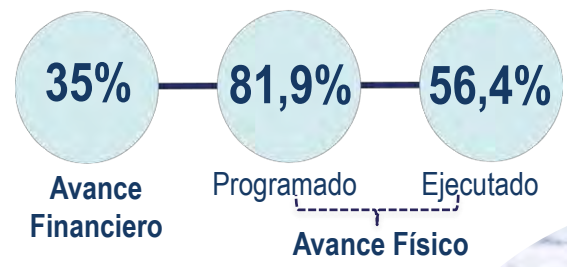

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960
Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa	Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



## ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 32.844.159.281,86**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020  
Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020  
Fecha de finalización actualizada: 14 - JUN - 2022




### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

**CONSTRUCCIÓN** de 1 Jarillón de **1050 ml**

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 99 Total Projectado: 100	Local 66 <b>67%</b>	Calificados 31 <b>47%</b>
		No Calificados 35 <b>53%</b>
	Foráneo 33 <b>33%</b>	Calificados 31 <b>94%</b>
		No Calificados 2 <b>6%</b>

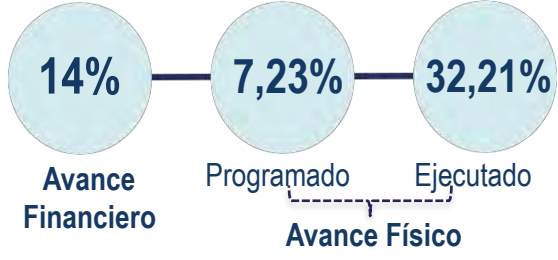

**45.589**  
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca



**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 4.706.751.939,00**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020  
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021  
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 24  
Total Projectado: 30

Local 19  
**79%**

Foráneo 5  
**21%**

Calificados 15

**79%**

No Calificados 4  
**21%**

Calificados 5

**100%**

No Calificados 0  
**0%**

**0,0%**

Avance  
Financiero

**11,30%**

Programado

**17,85%**

Ejecutado

Avance Físico



**45.589**

Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-1025-2020  
Valor: \$4.302.041.377,00

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO RECUPERACIÓN  
MOCOCA LH 2020

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-139-2020  
Valor: \$ 404.710.562,00  
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO HECAD VIAL

**Supervisor UNGRD**

Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



Construcción de colcho gaviones del muro No. 6



Conformación de mantenimiento de vías de acceso



**ALCANCE**

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 6.115.409.901,98**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020  
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021  
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**


**Obras Estabilización y recuperación**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

**Estado Actual:**

Se reinicia el contrato el **16/06/2021** y está en proceso de reprogramación de la obra. Una vez se cuente con lo anterior, se ajustará los porcentajes de programado vs lo ejecutado.

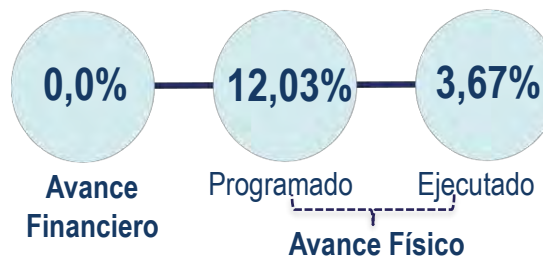

**45.589**  
**Personas beneficiadas**

<b>PERSONAL EN OBRA</b>	<b>Local 10</b> 83%	Calificados 10 100%
		No Calificados 0 0%
	<b>Foráneo 2</b> 17%	Calificados 2 100%
		No Calificados 0 0%
Total Obra: 12 Total Projectado: 30		



**Visita al sitio de obra.**



Reunión con la coord. de la reconstrucción de Mocoa, el subdirector para la reducción del riesgo, el representante de la vicepresidencia, la comunidad de José Homero Bajo, contratista e interventoría.

**ALCANCE**

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-980-2020</b> Valor: \$ 5.710.699.339,98	Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-139-2020</b> Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)
Nombre del Contratista: HAROLD MUÑOZ MUÑOZ	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 7.488.477.539,43**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021  
 Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021  
 Fecha de finalización actualizada: 07 - SEP - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**

**CONSTRUCCIÓN** de 2 diques

**Obra física:**

El contrato de Obra cuenta con PGS, PMA, PMT, PB y SST aprobados y entregados a la Interventoría. En la actualidad se está terminando de definir la implantación de las estructuras con los equipos especializados y los diseñadores para iniciar obra física.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 26  
 Total Projectado: 35

**Local 18  
 69%**

**Foráneo 8  
 31%**

Calificados 14  
**78%**

No Calificados 4  
**22%**

Calificados 8  
**100%**

No Calificados 0  
**0%**



**45.589**  
**Personas beneficiadas**



**ALCANCE**

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

Contrato de Obra  
 No. 9677-PPAL001-1334-2020  
 Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre del Contratista:  
 CONSORCIO RIO MULATO.

Contrato de Interventoría  
 No. 9677-PPAL001-141-2021  
 Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO INTERVENTORIA  
 RÍO MULATO

**Supervisor UNGRD**

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto  
**\$ 11.015.788.965,85**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES  
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020  
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021  
Fecha de finalización actualizada: 08 - JUL - 2022


### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 14 Total Projectado: 40	Local 12 <b>86%</b>	Calificados 8 <b>67%</b>
		No Calificados 4 <b>33%</b>
	Foráneo 2 <b>14%</b>	Calificados 2 <b>100%</b>
		No Calificados 0 <b>0%</b>

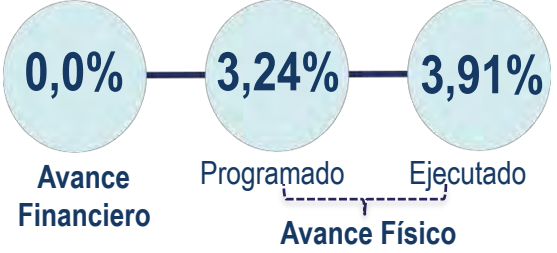

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
  - Muro 1
  - Azud 05
  - Muro 2
  - Azud 04
  - Muro 3

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 12.263.393.477,06**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 08 - SEP - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 16  
Total Projectado: 45

Local 12  
**75%**


Foráneo 4  
**25%**

Calificados 6  
**50%**

No Calificados 6  
**50%**

Calificados 4  
**100%**

No Calificados  
**0%**

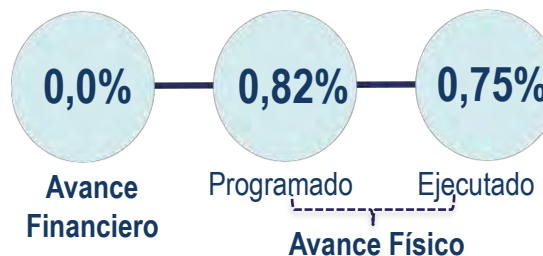

**45.589**  
Personas beneficiadas



Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-201-2021  
Valor: \$ 11.334.163.511,06

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO OBRAS DE  
PROTECCION 2020

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-344-2021  
Valor: \$ 929.229.966,00

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO MUROS  
MOCOA

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa

## ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 7.204.019.704,53**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15  
Total Projectado: 35

Local 11  
**73%**

Foráneo 4  
**27%**

Calificados 9

**82%**

No Calificados 2


**18%**

Calificados 3

**75%**

No Calificados 1

**25%**

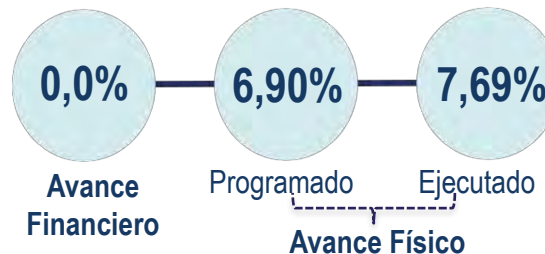

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-1388-2020  
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO DIQUE 1

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-345-2021  
Valor: \$ 536.303.878,1967  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Visita CGR



Control Topográfico



**ALCANCE**

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 6.827.896.668,28**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21  
Total Projectado: 35

Local 11  
**52%**


Foráneo 10  
**48%**

Calificados 6  
**55%**

No Calificados 5  
**45%**

Calificados 6  
**60%**

No Calificados 4  
**40%**

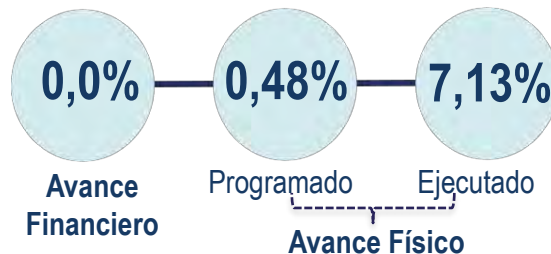

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.319.593.302,48 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO MURO RIO MOCOA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.303.365,8033 (para este contrato) <hr/> Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Reuniones con Comunidad del sector



Excavaciones



### ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 5.707.351.594,38**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020

Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5

Total Projectado: 35

Local: 3  
**60%**

Foráneo: 2  
**40%**


Calificados: 3

**100%**

No Calificados 0  
**0%**


Calificados : 2  
**100%**

No Calificados 0  
**0%**

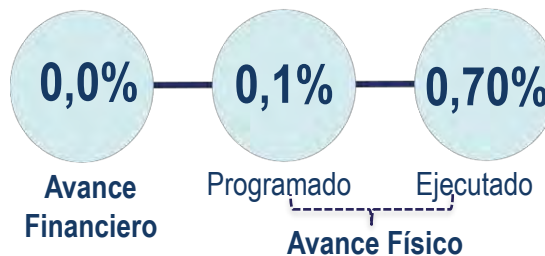

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1119-2020 Valor: \$ 5.280.966.838,95	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 426.384.755,43 (para este contrato)
Nombre del Contratista: A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	

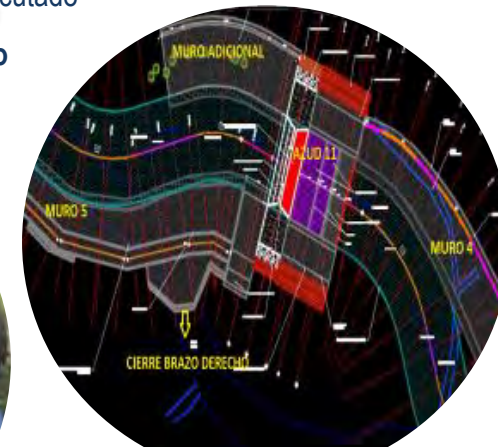

Adecuación de vías de acceso



**ALCANCE**

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 16.651.641.771,25**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020  
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021  
 Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de jarillón, azud y muros.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 8  
 Total Projectado: 45

Local: 4  
**50%**


Foráneo: 4  
**50%**

Calificados: 4  
**100%**

No Calificados 0  
**0%**

Calificados : 3  
**75%**

No Calificados 1  
**25%**

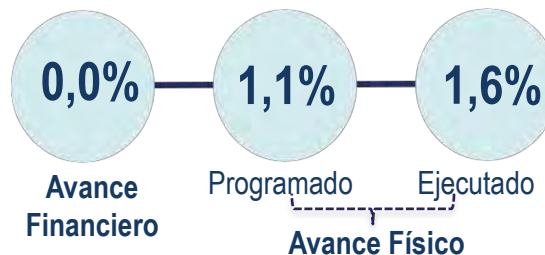

**45.589**  
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato)
Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



Construcción Dique Azud 13



**ALCANCE**

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 26.536.775.722,39**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 27 - OCT - 2022



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

### Estado Actual:

Se realizó reunión de socialización el día **21/06/2021**. El contratista de obra continúa realizando los ajustes requeridos por la interventoría a los documentos del PMT, PMA y Protocolo de Bioseguridad.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8  
Total Projectado: 61

Local 6

**75%**

Calificados 3

**50%**

No Calificados 3

**50%**

Foráneo 2

**25%**

Calificados 2

**100%**

No Calificados 0

**0%**



**45.589**

Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-1382-2020  
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO DRAGADO  
MOCOA 2020

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-205-2021  
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO  
INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

- Jarillón
- Espolones



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 2.943.285.850,62**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021  
Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021  
Fecha de finalización actualizada: 02 - NOV - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de azud.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 25  
Total Projectado: 37

Local: 12  
**48%**

Foráneo: 13  
**52%**

Calificados: 11

**92%**

No Calificados 1  
**8%**

Calificados : 13

**100%**

No Calificados 0  
**0 %**

0,0%

Avance  
Financiero

3,54%

Programado

2,34%

Ejecutado

Avance Físico



**45.589**

Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-311-2021  
Valor: \$ 2.723.478.287,36

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-110-2021  
Valor: \$ 219.807.563,26

(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 2.096.212.362,12**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones

**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto y muro de protección.

#### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 7

Total Projectado: 30

Local: 4  
**57%**

Foráneo: 3  
**43%**


Calificados: 4

**100%**

No Calificados 0  
**0%**

Calificados : 2  
**67%**

No Calificados 1  
**33%**

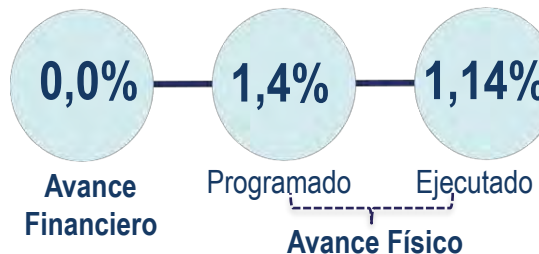

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



### ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 6.705.288.187,44**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021  
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021  
 Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


### IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.

#### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5  
 Total Projectado:30

Local: 1 <b>20%</b>	Calificados: 1 <b>100%</b>
	No Calificados 0 <b>0%</b>
Foráneo: 4 <b>80%</b>	Calificados : 4 <b>100%</b>
	No Calificados 0 <b>0%</b>

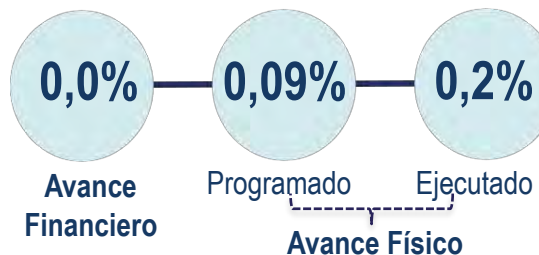

**45.589**  
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Actividades de desmonte y limpieza



### ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 8.991.999.385,27**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

**Plazo:** DIECIOCHO (18) MESES



**Fecha de suscripción:** Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

**Fecha acta de inicio:** Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Obras Estabilización y recuperación**

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

**Estado Actual:**

Esta obra cuenta con interventoría y contratistas de obra en sitio desde el **22/06/21** para iniciar el proceso de socialización y revisión de los estudios y diseños e iniciar localización de las obras.

**Contrato de Obra**  
 No. 9677-PPAL001-1342-2020  
 Valor: \$ 8.317.396.139,27

**Contrato de Interventoría**  
 No. 9677-PPAL001-098-2021  
 Valor: \$ 674.603.246,00

**Nombre del Contratista:**  
 CONSORCIO AZUD MOCOCA  
 520

**Nombre de la Interventoría:**  
 CONSORCIO INTERVENTORIA  
 MUROS MOCOCA 2020

**Supervisor UNGRD**  
 Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa

**45.589**  
**Personas beneficiadas**



**ALCANCE**

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 8.474.375.500,46**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: En proceso de perfeccionamiento

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

### Estado Actual:

Esta intervención cuenta con interventoría desde el **23/03/21** y se remitió a Fiduprevisora las pólizas para el respectivo perfeccionamiento y legalización, de esta manera poder dar inicio a las actividades de obra.

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-639-2021  
Valor: \$ 7.841.500.569,72

Nombre del Contratista:  
CONSORCIO CONSTRUOBRAS  
MOCOA

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-110-2021  
Valor: \$ 632.874.930,74

(para este contrato)  
Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
PUTUMAYO 2020


### Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



**45.589**

Personas beneficiadas

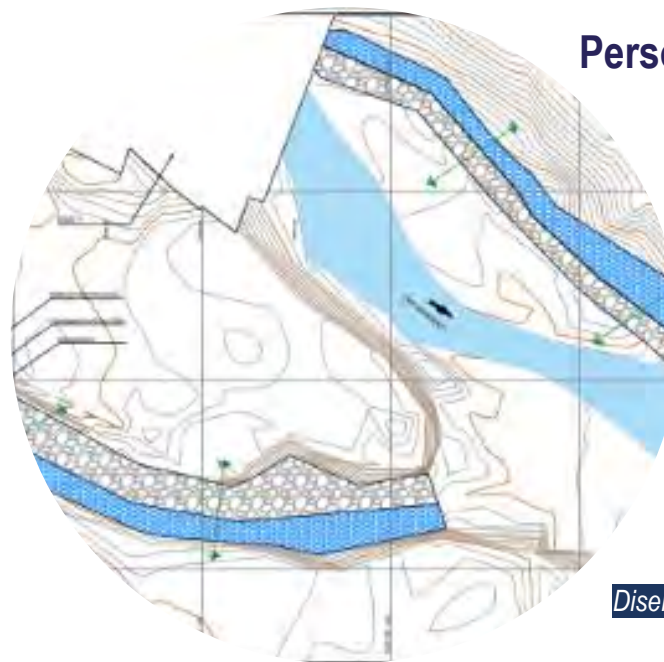

Diseño Muro 3



## ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 4.816.288.237,00**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: Se está a la espera de aclaración con Corpoamazonía para dar inicio.

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras de drenaje

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

**Estado Actual:**

En julio se definirá inicio de obras toda vez que se solicitó aclaraciones a Corpoamazonía sobre los estudios y diseños entregados.



Sector a intervenir



**45.589**

**Personas beneficiadas**

Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-183-2021</b> Valor: \$ 4.452.771.492,00	Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-743-2021</b> Valor: \$ 363.516.745,00
Nombre del Contratista: CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos



Detalles



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**1.2**

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y  
ALCANTARILLADO EN  
EJECUCIÓN**



**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 8.840.532.147**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES  
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021  
Fecha de finalización actualizada: 16 - ABR - 2022



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

**Estado Actual:**

Se realizó visita con profesionales de la alcaldía y el ejército para verificar uno de los tramos a intervenir, adicional hubo mesa de trabajo con el PMAMO, se está coordinando reunión con alcaldía y aguas Mocoa. Se firmó acta de inicio el **17/06/2021**.

<p>Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-366-2021</b> <b>Valor: \$ 8.272.681.997</b></p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> CONSORCIO VIAS MOCOCA 040</p>	<p>Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-555-2021</b> <b>Valor: \$ 567.850.150</b></p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER VIAS</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



*Mesa de trabajo con PMAMO*

**45.589**

**Personas beneficiadas**



*Reunión con alcaldía y ejército*



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

# 2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

## ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto  
**\$1.348.270.441**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES  
Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021  
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021  
Fecha de finalización actualizada por suspensión:  
18 - OCT – 2021



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

## IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

**Estado Actual:**  
El contrato se encuentra suspendido por motivos de orden nacional, sin embargo, la interventoría adelanta revisión del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad.

Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-378-2021</b> Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-551-2021</b> Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



*Tramos a intervenir*



 **45.589**  
Personas beneficiadas

 **ALCANCE**

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
  - Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

**\$ 2.485.717.595**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES  
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2** sectores

**Estado Actual:**

El contrato se encuentra suspendido por motivos de paro nacional.

Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-399-2021</b> Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-551-2021</b> Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



*Tramos a intervenir*

 **45.589**  
Personas beneficiadas



✓ **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
  - Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
  - Barrio Piñayaco Z4 – 3.
  - Barrio Piñayaco Z4 – 4.
  - Barrio Peñón Z5 – 1.
  - Barrio Peñón Z5 - 2B.
  - Barrio Peñón Z5 – 3.



**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 1.089.926.762**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

**Plazo:** CINCO (5) MESES

**Fecha de suscripción:** 19 – MAR - 2021

**Fecha acta de inicio:** 27 – ABR - 2021

**Fecha de finalización actualizada por suspensión:**

26 - OCT - 2021



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

**Estado Actual:**

El contrato se reinició el día **18/06/2021**, se adelantó visita técnica por parte de Corpoamazonia, debido a la presencia de árboles que afectan la sección del andén.



**45.589**

**Personas beneficiadas**

<p>Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-407-2021</b> <b>Valor: \$ 1.017.658.395</b></p> <hr/> <p><b>Nombre del Contratista:</b> ALEX ALBERTO CALVACHE MENA</p>	<p>Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-551-2021</b> <b>Valor: \$ 72.268.367</b></p> <hr/> <p><b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



*Visita Corpoamazonia*

**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-19

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

**\$ 3.025.192.404**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES  
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

**Estado Actual:**

El contrato se encuentra suspendido por motivos de paro nacional.


Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Sectores a intervenir

 **45.589**  
Personas beneficiadas



 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 1.291.868.311**

**EJECUTOR**


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión: 18 - NOV - 2021



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación de **1 vía**

**Estado Actual:**

Se reinició contrato el día **18/06/2021**, el contratista realiza acopio de material de tubería, geotextil, acero entre otros, para iniciar con la ejecución de la obra.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-518-2021 Valor: \$ 1.206.210.066	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 85.658.245
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL CAIMARON	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



**45.589**  
 Personas beneficiadas

Acopio de material

**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 2.887.755.648**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**  
 Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021  
 Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021  
 Fecha de finalización actualizada por suspensión:



18 - ENE - 2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

**Estado Actual:**

Se reinició contrato el día **18/06/2021**, se adelantó visita técnica por parte de Planeación para la verificación de líneas de paramentos.



*Recorrido con personal de Alcaldía*

**45.589**

**Personas beneficiadas**



Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-554-2021</b> Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-551-2021</b> Valor: \$ 191.474.688
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7ª.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**

**\$1.342.679.025**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES  
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021  
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021  
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



09 - ENE - 2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación de **1 vía**

**Estado Actual:**

El contrato se encuentra suspendido por motivos de orden nacional, sin embargo, la interventoría adelanta revisión del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad.



**45.589**

**Personas beneficiadas**

Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-636-2021</b> Valor: \$ 1.253.593.696	Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-551-2021</b> Valor: \$ 89.085.329
Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



*Tramo a ejecutar*



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma



**ACTORES E INVERSIÓN**


FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto  
**\$ 4.764.101.025**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES  
 Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021  
 Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

**Estado Actual:**  
 Visita técnica de obra para reconocimiento del sitio con interventoría y contratista.

<p><b>Contrato de Obra</b>                  No. 9677-PPAL001-532-2021                  Valor: \$ 4.268.718.305</p>	<p><b>Contrato de Interventoría</b>                  No. 9677-PPAL001-774-2021                  Valor: \$ 495.382.720</p>
<p><b>Nombre del Contratista:</b>                  CONSORCIO PAVIMENTOS                  MOCOCA</p>	<p><b>Nombre de la Interventoría:</b>                  CONSORCIO                  INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p><b>Supervisor UNGRD</b>                  Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



 **45.589**  
 Personas beneficiadas



 **ALCANCE**

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 1.960.337.973**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: No cuenta aún con fecha

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

## IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

### Estado Actual:


No se ha dado inicio al contrato de obra ya que el contrato de interventoría se encuentra suspendido, sin embargo, se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.

**45.589**

Personas beneficiadas

Contrato de Obra <b>No. 9677-PPAL001-549-2021</b> Valor: <b>\$1.830.025.649</b> Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOAC CONSTRUCCIONES	Contrato de Interventoría <b>No. 9677-PPAL001-551-2021</b> Valor: <b>\$ 130.312.324</b> (Para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	

"Estructura de placa huella considerada"

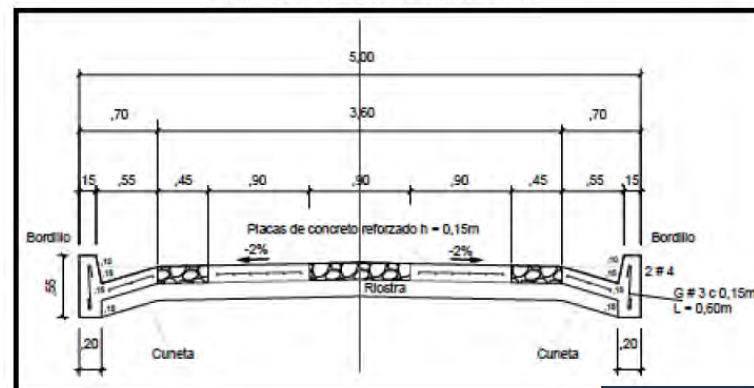

Detalle de Placa Huella



## ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 1.769.435.891**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**  
 Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021  
 Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

**Estado Actual:**

No se ha dado inicio al contrato de obra ya que el contrato de interventoría se encuentra suspendido, sin embargo, se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.970.234 ----- <b>Nombre del Contratista:</b> DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato) ----- <b>Nombre de la Interventoría:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
<b>Supervisor UNGRD</b> Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

**45.589**

**Personas beneficiadas**



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 6.644.745.708,94**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.


#### Estado Actual:

No se ha dado inicio al contrato de obra ya que el contrato de interventoría se encuentra suspendido, sin embargo, se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.

**45.589**

**Personas beneficiadas**

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.241.228.546	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897	Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	

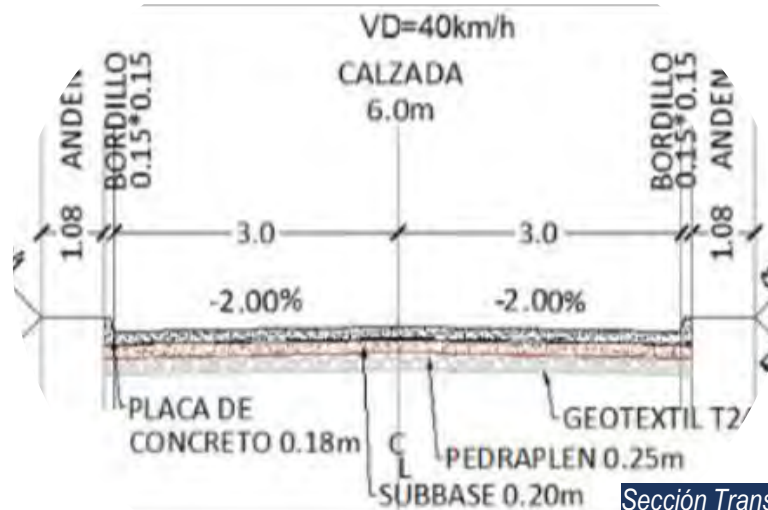

Sección Transversal Típica



### ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco


**1.3**

# SEGUIMIENTO VÍAS Y ALCANTARILLADO



1

Mejoramiento de la vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

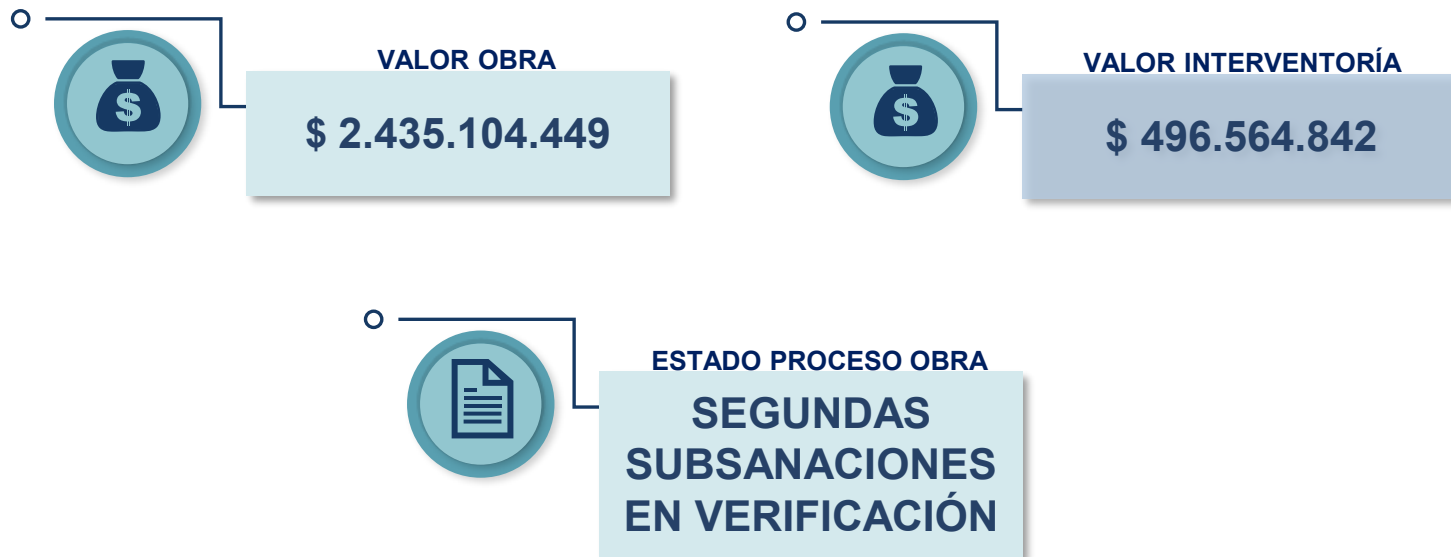

**2.**

# SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

# VIVIENDA URBANA SAUCES II

## CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones

\*Avance



30,09%

Avance financiero



0%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%



0%

total de  
viviendas



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

\*Avance estudios, diseños y construcción preliminares primera fase constructiva del proyecto.

Avance a trámite de desembolso \$1.400 mill.

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$ 4.852 millones

Avance financiero

30,05%

## CRONOGRAMA

FECHA DE  
TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



519

909

PERSONAL  
PROYECTADO



82

## ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Continúa movimiento de tierras 13.268,30 m<sup>3</sup> de tierra (incluido expansión).
- A la espera y seguimiento RTA CORPOAMAZONIA ronda hídrica.
- El consorcio realizó la respectiva reprogramación para cumplir con los tiempos establecidos en el cumplimiento de la obra.
- Vinculación Director de Obra, Residente Ambiental pendiente, Residente Social vinculado.
- Contratación de otra cuadrilla de maquinaria amarilla.
- En espera de municipio, expedición resolución de cesión predio polideportivo.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	9	1	10
No calificado	16	0	16
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>





## VIVIENDAS URBANAS

Nº DE VIVIENDAS



**87**

INVERSIÓN



**5.764 millones**

valor otorgado por FONVIVIENDA a través del Convenio No. 9677-PPAL001-783-2018



### AVANCES

- De acuerdo a cronograma, a **30/06/21** se entregan todos los documentos técnicos precontractuales al área de contratos **UNGRD** para continuar trámite de contratación:
  - **Obra** (estudios, diseños, licencias, contradicción y entrega vis).
  - **Interventoría** (seguimiento).

## VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO

Nº DE VIVIENDAS



**37**

INVERSIÓN



**\$3.850.882.740,00\***



### AVANCES

- Mocoa Disperso:** el **28/06/21** se radicará finalmente en Gestión contractual de la UNGRD, el proceso de contratación ajustado para revisión y publicación. El día **20/06/21** se realizó socialización del proyecto en donde participó el alcalde municipal con su equipo, beneficiarios, veedores y la UNGRD quien lideró la misma.
- Mocoa Nucleada:** se obtuvieron por parte de la alcaldía los certificados de disponibilidad de servicios del proyecto exigidos por el **BAC**, se sigue trabajando en las subsanaciones de la documentación de **108** beneficiarios en conjunto con la alcaldía encargada de este trámite, esto permitirá de manera rápida poder transferir la propiedad de los lotes a los **217** beneficiarios y presentar el paquete completo al **BAC** (requerimiento del banco) obteniendo viabilidad de los beneficiarios, mientras SPIA realiza los ajustes al prototipo de vivienda, lo que permitirá obtener el aval definitivo del proyecto e iniciar el proceso de contratación.

## VIVIENDA RURAL NUCLEADA

Nº DE VIVIENDAS



**215**

INVERSIÓN



Urbanismo **6.453 mill**  
Vivienda **13.500 mill**  
PTAR: **1.500 mill**  
Subestación eléctrica: **3.500 mill**  
Total: **\$ 24.953 millones**

**\$9.516.549.300** En convenio con Banco

**\$15.436.450.700** Recursos faltantes



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**3.**

## SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

**\$ 11.194 millones**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018

Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018

Fecha de finalización actualizada por suspensión:

12 - SEP - 2021



## TIPO DE INTERVENCIÓN

**CONSTRUCCIÓN** de infraestructura educativa.


## IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

### Estado Actual:

El proyecto cuenta con ampliación de la suspensión por dos meses contados a partir de **12/06/21** hasta **12/08/21**

\*Una vez se priorice las órdenes de despacho de los materiales y se cuente con el transporte para llevar material al sitio se reiniciará la obra.

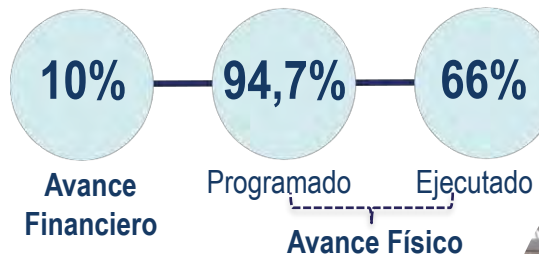

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-225-2018  
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:  
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-228-2018  
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:  
INGEVAL S.A.S.

**Supervisor UNGRD**  
Yineth Arinda Cumplido Botello –  
Subdirección para la Reducción del Riesgo

# PROYECTO PLAZA DE MERCADO

**INVERSIÓN**  
**\$6.000.000,00\***

\*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.




## PLAZA DE MERCADO

**PERSONAL PROYECTADO: 56**



## AVANCES

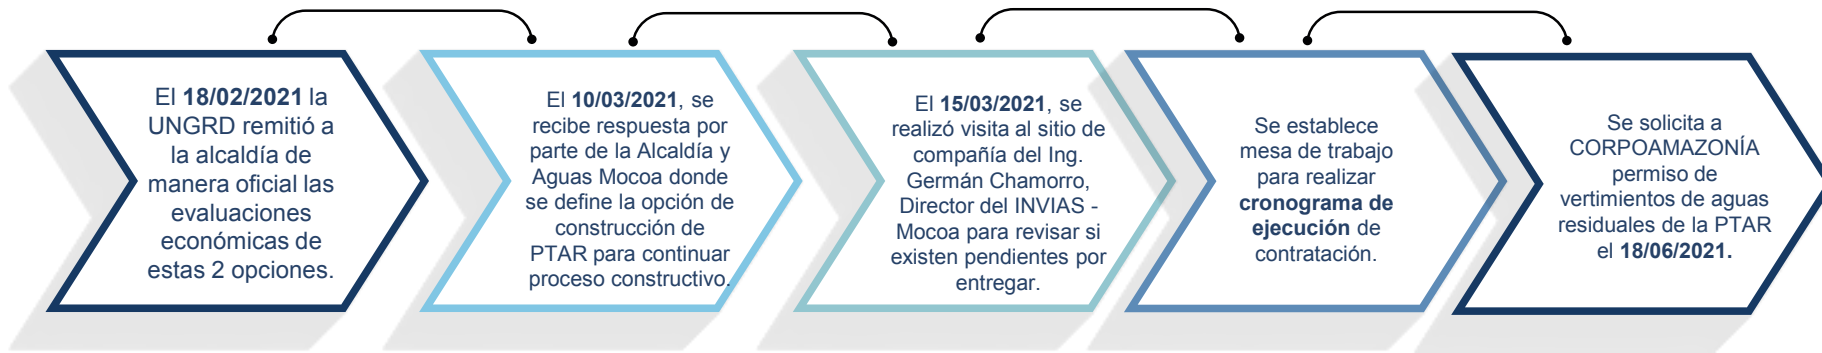

## CRONOGRAMA





## COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO



### AVANCES



### INVERSIÓN

**\$ 1.257.921.000,00\* lote**

**\$ 80.000.000.000,00 Construcción**

\* Estos recursos serán gestionados por el FNGRD para su adquisición.



# RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOA

## OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA

### ETAPA

1

#### ALCANCE

- Construcción bocatoma.
- Construcción de desarenador de alta tasa y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12
ESTADO	Terminado



#### ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente 107 l/s
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". Las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

### ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% AVANCE EJECUTADO	0%
% AVANCE PROGRAMADO	0%
ESTADO	En ejecución






El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**4.**

**GENERACIÓN DE EMPLEO**

# GENERACIÓN DE EMPLEO

	<b>OBRAS EN EJECUCIÓN</b>	<b>32</b>
	<b>EMPLEO GENERADO A LA FECHA</b>	<b>311</b>
	<b>PERSONAL PROYECTADO</b>	<b>802</b>

	16/06/21	23/06/21		16/06/21	23/06/21
<b>MANO DE OBRA LOCAL</b>	<b>206</b>	<b>214</b>	<b>MANO DE OBRA FORÁNEA</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
CALIFICADOS	135	134	CALIFICADOS	87	88
NO CALIFICADOS	71	80	NO CALIFICADOS	13	9
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	67%	69%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	33%	31%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
<b>EMPLEOS INDIRECTOS</b>	<b>560</b>	<b>1.444</b>
<b>EMPLEOS INDUCIDOS</b>	<b>124</b>	<b>321</b>
<b>TOTAL EMPLEOS</b>	<b>684</b>	<b>1.765</b>



**GRACIAS**

