

# SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Mayo 26 de 2021



# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**1.**

# SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

## OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

**\$175.603 millones**



Total de contratos:

**18 de obra**

Ejecución

**18**

% en Perfeccionamiento ejecución

**100%**

**13 de interventoría**

**13**

**100%**

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

## OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

**\$39.525 millones**

**17**  
CONTRATOS



Total de contratos:

**13 de obra.**

**4 de interventoría.**

Ejecución

**10**

**3**

Contratación

**2**

**1**

Perfeccionamiento

**1**

**0**

% en Perfeccionamiento ejecución

**84,6%**

**75,0%**

**Inicio total de las obras de vías y alcantarillado:**

**30 de mayo 2021**

**1.1**

# SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –  
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 4.201.825.861**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra,  
Interventoría y supervisión



Plazo. VEINTRES MESES (23) MESES

Inicio: 27 JUNIO DE 2019

Terminación: 14 DE JUNIO 2021

## TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

**CONSTRUCCIÓN** de Muro de contención  
77.20 ml Pantalla inclinada 457 m3

### Estado de la Obra:

La Alcaldía de Mocoa presenta acta de suspensión No. 03 del contrato de Obra No. 063 del 2019; esto sustentado en la falta de materiales en la zona, producto de los cierres viales que ha generado el paro nacional.

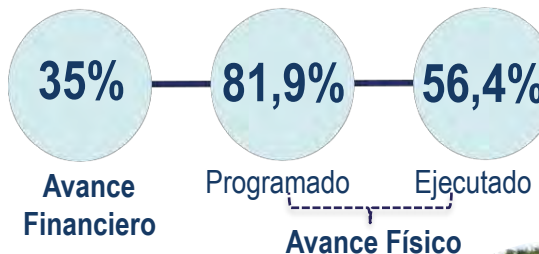

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
Contrato No. 063 del 2019  
Valor: \$ 3.841.235.901

Nombre de Contratista:  
Virgilio Bravo Sosa

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-261-2019  
Valor: \$ 360.589.960

Nombre de la Interventoría:  
Yahara Maritza Viveros Ortiz

Supervisor UNGRD

Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Anclajes

## ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR –  
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 32.844.159.281,86**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Obra,



Interventoría  
 Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
 Inicio: 15 DICIEMBRE DE 2020  
 Terminación: 14 DE JUNIO DE 2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**

**CONSTRUCCIÓN** de 1 Jarillón de  
**1050 ml**

**PERSONAL EN  
 OBRA**

Total Obra: 93  
 Total Projectado: 100

Local 65  
**70%**

Foráneo 28  
**30%**

Calificados 32  
**49%**

No Calificados 33  
**51%**

Calificados 26  
**93%**

No Calificados 2  
**7%**

Contrato de Obra  
 No. 9677-PPAL001-977-2020

Valor: \$ 30.418.456.852,86

Nombre de Contratista:  
 INGECON SA


Contrato de Interventoría  
 No. 9677-PPAL001-1365-2020

Valor: \$ 2.425.702.429,00

Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO INTER  
 JARILLON 2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa

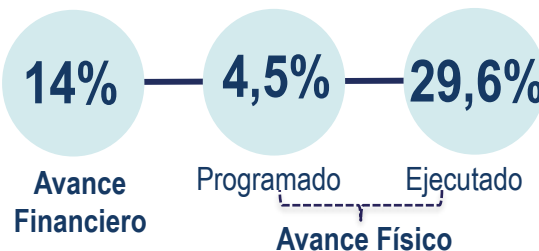

**45.589**

Personas beneficiadas



**ALCANCE**

Jarillón 1 - Quebrada Taruca



El futuro  
 es de todos

Presidencia  
 de la República

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto



### \$ 4.712.977.508,12

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD :     Interventoría  
  Obra



Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
Inicio: **12 DE FEBRERO DE 2021**  
Terminación: **11 DE ABRIL DE 2022**


## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 24 Total Projectado: 30	Local 19 <b>79%</b>	Calificados 15 <b>79%</b>
		No Calificados 4 <b>21%</b>
	Foráneo 5 <b>21%</b>	Calificados 5 <b>100%</b>
		No Calificados 0 <b>0%</b>

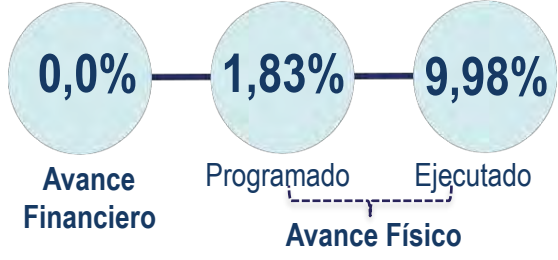


45.589  
**Personas beneficiadas**

Contrato de Obra  
**No. 9677-PPAL001-1025-2020**  
**Valor: \$4.302.041.377,00**  
 -----  
**Nombre de Contratista:**  
 CONSORCIO RECUPERACIÓN  
 MOCOA LH 2020

Contrato de Interventoría  
**No. 9677-PPAL001-139-2020**  
**Valor: \$ 404.710.562,00**  
**(valor para este contrato)**  
 -----  
**Nombre de la Interventoría:**  
 CONSORCIO HECAD VIAL

**Supervisor UNGRD**  
 Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



Aumento del caudal del río Mulato sin afectación sobre la obra



Excavación e instalación de malla gavión y geotextil

✓

## ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 6.115.409.901,98**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría  
Obra



Plazo: **CATORCE (14) MESES**  
Inicio: **12 DE FEBRERO DE 2021**  
Terminación: **11 DE ABRIL DE 2022**

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**


Este contrato desarrollará **3** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

**Estado Actual:** No se registra avance físico de obra para esta semana toda vez que la misma está en trámite de suspensión desde el pasado **14/05/21**, fecha en la cual el contratista de obra solicita suspensión. Por lo anterior, los datos de avance registrados son los mismos de la semana anterior.

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 12  
Total Projectado: 30

Local 10 <b>83%</b>	Calificados 10 <b>100%</b>
	No Calificados 0 <b>0%</b>
Foráneo 2 <b>17%</b>	Calificados 2 <b>100%</b>
	No Calificados 0 <b>0%</b>

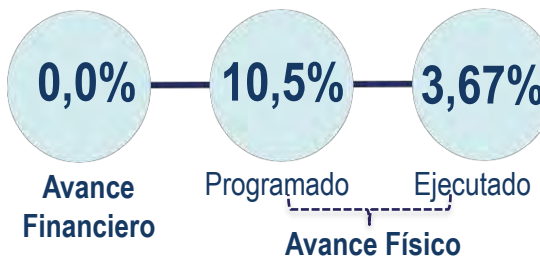

**45.589**  
Personas beneficiadas



**ALCANCE**

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-980-2020  
Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre de Contratista:  
HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-139-2020  
Valor: \$ 404.710.562,00  
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO HECAD VIAL

**Supervisor UNGRD**

Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



El futuro es de todos

Presidencia de la República



# 5 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 1 Y DIQUE ABIERTO 2, SECTOR RÍO MULATO

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
 – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 7.488.477.539,43**



## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
 Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 08 DE MARZO DE 2021

Terminación: 07 DE SEPTIEMBRE 2022

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

**CONSTRUCCIÓN** de 2 diques

### Obra física:

Se avanza con el ajuste del PMA y con el trabajo del inventario forestal para poder realizar desmonte y limpieza en los frentes de trabajo, se continua con la realización de las actas de vecindad y la conformación del equipo de gestión social.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26  
 Total Projectado: 35

Local 18  
**69%**

Foráneo 8  
**31%**

Calificados 14  
**78%**

No Calificados 4  
**22%**

Calificados 8  
**100%**

No Calificados 0  
**0%**



**45.589**  
 Personas beneficiadas



## ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

Contrato de Obra  
 No. 9677-PPAL001-1334-2020  
 Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre de Contratista:  
 CONSORCIO RIO MULATO.

Contrato de Interventoría  
 No. 9677-PPAL001-141-2021  
 Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO INTERVENTORIA  
 RÍO MULATO.

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



El futuro  
 es de todos

Presidencia  
 de la República

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 11.015.788.965,85**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: DIECISEIS (16) MESES  
Inicio: 9 DE MARZO DE 2021  
Terminación: 8 DE JULIO 2022

### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 14 Total Projectado: 40	Local 12	Calificados 8
	86%	67%
		No Calificados 4
		33%
	Foráneo 2	Calificados 2
14%	100%	
		No Calificados 0
		0%



Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-988-2020  
Valor: \$ 10.192.609.812,85

Nombre de Contratista:  
CDF INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-116-2021  
Valor: \$ \$ 823.179.153,00

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERDIQUE  
2020

Supervisor UNGRD  
Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



### ALCANCE

- Dique Abierto 3
- Muro 1
- Azud 05
- Muro 2
- Azud 04
- Muro 3

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 12.263.393.477,06**



## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: **DIECIOCHO (18) MESES**

Inicio: **9 DE MARZO DE 2021**

Terminación: **8 DE SEPTIEMBRE 2022**

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

### Estado Actual:

Se avanza con la realización de las actas de vecindad, con el trabajo de conformación del grupo de gestión social. Se ajusta PMA para dar cumplimientos a los términos de referencia, se realizan trabajos de cerramiento sobre los frentes de trabajo.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 16  
Total Projectado: 45

Local 12  
**75%**

Foráneo 4  
**25%**

Calificados 6

**50%**

No Calificados 6

**50%**

Calificados 4

**100%**

No Calificados

**0%**



**45.589**

Personas beneficiadas



## ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-201-2021  
Valor: \$ 11.334.163.511,06

---

Nombre de Contratista:  
CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-344-2021  
Valor: \$ 929.229.966,00

---

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO MUROS MOCOCA

**Supervisor UNGRD**  
Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 7.204.019.704,53**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: **DIECIOCHO (18) MESES**  
Inicio: **12 DE MARZO DE 2021**  
Terminación: **11 DE SEPTIEMBRE 2022**

### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15  
Total Projectado: 35

Local 11  
**73%**

Foráneo 4  
**27%**

Calificados 9

**82%**

No Calificados 2

**18%**

Calificados 3

**75%**

No Calificados 1

**25%**

0,0%

Avance  
Financiero

5,1%

Programado

6,5%

Ejecutado

Avance Físico



**45.589**

Personas beneficiadas



Manejo de aguas  
de escorrentía



Movimiento de Tierra

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-1388-2020  
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre de Contratista:  
CONSORCIO DIQUE 1

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-345-2021  
Valor: \$ 536.303.878,1967  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



**ALCANCE**

- Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 6.827.896.668,28**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra

 Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Inicio: 12 DE MARZO DE 2021  
Terminación: 11 DE SEPTIEMBRE 2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto

**PERSONAL EN OBRA**

Total Obra: 21  
Total Projectado: 35

Local 11  
**52%**

Calificados 6

**55%**

No Calificados 5

**45%**


Foráneo 10  
**48%**

Calificados 6

**60%**

No Calificados 4

**40%**

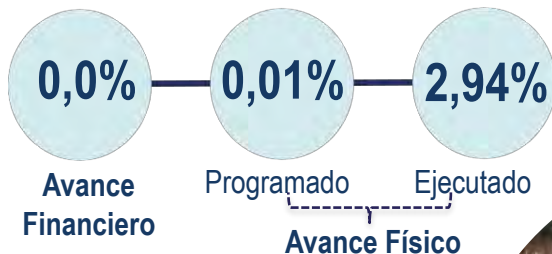

 **45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-1023-2020  
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre de Contratista:  
CONSORCIO MURO RIO  
MOCOCA

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-345-2021  
Valor: 508.303.365,8033  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
MOCOCA 2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mococa



**ALCANCE**

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR  
 – MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

**\$ 5.707.351.594,38**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
 Obra



Plazo: **DIECIOCHO (18) MESES**  
 Inicio: 16 DE MARZO DE 2021  
 Terminación: 15 DE SEPTIEMBRE 2022


**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **3** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros.

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 5 Total Projectado: 35	Local: 3 <b>60%</b>	Calificados: 3 <b>100%</b>
		No Calificados 0 <b>0%</b>
	Foráneo: 2 <b>40%</b>	Calificados : 2 <b>100%</b>
		No Calificados 0 <b>0%</b>

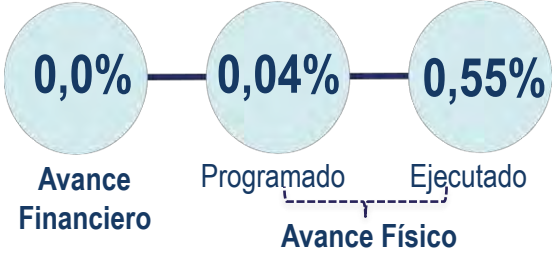

**45.589**  
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
 No. 9677-PPAL001-1119-2020  
 Valor: \$ 5.280.966.838,95

---

Nombre de Contratista:  
 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría  
 No. 9677-PPAL001-154-2021  
 Valor: \$ 426.384.755,43  
 (para este contrato)

---

Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCHA

**Supervisor UNGRD**  
 Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mococho



**ALCANCE**

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 16.651.641.771,24**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: **DIECIOCHO (18) MESES**

Inicio: **16 DE MARZO DE 2021**

Terminación: **15 DE SEPTIEMBRE 2022**

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8

Total Projectado: 45

Local: 4  
**50%**

Foráneo: 4  
**50%**

Calificados: 4

**100%**

No Calificados 0


**0%**

Calificados : 3

**75%**

No Calificados 1

**25%**

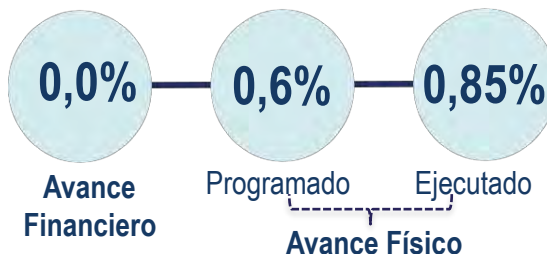

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-1064-2020  
Valor: \$ 15.407.631.114,68

Nombre de Contratista:  
UNIÓN TEMPORAL OBRAS  
RIO SANGOYACO 2020

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-154-2021  
Valor: \$ 1.244.010.656,57  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORES  
DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



## ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 26.536.775.722,39**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Inicio: 28 DE ABRIL DE 2021  
Terminación: 27 DE OCTUBRE 2022

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

### Estado Actual:

Se continua tramitando permisos de servidumbre.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8  
Total Proyectado: 61

Local 6 <b>75%</b>	Calificados 3 <b>50%</b>
	No Calificados 3 <b>50%</b>
Foráneo 2 <b>25%</b>	Calificados 2 <b>100%</b>
	No Calificados 0 <b>0%</b>



 **45.589**  
Personas beneficiadas



### ✓ ALCANCE

- Jarillón
- Espolones

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-1382-2020  
Valor: \$ 24.574.127.979,39

---

Nombre de Contratista:  
CONSORCIO DRAGADO MOCOA  
2020

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-205-2021  
Valor: \$ 1.962.647.743,00

---

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERDRAGADOS  
MOCOA

Supervisor UNGRD  
Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

**\$ 2.943.285.850,62**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 03 DE MAYO DE 2021

Terminación: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

### TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención  
**CONSTRUCCIÓN** de azud.

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25  
Total Projectado: 37

Local: 12  
**48%**

Foráneo: 13  
**52%**

Calificados: 11  
**92%**

No Calificados 1  
**8%**

Calificados : 13  
**100%**

No Calificados 0  
**0%**



**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-311-2021  
Valor: \$ 2.723.478.287,36

Nombre de Contratista:  
CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-110-2021  
Valor: \$ 219.807.563,26  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mococho



Ubicación Azud 10- Río Sangoyaco



Comité Técnico



**ALCANCE**

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCHA

**Valor total del proyecto**

**\$ 2.096.212.362,12**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES  
Inicio: 15 DE ABRIL DE 2021  
Terminación: 14 DE OCTUBRE DE 2022


## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

### IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de dique abierto y muro protección

<b>PERSONAL EN OBRA</b> Total Obra: 7 Total Projectado: 30	Local: 4	Calificados: 4
	<b>57%</b>	<b>100%</b>
		No Calificados 0
		<b>0%</b>
	Foráneo: 3	Calificados : 2
<b>43%</b>	<b>67%</b>	No Calificados 1
		<b>33%</b>

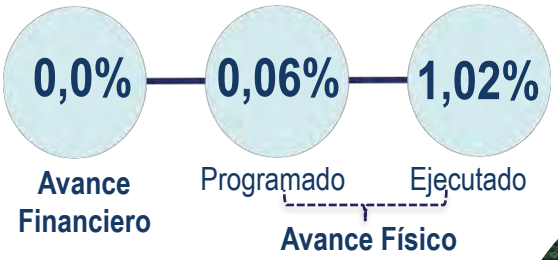

**45.589**  
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45 <hr/> Nombre de Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato) <hr/> Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCHA 2020
<b>Supervisor UNGRD</b> Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



**ALCANCE**

- Azud 15
- Muro 09

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 6.705.288.187,44**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 15 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 14 DE OCTUBRE DE 2022

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro

### PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5  
Total Projectado: 30

Local: 1  
**20%**

Foráneo: 4  
**80%**

Calificados: 1  
**100%**

No Calificados 0  
**0%**

Calificados : 4  
**100%**

No Calificados 0  
**0%**

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-323-2021  
Valor: \$ 6.202.006.626,11


Nombre de Contratista:  
CONSORCIO EVI5

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-133-2021  
Valor: \$ 503.281.561,33  
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTER – MOCOA  
2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa

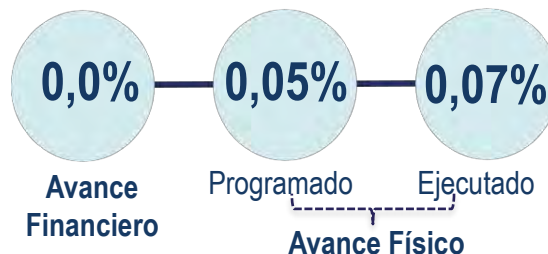

**45.589**  
Personas beneficiadas



## ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 8.991.999.385,27**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Inicio: 23 DE MARZO DE 2021

Terminación: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

## IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

### Estado Actual:

Verificación del Plan de Gestión ambiental, Plan de Manejo de Tránsito y Plan de Gestión Social. Se presentó el **14/04/21** a interventoría y se devolvió para ajustes; se entrega el próximo **01/06/21**

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-1342-2020  
Valor: \$ 8.317.396.139,27

Nombre de Contratista:  
CONSORCIO AZUD MOCOCA 520

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-098-2021  
Valor: \$ 674.603.246,00

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
MUROS MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD  
Ing. Brenda Karin Peña



## ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



**45.589**

Personas beneficiadas



Ubicación Dique azud 8 Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR  
 – MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 8.474.375.500,46**



**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría

Obra



Plazo: **DIECIOCHO (18) MESES**

Inicio: **6 DE MAYO DE 2021**

Terminación: **6 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras Estabilización y recuperación

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **5** intervenciones  
**CONSTRUCCIÓN** de azud y muros

**Estado Actual:**

En elaboración de PMT, PMA, cronograma de obra, permisos de protocolos de bioseguridad, plan de gestión social.



**45.589**

**Personas beneficiadas**

Contrato de Obra  
 No. 9677-PPAL001-639-2021  
 Valor: \$ 7.841.500.569,72

Nombre de Contratista:

CONSORCIO  
 CONSTRUOBRAS MOCOCA

Contrato de Interventoría  
 No. 9677-PPAL001-110-2021  
 Valor: \$ 632.874.930,74  
 (para este contrato)

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTERVENTORIA  
 PUTUMAYO 2020

**Supervisor UNGRD**

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mococa



**ALCANCE**

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.



*Ubicación Muro 3 -Río Sangoyaco*



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto  
**\$ 4.816.288.237,00**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: DOCE (12) MESES  
Contrato de interventoría  
Perfeccionado: 11 DE MAYO DE 2021

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras de Drenaje

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

**Estado Actual:**

Revisión de información técnica, planos localización y detalles, así mismo estudios y diseños.

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-183-2021  
Valor: \$ 4.452.771.492,00

Nombre de Contratista:  
CONSTRUVAL  
INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-743-2021  
Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INGENIERÍA  
DE MITIGACIÓN

**Supervisor UNGRD**

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mococho




**ALCANCE**

**Construcción:**

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos


**45.589**

**Personas beneficiadas**

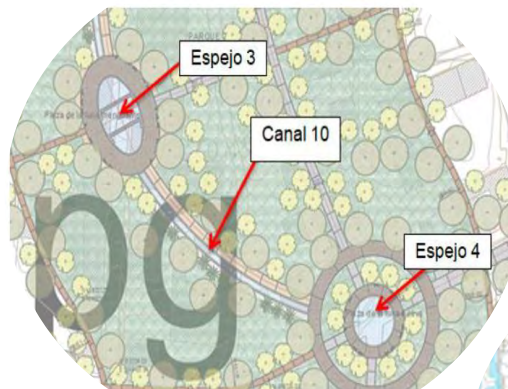

Ubicación obra 4-3. Ubicación canal 10, espejos 3 y 4.

**Ubicación de obra de drenaje**

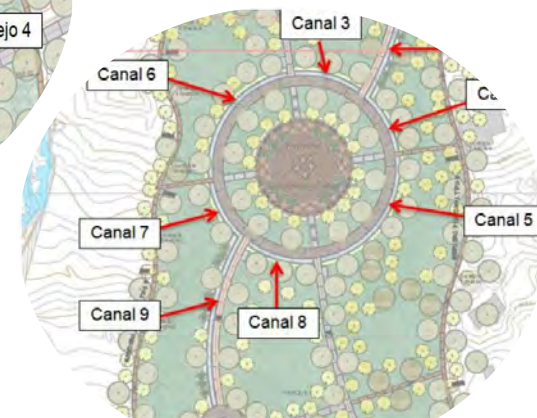

Ubicación obra 4-2. Ubicación canales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.



El futuro es de todos

Presidencia de la República

**1.2**

# SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto  
**\$ 8.840.532.147**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES  
Inicio: 7 DE ABRIL DE 2021  
Terminación: 7 DE FEBRERO DE 2022

### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

**Estado Actual:**  
Se realizó revisión y verificación de las ubicaciones de las vías indicadas en el objeto del contrato con las coordenadas registradas en la localización e informe de topografía del paquete técnico entregado por la Alcaldía de Mocoa.  
  
Pendiente por firmar acta de inicio.

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-366-2021  
Valor: \$ 8.272.681.997

---

Nombre de Contratista:  
CONSORCIO VIAS MOCOCA 040

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-555-2021  
Valor: \$ 567.850.150

---

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTER VIAS

Supervisor UNGRD  
Ing. Natalia Cárdenas



 **45.589**  
Personas beneficiadas



Visitas e identificación de los tramos a intervenir

 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$1.348.270.441**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: CUATRO (4) MESES

Inicio: 19 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 18 DE AGOSTO DE 2021

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería  
de aguas lluvias y sanitarias

## IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

### Estado Actual:

La fase preliminar está terminada al **100%**.

Aprobado PMT, topografía y coordenadas. Se gestiona con el alcalde posibilidades de suministrar combustible a las obras.

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-378-2021  
Valor: \$ 1.258.851.707

Nombre de Contratista:  
JAVIER GUSTAVO OSPINA

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-551-2021  
Valor: \$ 89.396.558

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTER 5HG

### Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Tramos a intervenir

**45.589**

Personas beneficiadas



Valla instalada

## ALCANCE

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario :

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaverál y Prado Norte.

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR  
 – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 2.485.717.595**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
 Obra

Plazo: **SEIS (6) MESES**  
 Inicio: 13 DE ABRIL DE 2021  
 Terminación: 12 DE OCTUBRE DE 2021

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

**Estado Actual:**  
 La fase preliminar está terminada al **100%**.  
 Aprobado PMT, topografía y coordenadas. Se gestiona con el alcalde posibilidades de suministrar combustible a las obras.

Contrato de Obra  
**No. 9677-PPAL001-399-2021**  
 Valor: \$ 2.320.900.325

---

Nombre de Contratista:  
 CONSORCIO NOMADAS  
 PUTUMAYO

Contrato de Interventoría  
**No. 9677-PPAL001-551-2021**  
 Valor: \$ 164.817.270

---

Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO INTER 5HG

**Supervisor UNGRD**  
 Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Revisión sector a intervenir

**45.589**  
**Personas beneficiadas**

**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto



**\$ 1.089.926.762**

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: CINCO (5) MESES  
Inicio: 27 DE ABRIL DE 2021  
Terminación: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

## IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

**Estado Actual:**  
La fase preliminar está terminada al **100%**.  
Aprobado PMT, topografía y coordenadas. Se gestiona con el alcalde posibilidades de suministrar combustible a las obras.  
Se realizó socialización del proyecto con la comunidad el día **19/05/2021**.



Socialización del proyecto



**45.589**

Personas beneficiadas

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-407-2021  
Valor: \$ 1.017.658.395

---

Nombre de Contratista:  
ALEX ALBERTO CALVACHE  
MENA

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-551-2021  
Valor: \$ 72.268.367

---

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTER 5HG

**Supervisor UNGRD**  
Eliana Montes Peña– Reconstrucción Mocoa



## ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

### ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 3.025.192.404**

### EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
Obra



Plazo: **SEIS (6) MESES**

Inicio: 7 DE ABRIL DE 2021

Terminación: 7 DE OCTUBRE DE 2021

### TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

### IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

**Estado Actual:**  
La fase preliminar está terminada al **100%**.  
Aprobado PMT, topografía y coordenadas. Se gestiona con el alcalde posibilidades de suministrar combustible a las obras.



Revisión sector a intervenir

**45.589**  
Personas beneficiadas



Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-492-2021  
Valor: \$ 2.824.604.874

---

Nombre de Contratista:  
CONSORCIO VIAS DE MOCOA

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-551-2021  
Valor: \$ 200.587.530

---

Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTER 5HG

**Supervisor UNGRD**  
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

### ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.
- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOCA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 1.291.868.311**



**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría  
Obra



**Plazo: SEIS (6) MESES**

**Inicio: 19 DE ABRIL DE 2021**

**Terminación: 18 DE OCTUBRE DE 2021**

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

**Mejoramiento de Vías Urbanas**

**IMPACTO**

**Pavimentación de 1 vía**

**Estado Actual:**

La fase preliminar está terminada al **100%**.

Aprobado PMT, topografía y coordenadas. Se gestiona con el alcalde posibilidades de suministrar combustible a las obras.

Se adelanta levantamiento de actas de vecindad.



*Levantamiento actas de vecindad*



**45.589**

**Personas beneficiadas**



**Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-518-2021  
Valor: \$ 1.206.210.066**

**Nombre de Contratista:  
UNION TEMPORAL CAIMARON**

**Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-551-2021  
Valor: \$ 85.658.245**

**Nombre de la Interventoría:  
CONSORCIO INTER 5HG**

**Supervisor UNGRD**

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.



**ALCANCE**



**El futuro es de todos**

Presidencia de la República

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR  
– MUNICIPIO DE MOCOA**

**Valor total del proyecto**

**\$ 2.887.755.648**



**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría  
Obra



**Plazo:** OCHO (8) MESES  
**Inicio:** 19 DE ABRIL DE 2021  
**Terminación:** 18 DE DICIEMBRE DE 2021

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

**Estado Actual:**

La fase preliminar está terminada al **100%**.  
Aprobado PMT, topografía y coordenadas. Se gestiona con el alcalde posibilidades de suministrar combustible a las obras.

Contrato de Obra  
**No. 9677-PPAL001-518-2021**  
**Valor: \$ 2.696.280.960**

**Nombre de Contratista:**  
CONSORCIO ORC 2020

Contrato de Interventoría  
**No. 9677-PPAL001-551-2021**  
**Valor: \$ 191.474.688**

**Nombre de la Interventoría:**  
CONSORCIO INTER 5HG

**Supervisor UNGRD**

Ing. Eliana Montes Peña– Reconstrucción Mocoa



 **45.589**  
**Personas beneficiadas**



*Visita a los tramos con personal técnico de la Empresa de Aguas Mocoa*



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7ª.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

**ACTORES E INVERSIÓN**

**FNGRD – UNGRD – SGR  
 – MUNICIPIO DE MOCOCHA**

**Valor total del proyecto**

**\$1.342.679.025**

**EJECUTOR**

**FNGRD – UNGRD :** Interventoría  
 Obra



**Plazo: SIETE (7) MESES**  
**Inicio: 26 DE ABRIL DE 2021**  
**Terminación: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Pavimentación de **1 vía**

**Estado Actual:**

La fase preliminar está terminada al **100%**.  
 Aprobado PMT, topografía y coordenadas. Se gestiona con el alcalde posibilidades de suministrar combustible a las obras.  
 Se realizó socialización del proyecto con la comunidad el día **20/05/21**.

Contrato de Obra  
**No. 9677-PPAL001-636-2021**  
**Valor: \$ 1.253.593.696**

**Nombre de Contratista:**  
 CONSORCIO PAVIMENTOS  
 CAPITAL

Contrato de Interventoría  
**No. 9677-PPAL001-551-2021**  
**Valor: \$ 89.085.329**

**Nombre de la Interventoría:**  
 CONSORCIO INTER 5HG

**Supervisor UNGRD**

Ing. Eliana Montes Peña– Reconstrucción Mococho



**45.589**

**Personas beneficiadas**



**ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma



*Socialización del proyecto*



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR  
 – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

**\$ 4.764.101.025**



**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
 Obra



Plazo: **OCHO (8) MESES**  
 Inicio: **27 DE MAYO DE 2021**  
 Terminación: **26 DE ENERO DE 2022**

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **4 SECTORES**  
 intervenciones de vías urbanas.

**Estado Actual:**

Revisión de Información técnica, planos localización y  
 detalles así mismo estudios y diseños.

**45.589**

**Personas beneficiadas**

Contrato de Obra  
**No. 9677-PPAL001-532-2021**  
 Valor: \$ 4.268.718.305

Nombre de Contratista:  
 CONSORCIO PAVIMENTOS  
 MOCOCA


Contrato de Interventoría  
**No. 9677-PPAL001-774-2021**  
 Valor: \$ 495.382.720

Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO  
 INTERPAVIMENTOS EDUPAC



**ALCANCE**

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7,  
 y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y  
 Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a  
 y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y  
 Cra 8

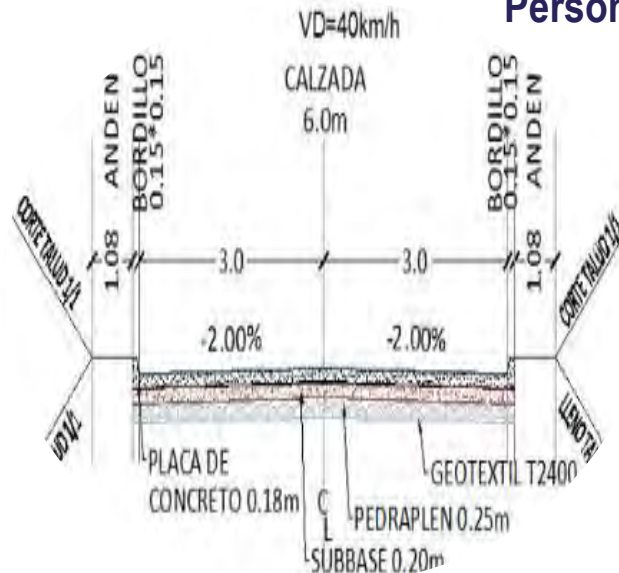



**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD – SGR  
 – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

**\$ 1.959.956.,94**

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Interventoría  
 Obra



Plazo: CINCO (5) MESES  
 Inicio: 27 DE MAYO DE 2021  
 Terminación: 26 DE OCTUBRE DE 2022

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mejoramiento de Vías Urbanas

**IMPACTO**

Este contrato desarrollará **1 SECTOR**  
 intervención de vías urbanas.

**Estado Actual:**

Revisión de Información técnica, planos localización y detalles así mismo estudios y diseños.

**45.589**


**Personas beneficiadas**

Contrato de Obra  
 No. 9677-PPAL001-549-2021  
 Valor: \$1.830.025.649

Nombre de Contratista:  
 CONSORCIO PAVIMENTOS  
 MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría  
 No. 9677-PPAL001-551-2021  
 Valor: \$ 129.930.605,94

Para este contrato  
 Nombre de la Interventoría:  
 CONSORCIO INTER 5HG

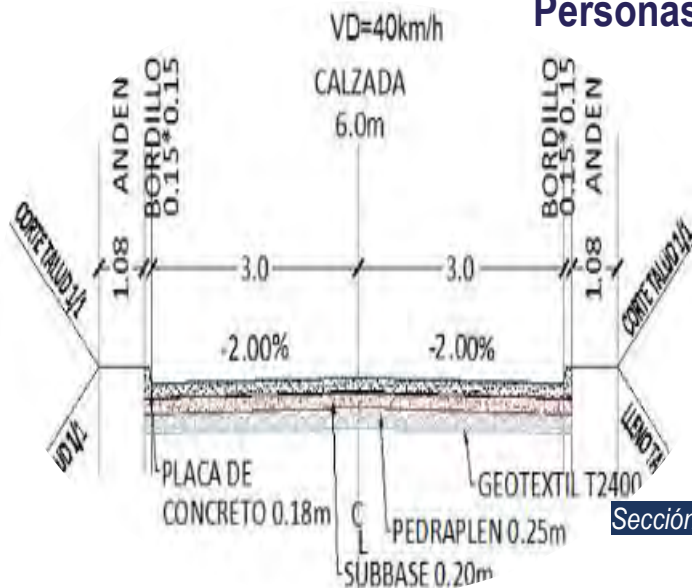

Sección Transversal Típica



**ALCANCE**

El cruce de vía nacional (Mocoa-Pitalito) entrada a la vereda nueva esperanza hasta finalizar en la abscisa k1+132,92 de la vereda nueva esperanza en el municipio de San Miguel de Agreda.

**1.3**

# SEGUIMIENTO VÍAS Y ALCANTARILLADO

	PROYECTO	VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA	ESTADO PROCESO
1	Mejoramiento de la vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.	\$ 2.435.104.449	\$ 496.564.842	EN SUBSANACIONES
2	Mejoramiento de vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la calle 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco.	\$ 6.241.228.546	\$ 486.465.657	MINUTA DE CONTRATO EN ELABORACIÓN (FIDUPREVISORA)
3	Mejoramiento de vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en el barrio chiparos, zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)	\$ 1.282.970.234		CONTRATO PERFECCIONADO
				EN EXPEDICIÓN DE RUT Y CERTIFICACIÓN BANCARIA DESDE EL 22/04/21

 Obra  
 Interventoría

**2.**

# SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

# VIVIENDA URBANA SAUCES

## CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones

\*Avance



30,04%

Avance financiero



0%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,04%



0%

total de  
viviendas



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

\*Avance en los estudios y  
diseños.

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$ 4.702 millones

Avance financiero

27%

## CRONOGRAMA

FECHA DE  
TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



519

909

PERSONAL  
PROYECTADO



82

## ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Movimiento de tierras aprox. 9.675 m3 de tierra.
- Impresión e instalación vallas del proyecto.
- Revisión comunicado CORPOAMAZONIA.
- Plan de choque cumplimiento cronograma de obra y terminación fase I diseños.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	8	1	9
No calificado	16	0	19
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>25</b>



## VIVIENDAS URBANAS



## VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



## VIVIENDA RURAL NUCLEADA



**\$9.516'549.300** En convenio con **Banco Agrario**

**\$15.436.450.700** Recursos faltantes

### AVANCES

- Desglose cronograma General Ejecutivo de actividades.
- Continúa elaboración de documentos precontractuales para contratación persona jurídica/natural que formule, elabore estudios y diseños, tramite licencias y construya el proyecto de vivienda.
- El **20/05/21** se realizó comité de supervisión FNGRD-FNV para realizar seguimiento. Se presentó el cronograma ejecutivo general del proyecto y la posible implantación del proyecto en el predio Sauces.
- Para el **27/05/21** nuevamente se cita a comité de supervisión.

### AVANCES

- **Mocoa Nucleada:** SPIA está realizando las subsanaciones en el marco legal establecido para ello en el contrato. Se deben realizar los trámites de permisos ambientales frente a la corporación (Aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y permiso de vertimiento).
- La alcaldía se encuentra realizando la verificación de los beneficiarios con el fin de envío a la UNGRD el **26/05/21** de la documentación soporte (nuevo plazo otorgado por el BAC), para el proceso de escrituración. Pendiente la remisión de certificación de disponibilidad de servicio de Acueducto y alcantarillado Secretaria de Planeación de la alcaldía.
- La **UNGRD** trabaja en el desenglobe del predio (el trámite ya se encuentra en la Fiduprevisora para designar apoderado).
- **Mocoa Disperso:** Se obtuvo aval técnico al prototipo de vivienda por parte del **BAC** pasando a revisión de beneficiarios para aval final, se recibieron las cotizaciones para actualizar estudio de mercado y se trabaja en la estructuración del proceso contractual por ley 80.

**3.**

# SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS



## ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: 11 .194 millones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:  
Asistencia técnica

## EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión



Inicio: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

Terminación : 11 DE JUNIO DE 2021

## TIPO DE INTERVENCIÓN

**CONSTRUCCIÓN** de infraestructura educativa.

## IMPACTO


24 aulas para **960** Alumnos 

## INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

**\$ 11.194 millones**

### Estado Actual:

Proyecto suspendido del 12/05/21 al 12/06/21 por falta de materiales y problemas de orden nacional.

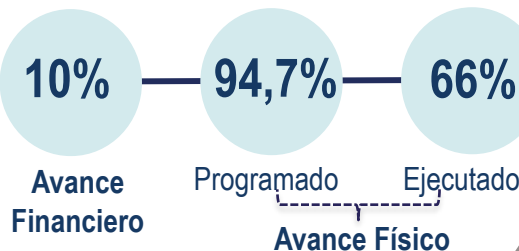

Contrato de Obra  
No. 9677-PPAL001-225-2018

Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre de Contratista:  
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría  
No. 9677-PPAL001-228-2018

Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:  
INGEVAL S.A.S.

### Supervisor UNGRD

Yineth Arinda Cumplido Botello –  
Subdirección para la Reducción del Riesgo



# PROYECTO PLAZA DE MERCADO


**INVERSIÓN**  
**\$6.000.000,00\***

\*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.

## PLAZA DE MERCADO

**PERSONAL PROYECTADO: 56**

### AVANCES

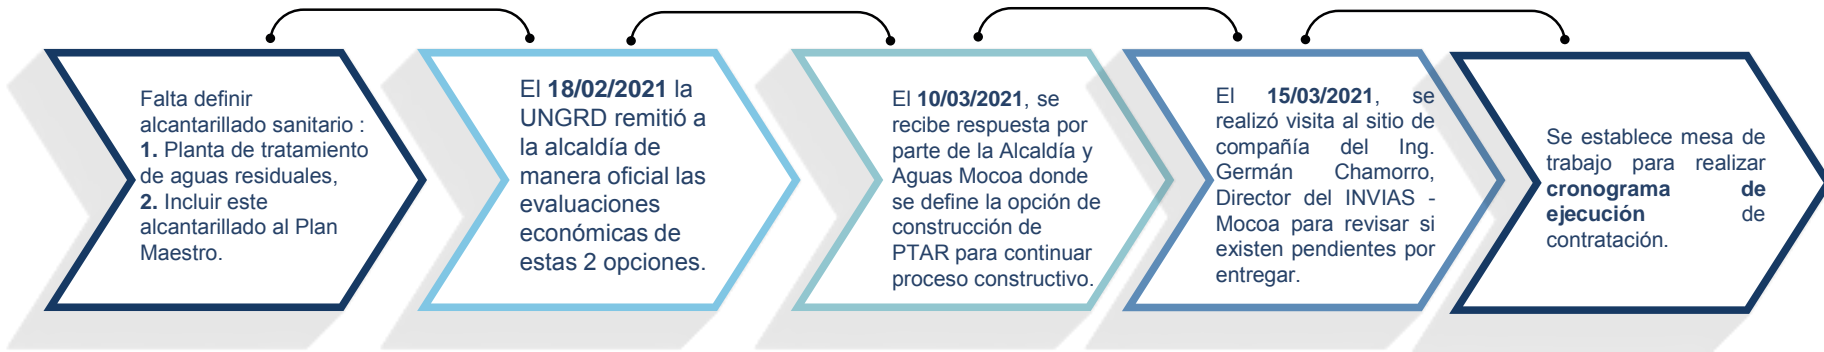

### CRONOGRAMA



## COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO



### AVANCES



### INVERSIÓN

**\$ 1.257.921.000,00\* lote**

**\$ 80.000.000.000,00 Construcción**

\* Estos recursos serán gestionados por el FNGRD para su adquisición.



# RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

## OBJETO

Reconstrucción del sistema de acueducto del municipio de Mocoa

## CONTRATISTA

Mario Germán García García

## INTERVENTOR

Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S

## CONSULTOR

CDM Smith

## VALOR TOTAL DEL CONVENIO

**\$31.108 millones**

## PLAZO

Plazo inicial: 12 meses  
Prórrogas: 5: 22 meses  
Acta de inicio: 27/06/17  
Suspensiones (3): 7 meses  
Reinicio: 15/10/20  
Terminación: 17/10/20

## ALCANCE

- Construcción bocatoma.
- Construcción de desarenador de alta tasa y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.



## ESTADO ACTUAL CONTRATO AGUAS MOCOCA


Actualmente se adelanta por parte de Aguas Mocoa S.A. E.S.P., la **expedición de las respectivas pólizas** que amparan el contrato y la revisión conjunta con la interventoría de las **hojas de vida, programación y APU's del contrato.**

Una vez avalados los anteriores documentos, se procederá con la **suscripción del acta de inicio** respectiva.

**4.**

# GENERACIÓN DE EMPLEO

# GENERACIÓN DE EMPLEO

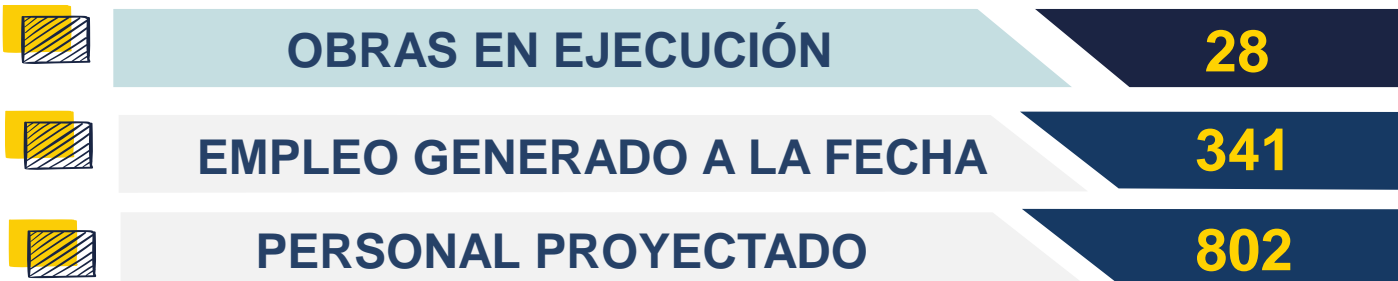

	19/05/21	26/05/21		19/05/21	26/05/21
MANO DE OBRA LOCAL	267	234	MANO DE OBRA FORÁNEA	101	107
CALIFICADOS	149	142	CALIFICADOS	89	91
NO CALIFICADOS	118	92	NO CALIFICADOS	12	16
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	73%	69%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	27%	31%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	614	1.444
EMPLEOS INDUCIDOS	136	321
<b>TOTAL EMPLEOS</b>	<b>750</b>	<b>1.765</b>

**GRACIAS**

