

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Octubre 27 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento ejecución
18 de obra	18	100%
13 de interventoría	13	100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento ejecución
13 de obra	13	100%
4 de interventoría	4	100%

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



*De las 18 obras, 10 van por encima del porcentaje ejecutado

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
Fecha de terminación: 28 - DIC - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 24
Total Projectado: 26

Local: 24
100%


Foráneo: 0
0%

Calificados: 14
58%

No Calificados: 10
42%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%

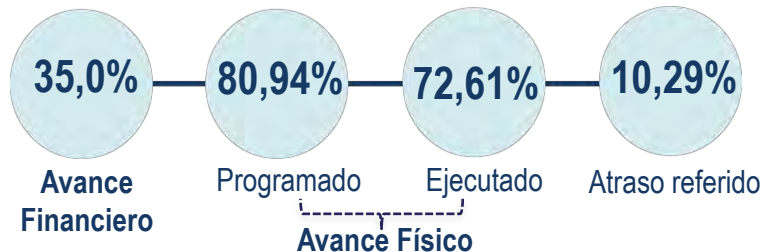

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960</p>
<p>Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa</p>	<p>Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz</p>
<p>Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición de placa



Armado de acero

ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
Fecha de terminación: 14 - JUN - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 72 Total Projectado: 140	Local: 55 76%	Calificados: 24 44%
		No Calificados: 31 56%
	Foráneo: 17 24%	Calificados: 15 88%
		No Calificados: 2 12%

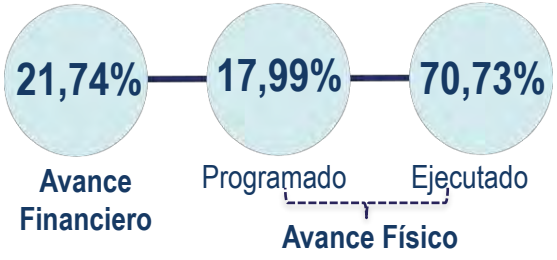

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	




ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra:26
Total Projectado:30

Local: 19
73%


Foráneo: 7
27%

Calificados: 16
84%

No Calificados: 3
16%

Calificados: 5
71%

No Calificados: 2
29%

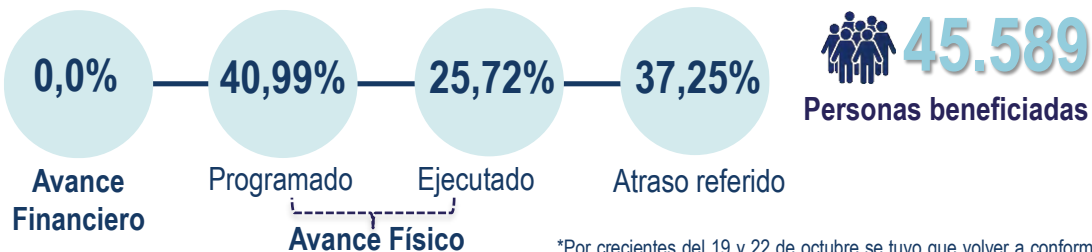

*Por crecientes del 19 y 22 de octubre se tuvo que volver a conformar jarillones provisionales por lo que se retrasan los avances de ejecución

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOCA LH 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



Visita de obra de contraloría y fundición de placa de protección de muro 6



Construcción de colcha gavión para muro de protección 6 y conformación de carretables

ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 25

Local: 15
71%


Foráneo: 6
29%

Calificados: 9
60%

No Calificados: 6
40%

Calificados: 2
33%

No Calificados: 4
67%

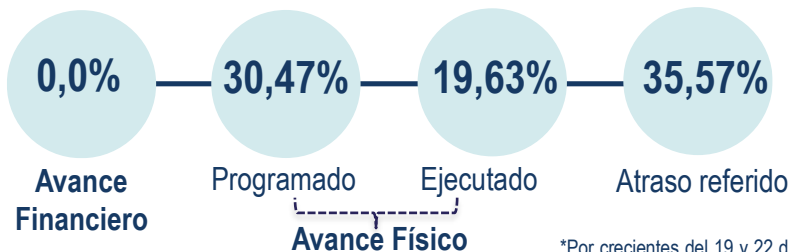

45.589
Personas beneficiadas

*Por crecientes del 19 y 22 de octubre se tuvo que volver a conformar jarillones provisionales por lo que se retrasan los avances de ejecución

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-980-2020 Valor: \$ 5.710.699.339,98</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: HAROLD MUÑOZ MUÑOZ</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación bolsacreto salida del azud 9



Conformación del talud del muro de protección 7

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26

Total Projectado: 35

Local: 18
69%

Foráneo: 8
31%

Calificados: 14

78%

No Calificados: 4

22%

Calificados: 8

100%

No Calificados: 0

0%

0,0%

Avance
 Financiero

16,62%

Programado

16,58%

Ejecutado

Avance Físico

0,24%

Atraso referido



45.589

Personas beneficiadas

Se avanza, sin embargo se requiere Hidroconsulta.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.924.254.899,43</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 564.222.640,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO MULATO.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

6 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO 1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
 Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 38 Total Projectado: 40	Local: 30 79%	Calificados: 14 47%
		No Calificados: 16 53%
	Foráneo: 8 21%	Calificados: 8 100%
		No Calificados: 0 0%

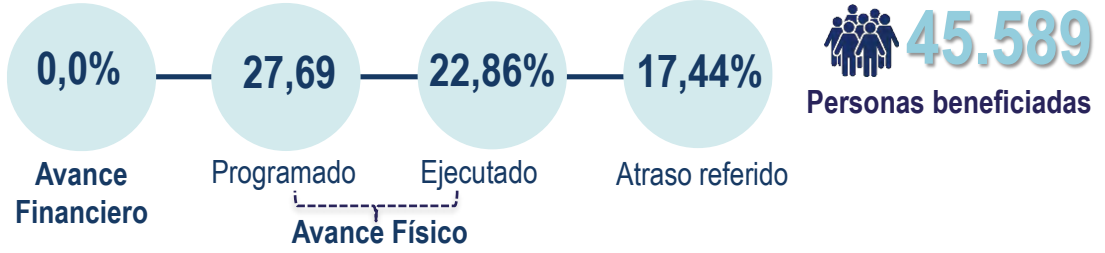

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 22 Total Projectado: 45	Local: 18 82%	Calificados: 6 33%
		No Calificados: 12 67%
	Foráneo: 4 18%	Calificados: 4 100%
		No Calificados: 0 0%

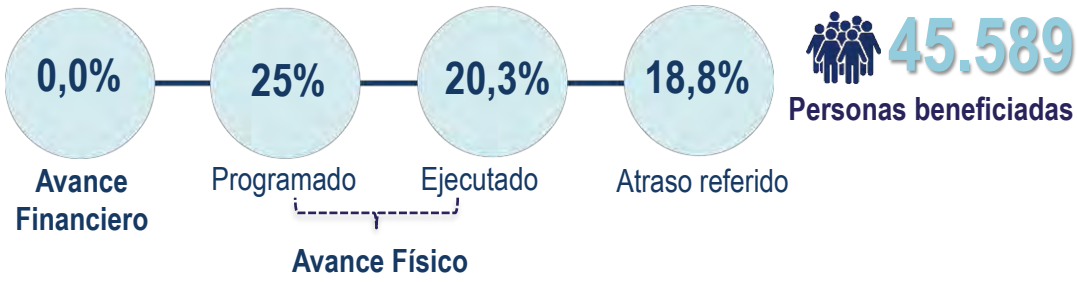

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOA
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE**

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA


Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 27 Total Projectado: 35	Local: 20 74%	Calificados: 7 35%
		No Calificados: 13 65%
	Foráneo: 7 26%	Calificados: 5 71%
		No Calificados: 2 29%

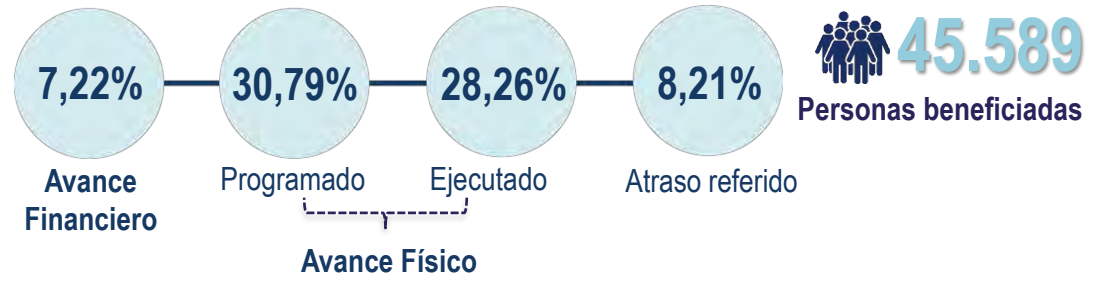

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE** • Dique Abierto 1 - Q. Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 21 Total Projectado: 35	Local: 11 52%	Calificados: 6 55%
		No Calificados: 5 45%
	Foráneo: 10 48%	Calificados: 6 60%
		No Calificados: 4 40%

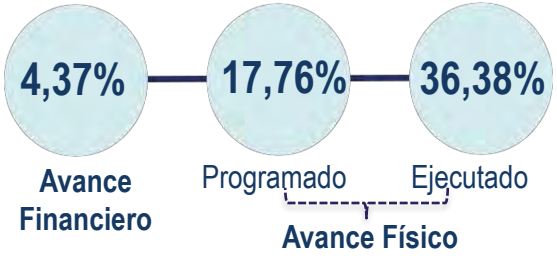


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.319.593.302,48 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO MURO RIO MOCOA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.303.365,8033 (para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



 **ALCANCE** • Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
 Total Projectado: 35

Local: 14
74%


Foráneo: 5
26%

Calificados: 6
43%

No Calificados: 8
57%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

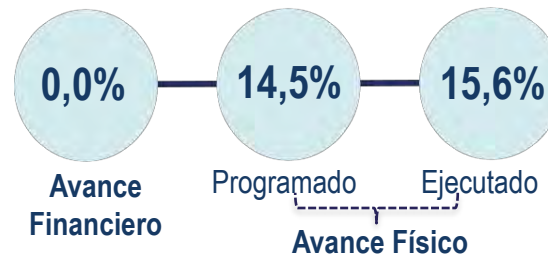

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1119-2020
 Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
 A&A CONSULTORIA E
 INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021
 Valor: \$ 426.384.755,43

(para este contrato)
 Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORES
 DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Excavaciones Azud 11



Actividades Ambiental y Visita Contraloría



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 52
Total Projectado: 45

Local: 32
62%


Foráneo: 20
38%

Calificados: 6
19%

No Calificados: 26
81%

Calificados: 8
40%

No Calificados: 12
60%

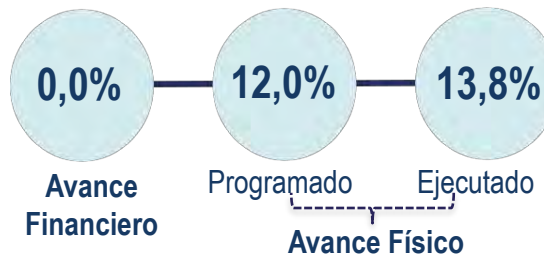

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1064-2020
Valor: \$ 15.407.631.114,68

Nombre del Contratista:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS
RIO SANGOYACO 2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 1.244.010.656,57

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Construcción Muro 6



Visita Contraloría con Veedurías



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 17
Total Projectado: 61

Local: 6
35%

Foráneo: 11
65%

Calificados: 3

50%

No Calificados: 3


50%

Calificados: 9

82%

No Calificados: 2

18%

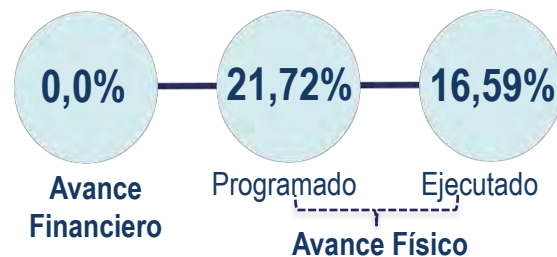

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO
MOCOA 2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 09 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 03 – MAY – 2021
Fecha de terminación: 02 – NOV – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 38

Total Projectado: 37

Local: 19
50%

Foráneo: 19
50%

Calificados: 11

58%

No Calificados: 8

42%

Calificados: 18

95%

No Calificados: 1

5%

0,0%

Avance
Financiero

29,48%

Programado

23,02%

Ejecutado

21,9%

Atraso referido

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-311-2021

Valor: \$ 2.723.478.287,36

Nombre del Contratista:

CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-110-2021

Valor: \$ 219.807.563,26

(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTERVENTORIA
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Fundición zarpa tercio ribera izquierda.



ALCANCE

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOÁ

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones

CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15

Total Projectado: 30

Local: 10
67%

Foráneo: 5
33%

Calificados: 10


100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 5

100%

No Calificados: 0
0%

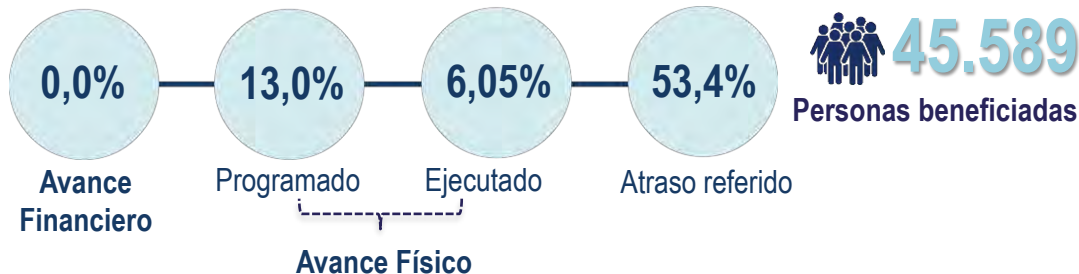

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1330-2020
 Valor: \$ 1.938.876.092,45

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO OBRAS POR
 COLOMBIA

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-133-2021
 Valor: \$ 157.336.269,67
 (para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER – MOCOÁ
 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa



Excavaciones Azud 15



Charla SST



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021
 Fecha acta de reinicio: 18 – OCT - 2021
 Fecha de terminación actualizada: 14 - ENE – 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.


Estado Actual:

El contrato se encuentra suspendido, se solicita prórroga por tres meses más. Se realiza ajuste de diseño por parte de Hidroconsulta.

45.589
 Personas beneficiadas



Pausadas Actividades Campo por predial

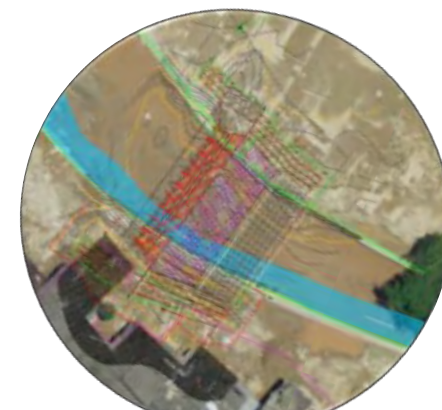

Modificación a diseños por prediales

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: Pendiente por definir
 Fecha acta de inicio: Pendiente por definir



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

Estado Actual:

Inicio actividades preliminares del contrato, PMT
 PMA, PGS y protocolos de bioseguridad.

45.589
 Personas beneficiadas

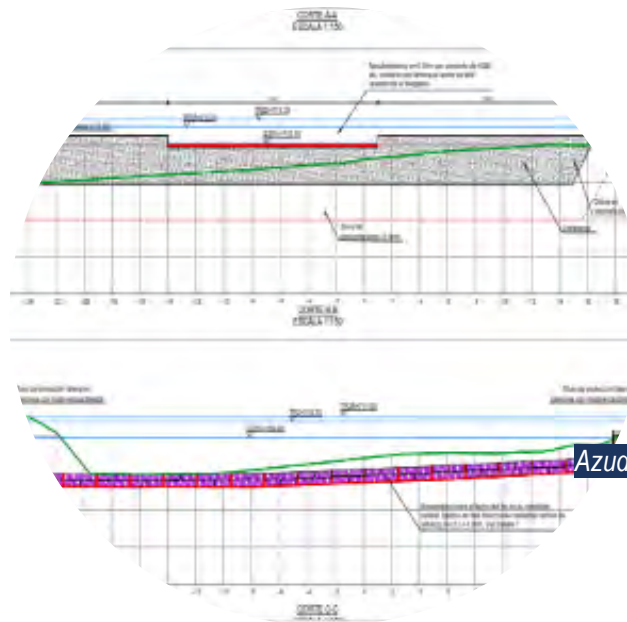

Azud 4 Quebrada Taruca.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.027</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOA 520</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021

Fecha de terminación: 14 - ENE - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 37

Local: 7
58%


Foráneo: 5
42%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

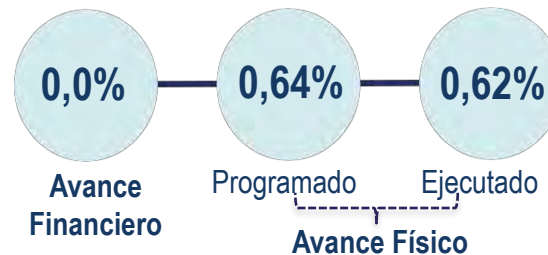

45.589
Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Levantamiento topográfico
Azud 6- Muro 2



Desmante, limpieza Azud 6 y
muro 2- Construcción campamento



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: Se está a la espera de aclaración con Corpoamazonía para dar inicio.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Obras complementarias en proceso de ajuste de diseño de conformidad con el avance de obras de azud y diques que se ejecutan en el río Sangoyaco, se han realizado visitas técnicas a los puntos donde se requieren las obras de drenaje.

Gestión interinstitucional

*Es importante articular con Corpoamazonía y contraloría para trazar ruta de intervención.

45.589
 Personas beneficiadas



Visita técnica río Sangoyaco



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-183-2021 Valor: \$ 4.452.771.492,00</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-743-2021 Valor: \$ 363.516.745,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INGENIERÍA DE MITIGACIÓN</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.844.159.281,86	21,74%	17,99%	5.908.664.254,81	70,73%	\$ 23.230.673.860,06	+ 52,74%
3	\$ 4.706.751.939,00	0%	40,99%	1.929.297.619,80	25,72%	\$ 1.210.576.598,71	- 15,27%
4	\$ 6.115.409.901,98	0%	30,47%	1.863.365.397,13	19,63%	\$ 1.200.454.963,76	- 10,84%
5	\$ 7.488.477.539,43	0%	16,62%	1.244.584.967,05	16,58%	\$ 1.241.589.576,04	- 0,04%
6	\$ 11.015.788.965,85	0%	27,69%	3.050.271.964,64	22,86%	\$ 2.518.209.357,59	- 4,83%
7	\$ 12.263.393.477,06	0%	25,00%	3.065.848.369,27	20,30%	\$ 2.489.468.875,84	- 4,70%
8	\$ 7.204.019.704,53	0%	30,79%	2.218.117.667,02	28,26%	\$ 2.035.855.968,50	- 2,53%
9	\$ 6.827.896.668,28	0%	17,76%	1.212.634.448,29	36,38%	\$ 2.483.988.807,92	+ 18,62%
10	\$ 5.707.351.594,38	0%	14,50%	827.565.981,19	15,60%	\$ 890.346.848,72	+ 1,10%
11	\$ 16.651.641.771,25	0%	12,00%	1.998.197.012,55	13,80%	\$ 2.297.926.564,43	+ 1,80%
12	\$ 26.536.775.722,39	0%	21,72%	5.763.787.686,90	16,59%	\$ 4.402.451.092,34	- 5,13%
13	\$ 2.943.285.850,62	0%	29,48%	867.680.668,76	23,02%	\$ 677.544.402,81	- 6,46%
14	\$ 2.096.212.362,12	0%	13,00%	272.507.607,08	6,05%	\$ 126.820.847,91	- 6,95%
15	\$ 6.705.288.187,44	0%	0,00%		0,00%	\$ 0,00	0,00%
16	\$ 8.981.109.127,00	0%	0,00%		0,00%	\$ 0,00	0,00%
17	\$ 8.470.387.014,00	0%	0,64%	54.210.476,89	0,62%	\$ 52.516.399,49	- 0,02%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	0,00%		0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL	\$ 171.374.237.344,19			\$ 30.276.734.121,38 17,66%		\$ 44.858.424.164,13 26,17%	

1.2

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y
ALCANTARILLADO EN
EJECUCIÓN**

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021

Fecha de terminación: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local: 5 45%	Calificados: 4 80%
		No Calificados: 1 20%
	Foráneo: 6 55%	Calificados: 6 100%
		No Calificados: 0 0%

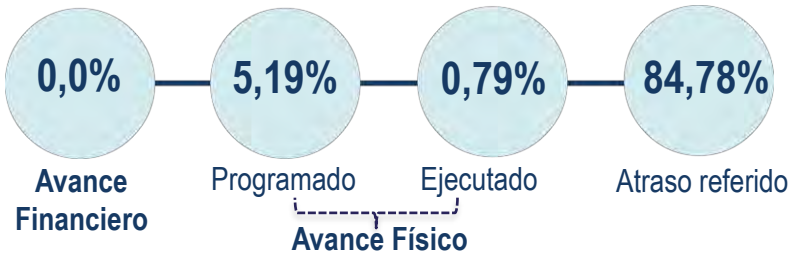

 **45.589**
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Mejoramiento de Suelo



Sumideros Obrero Etapa II



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización por prórroga : 18 - DIC – 2021




TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 25	Local: 22 92%	Calificados: 12 55%
		No Calificados: 10 45%
	Foráneo: 2 8%	Calificados: 0 0%
		No Calificados: 2 100%

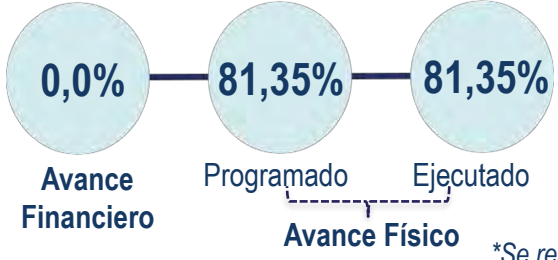


45.589
Personas beneficiadas

**Se realiza reprogramación debido a la prórroga*


Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Reposición de pavimento barrio El Carmen



Fundición de cámaras sanitaria barrios Prado Norte – Bajo Cañaverál



ALCANCE

Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:

- Barrio el Carmen
- Barrio Bajo Cañaverál y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 18 – ENE – 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 25	Local: 22 92%	Calificados: 12 55%
		No Calificados: 10 45%
	Foráneo: 2 8%	Calificados: 0 0%
		No Calificados: 2 100%

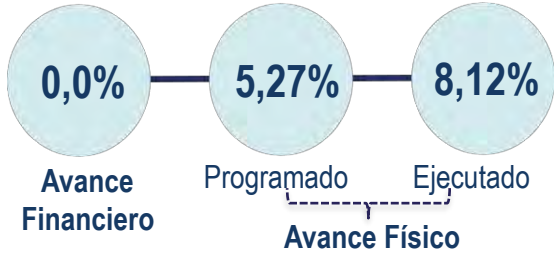


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Instalación de pedraplén
Barrio Piñayaco

 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
 Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021
 Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021
 Fecha de finalización actualizada por prórroga:
 11 - DIC – 2021


TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 17 Total Projectado: 25	Local: 15 88%	Calificados: 3 20%
		No Calificados: 12 80%
	Foráneo: 2 12%	Calificados: 2 100%
		No Calificados: 0 0%

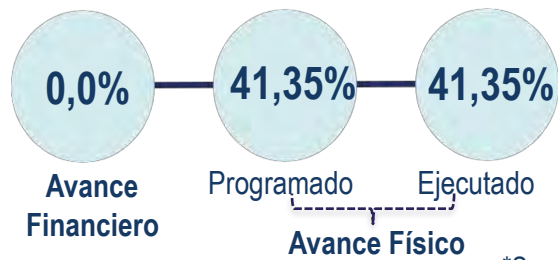

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-407-2021 Valor: \$ 1.017.658.395	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 72.268.367
Nombre del Contratista: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	

**Se realiza reprogramación debido a la prórroga*



Fundición de placas



Fundición de sumideros

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 05 - ENE - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 12 Total Projectado: 25	Local: 12 100%	Calificados: 8 67%
		No Calificados: 4 33%
	Foráneo: 0 0%	Calificados: 0 0%
		No Calificados: 0 0%

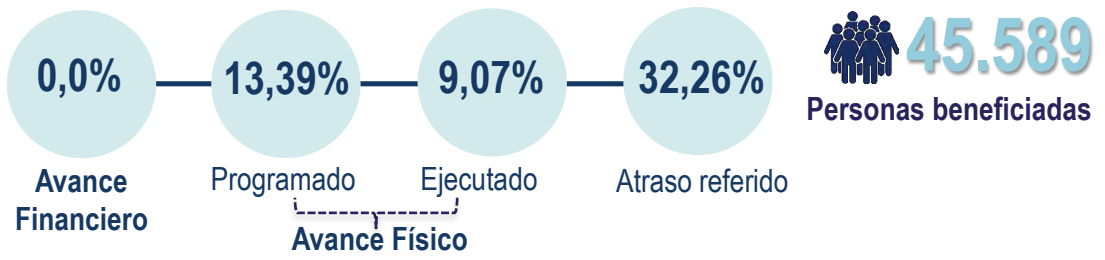

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Instalación de formaleta para fundición de placas TRAMO IV



Fundición de placas TRAMO IV

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 18 - NOV - 2021




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 25 Total Proyectado: 25	Local: 24 96%	Calificados: 7 29%
		No Calificados: 17 71%
	Foráneo: 1 4%	Calificados: 1 100%
		No Calificados: 0 0%

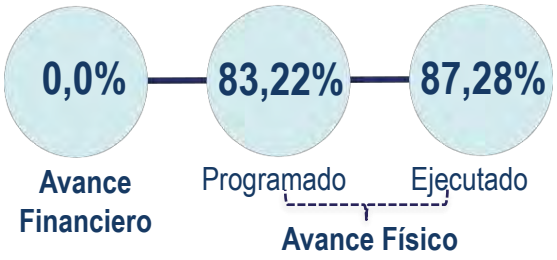

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-518-2021 Valor: \$ 1.206.210.066	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 85.658.245
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL CAIMARON	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Nivelación de cámaras sanitarias



Fundición de lunas para sumideros

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

 **ALCANCE**

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
 Fecha de terminación: 18 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
 Total Projectado: 25

Local: 7
88%

Foráneo: 1
12%

Calificados: 3

43%

No Calificados: 4


57%

Calificados: 1

100%

No Calificados: 0

0%

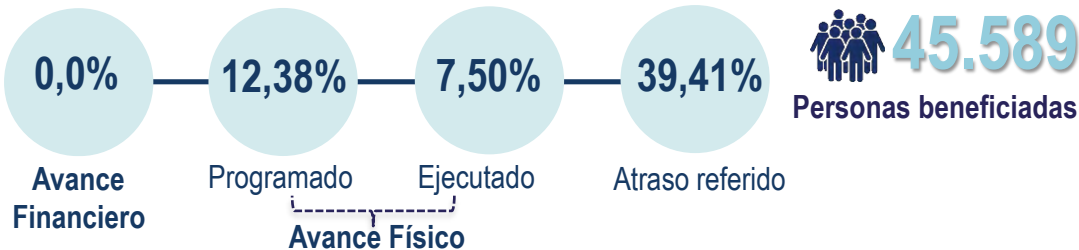

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Excavación



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de terminación: 09 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 18
Total Proyectado: 25

Local: 18
100%


Foráneo: 0
0%

Calificados: 7
39%

No Calificados: 11
61%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%

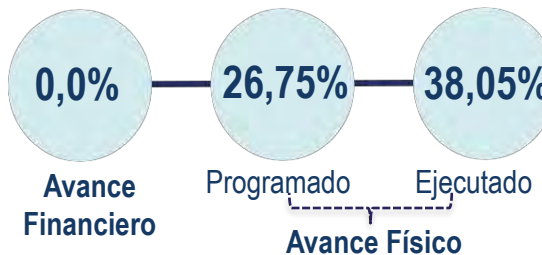

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-636-2021
Valor: \$ 1.253.593.696

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS
CAPITAL

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.085.329

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Instalación de subbase



Excavación manual para construcción de filtro



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 07 – MAR -2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 37

Local: 27
90%


Foráneo: 3
10%

Calificados: 15
56%

No Calificados: 12
44%

Calificados: 3
100%

No Calificados: 0
0%

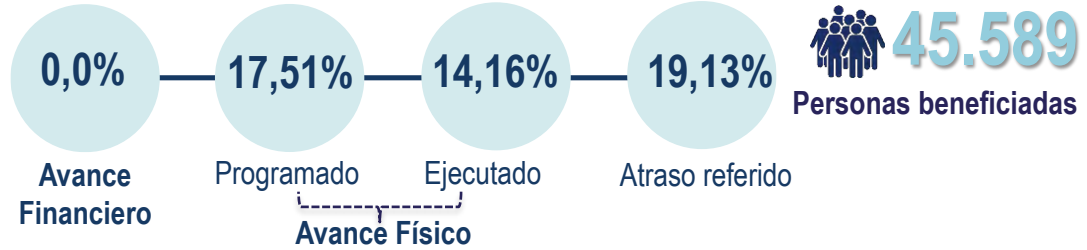

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Pavimentación tramo 38 m. Barrio Olímpico.



Fundición de cámaras B/ Quinta Paredes.



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de terminación: 05 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20
Total Projectado: 25

Local: 20
100%

Foráneo: 0
0%

Calificados: 4
20%

No Calificados: 16
80%

Calificados: 0
0%

No Calificados: 0
0%

0,0%

Avance Financiero

47,02%

Programado

30,70%

Ejecutado

34,70%

Atraso referido

Avance Físico

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-549-2021
Valor: \$1.830.025.649
Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 130.312.324
(Para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza



Fundición de huella e instalación de aceros



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
 Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
 Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021
 Fecha de terminación: 16 - MAY - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
 Total Projectado: 21

Local: 14
74%


Foráneo: 5
26%

Calificados: 7
50%

No Calificados: 7
50%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

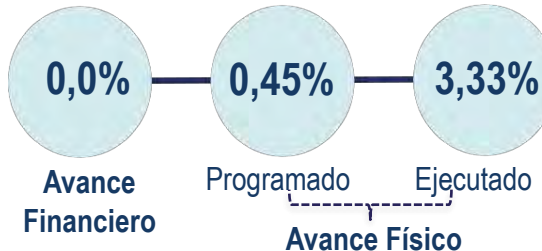

45.589
 Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



Excavación mecánica e instalación de tubería de la red del alcantarillado pluvial



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

La UNGRD ya dio los recursos adicionales para la red de alcantarillado sanitario, en trámite para incorporarlos al contrato de obra.

45.589
 Personas beneficiadas



Evidencia fotográfica de las condiciones actuales del tramo a intervenir



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94</p>
<p>-----</p> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897</p>	<p>-----</p> <p>Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.435.104.449

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
 Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
 Fecha acta de inicio: Pendiente



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Revisión y rediseño de descole de alcantarillado pluvial para ser aprobado por Alcaldía municipal . En revisión de PGS, PMA. PMT por parte de interventoría.



45.589
 Personas beneficiadas

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1113-2021
 Valor: \$ 2.435.104.449

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-774-2021
 Valor: \$ 495.382.720

Nombre del Contratista:
 MEGACONSTRUCCIONES
 S.A.S

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO
 INTERPAVIMENTOS EDUPAC

Supervisor UNGRD
 Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa

Visita técnica con
 especialista hidráulico



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$ 8.840.532.147,00	0,00%	5,19%	\$ 458.823.618,43	0,79%	\$ 69.840.203,96	- 4,40%
2	\$ 1.348.270.441,00	0,00%	81,35%	\$ 1.096.818.003,75	81,35%	\$ 1.096.818.003,75	0,00%
3	\$ 2.485.717.595,00	0,00%	5,27%	\$ 130.997.317,26	8,12%	\$ 201.840.268,71	+ 2,85%
4	\$ 1.089.926.762,00	0,00%	41,35%	\$ 450.684.716,09	41,35%	\$ 450.684.716,09	0,00%
5	\$ 3.025.192.404,00	0,00%	13,39%	\$ 405.073.262,90	9,07%	\$ 274.384.951,04	- 4,32%
6	\$ 1.291.868.311,00	0,00%	83,22%	\$ 1.075.092.808,41	87,28%	\$ 1.127.542.661,84	+ 4,06%
7	\$ 2.887.755.648,00	0,00%	12,38%	\$ 357.504.149,22	7,50%	\$ 216.581.673,60	- 4,88%
8	\$ 1.342.679.025,00	0,00%	26,75%	\$ 359.166.639,19	38,05%	\$ 510.889.369,01	+ 11,30%
9	\$ 4.764.101.025,00	0,00%	17,51%	\$ 834.337.012,51	14,16%	\$ 674.787.269,18	- 3,35%
10	\$ 1.960.337.973,00	0,00%	47,02%	\$ 921.750.914,90	30,70%	\$ 601.823.757,71	- 16,32%
11	\$ 1.365.747.660,00	0,00%	0,45%	\$ 6.145.864,47	3,33%	\$ 45.479.397,08	+ 2,88%
12	\$ 6.644.038.095,94	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$ 2.435.104.449,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL	\$ 39.481.271.535,94			\$ 6.096.394.307,13		\$ 5.270.672.271,98	
				15,44%		13,35%	

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

Informe corte 22 de octubre de 2021

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

NO. VIVIENDAS

CONTRATISTA

VALOR

*AVANCE

AVANCE FINANCIERO



436

CONSORCIO MOCOA 2019

\$25.732 millones



30,41%



5%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%



5%

TOTAL DE VIVIENDAS



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

Estudios y diseños 99,80%,(243) y 98,23% (244) Movimiento de tierras 156 terrazas listas. Continúa figuración de hierro para cimentaciones manzana T, cuadrilla mano de obra operando manzanas T y U, fundidas cimentaciones para 16 viviendas de 24 viviendas manzana T. Llegada a obra de acero para muros, 2 viviendas con formaletas instaladas para fundición de muros.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$7.049.420.065


Avance financiero

20,05%

METAS DICIEMBRE 2021

La totalidad de las viviendas se entregarán antes de finalizar el periodo de gobierno.

La fecha de culminación no se altera (Julio 2022).

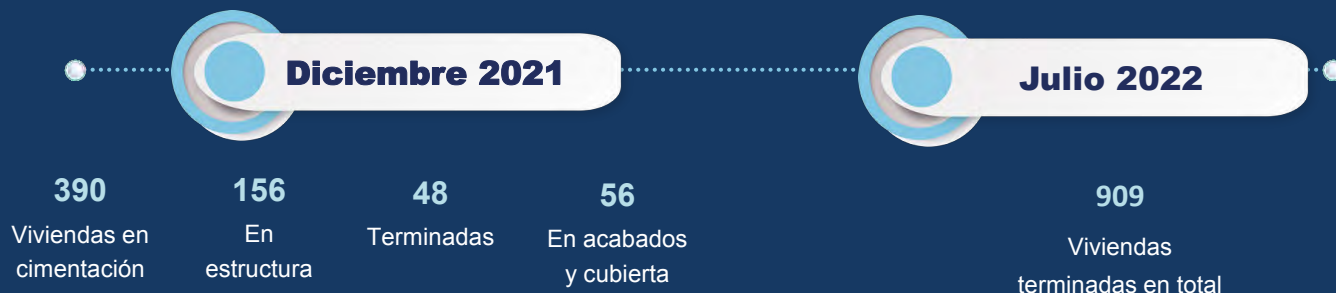




ACTIVIDADES RELEVANTES


- Movimiento de tierras 34.090,5 m³ de tierra (incluido expansión).
- Continúa actividad de construcción de cimentación manzana T, 24 terrazas, excavación para vigas, vigas de amarre, tubería sanitaria, hidráulica, eléctrica y gas, fundición de cimentaciones
- En Operación 2 cuadrillas para movimiento de tierras (terraceo).
- Inicio instalación de formaleta primer piso para dos viviendas.
- Vinculación de mayor número de personal para cuadrilla de mano de obra actual, 20 personas, contratados dos frentes adicionales de mano de obra para fortalecer rendimientos.
- Provisionales de energía y agua, llegada insumos y materiales de construcción. Ubicación en obra de 3 contenedores, 1 para oficina, 2 para campamento de materiales.
- Consorcio presenta nuevas metas para diciembre de 2021, justificado en no existencia de personal en Mocoa.
- Nuevas metas presentadas a Procuraduría, Contraloría, Alcaldía Mocoa y Veedurías.
- Celebrada audiencia de incumplimiento estudios y diseños, contrato 243 \$10 millones, 244 \$98 millones.



Para acelerar los ritmos de ejecución se están implementando **tres estrategias**:

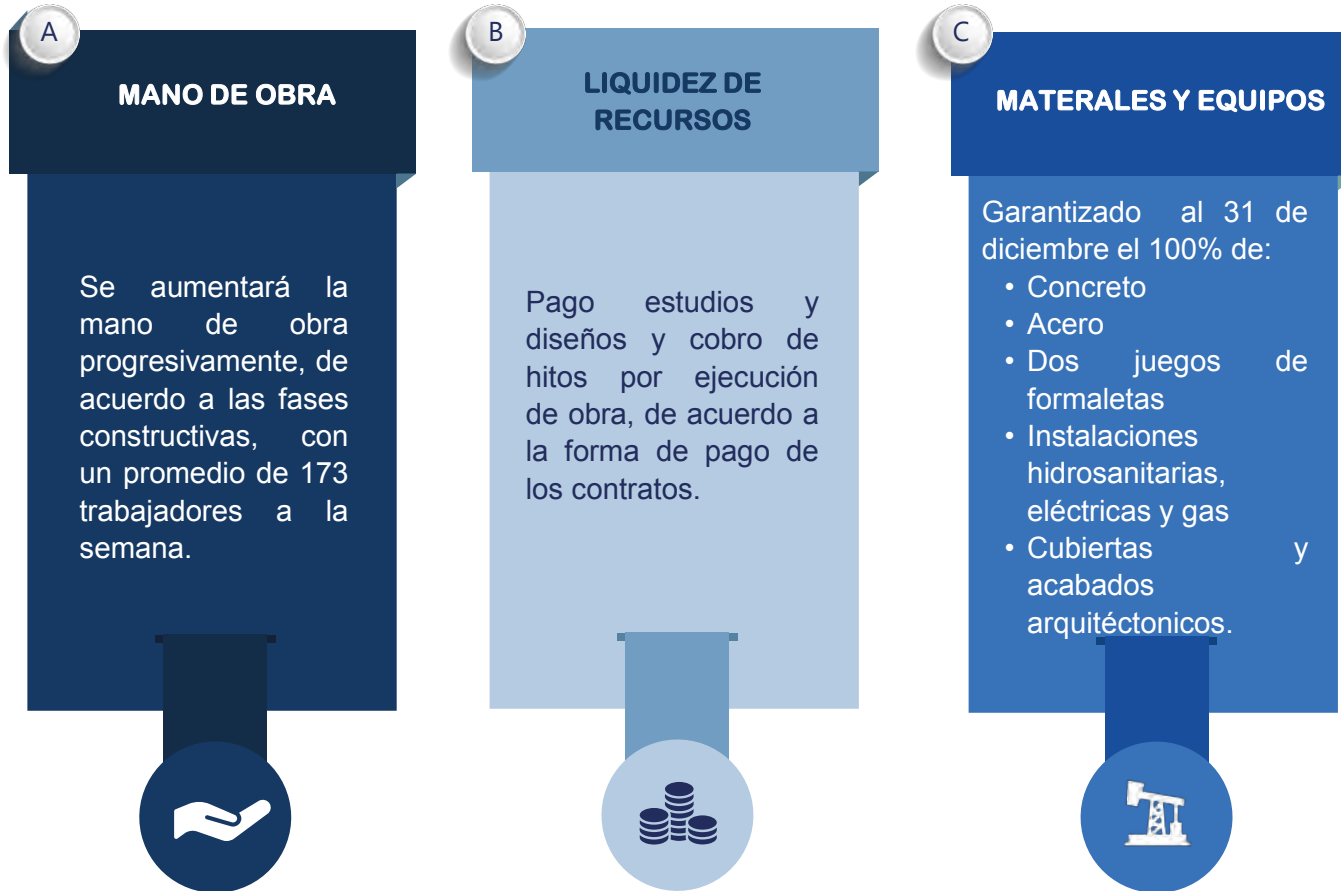

VIVIENDA URBANA SAUCES II

 CONSORCIO MCOCA 2019	PROYECTO SAUCES II CONTROL DIARIO PERSONAL		F-SST-67						
			Versión I						
			11/03/2019						
SEMANA 3 DEL 18 AL 24-10-21		TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
CONSORCIO MCOCA 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	3	4	7	7	7	7		6
CONSORCIO MCOCA 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	3	3	3	3	3	3		3
INTERVENTORIA HMV	PERSONAL OFICINA, OPERATIVOS	0	8	8	8	8	8		7
TOTAL		6	15	18	18	18	18	0	16
CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							
		L	M	M	J	V	S	D	PROMEDIO
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MCOCA 2019	2	2	2	2	2	2		2
SEGURIDAD PRIVADA AMCOVID	CELADURIA OBRA	1	1	2	2	2	2		2
CONSTRUCTORA EYJ SAS	CIMENTACION	37	41	41	40	41	41		40
JVC CONSTRUCCIONES	OPERADORES MOVIMIENTO DE TIERRAS	0	2	1	1	1	1		1
JVC CONSTRUCCIONES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	7	8	8	7		5
JVC CONSTRUCCIONES	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS	0	0	3	3	3	3		2
EDUARDO MORA	OPERADORES MOVIMIENTO DE TIERRAS	0	3	1	1	1	1		1
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	3	5	7	7	0		4
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS	0	2	2	2	3	1		2
ELECTROSERVIG	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	0	3	3	3	3	3		3
		0							0
TOTAL		40	52	67	69	71	61	0	54

VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



AVANCES

- **Mocoa Disperso:** El 28/09/2021, a las 11:40 a.m; se culmina la audiencia de adjudicación del proceso No. **FNGRD-LP-002-2021**, cuyo título es: **“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”**, <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2175246&isFromPublicArea=True&isModal=False>, adjudicando el proceso al CONSORCIO OTES MOCOA 1.

Se está a la espera que el consorcio realice las gestiones pertinentes ante la DIAN para remitir la instrucción de contratación a la Fiduprevisora.

UNGRD

Precio estimado total: 2.406.425.590,81 COP

Número del proceso FNGRD-LP-002-2021

Título: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Fase: Presentación de observaciones

Estado: Publicado

Descripción: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y SU ANEXO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO 9677 – PPAL001 – 668 – 2017, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A., Y EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública)

PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS	90 (DÍAS)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	13/08/2021
Publicación del aviso de convocatoria pública	13/08/2021
Publicación de estudios previos	13/08/2021
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	13/08/2021
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	25/08/2021
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	27/08/2021
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	30/08/2021
Audiencia de asignación de Riesgos	01/09/2021
Presentación de observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	02/09/2021
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	03/09/2021
Plazo máximo para expedir adendas	06/09/2021
Presentación de Ofertas	10/09/2021
Apertura del sobre 1	10/09/2021
Informe de presentación de Ofertas	10/09/2021
Publicación del informe de verificación o evaluación	13/09/2021
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	20/09/2021
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	28/09/2021
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	28/09/2021
Firma del Contrato	Una vez adelantados tramites con DIAN
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	Una vez adelantados tramites con DIAN

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018

Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018

Fecha de finalización: 30 - ENE – 2022 (Según fecha contractual).



TIPO DE INTERVENCIÓN


CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado Actual:

Proyecto suspendido por un periodo de dos meses contados a partir del **19/10/21**. A la espera de que el Plan Maestro de alcantarillado realice la construcción de la red para poder realizar las pruebas pertinentes del proyecto.

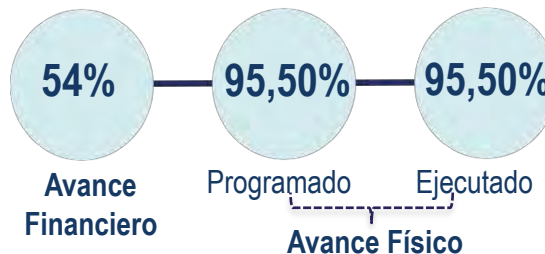

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-225-2018 Valor: \$ 10.462.078.032,00</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: Consorcio Colegio Mocoa</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-228-2018 Valor: \$732.329.530,00</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: INGEVAL S.A.S.</p>
<p>Supervisor UNGRD Yineth Arinda Cumplido Botello – Subdirección para la Reducción del Riesgo</p>	

PROYECTO CENTRO PENITENCIARIO



ENTIDADES PARTICIPANTES:
USPEC - INPEC - ALCALDIA DE
MOCOA - UNGRD



ALCANCE:
Compra de predio de 11 hectáreas
para la construcción de nuevo
ERON y su escrituración y registro.



ESTADO:
En proceso de adquisición por parte de la
Alcaldía de Mocoa.
El Municipio está estructurando el proyecto de
acuerdo en el que se solicita al concejo Municipal
autorización para la compra del predio.

RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ETAPA

2

ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	77%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	18%
ESTADO	Proyecto en ejecución, se adelantan actividades de instalación de micromedidores, empalmes en redes de distribución y líneas de conducción, y logística para el inicio de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable existente.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

NIÑOS


DADOS POR DESAPARECIDOS



4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

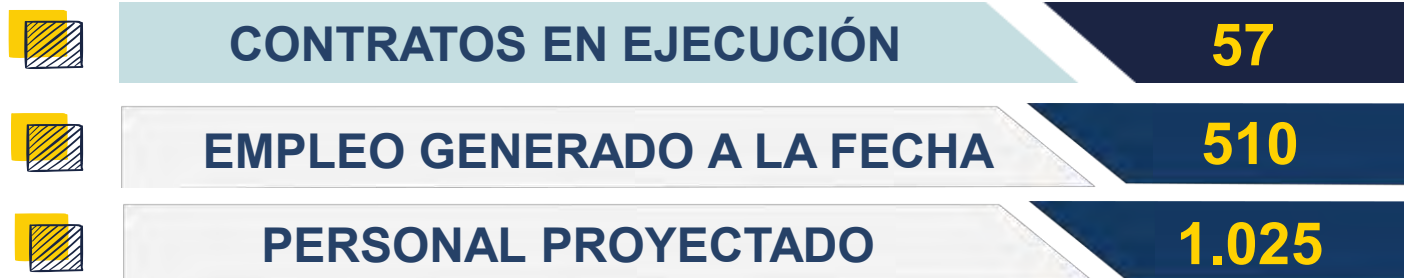

	13/10/21	27/10/21		30/09/21	27/10/21
MANO DE OBRA LOCAL	509	369	MANO DE OBRA FORÁNEA	171	141
CALIFICADOS	235	202	CALIFICADOS	133	119
NO CALIFICADOS	274	167	NO CALIFICADOS	38	22
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	75%	72%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	25%	28%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	918	1.845
EMPLEOS INDUCIDOS	204	410
TOTAL EMPLEOS	1.122	2.255

GRACIAS

