

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Junio 29 de 2022



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Sistema Integrado
de Planificación y
Gestión de la UNGRD
certificado en:



1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$171.294 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento
18 de obra	18	100%
13 de interventoría	13	100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.480 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento
13 de obra	13	100%
4 de interventoría	4	100%

Estamos ejecutando **24** sectores en total
 10,66 Km de pavimento

1.1

PROYECTOS FINALIZADOS

Proyecto finalizado

Obras de control de protección y/o estabilización

En **desarrollo del proyecto** se construyeron 2569,88 m2 de pantallas ancladas para la mitigación, estabilización y consolidación de los taludes aferentes al barrio Modelo en el Municipio de Mocoa.

Empleos Generados: **26**

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-063-2019
 Valor: \$ 3.841.235.901

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-261-2019
 Valor: \$ 453.207.180,00

Nombre del Contratista:
 Virgilio Bravo Sosa

Nombre de la Interventoría:
 Yahara Maritza Viveros Ortiz



Antes

*Ficha 1 – Obras de mitigación

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
 Fecha de terminación programada: 28 - DIC - 2021
 Fecha de terminación real: 28- DIC- 2021
 Avance financiero Interventoría: 44,21%
 Avance financiero Total: 85,52%
 Avance físico: 100%

INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 4.294.443.081

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589

Proyecto finalizado

Obras de Pavimentación

En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 349 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes y una longitud de 436,7 metros lineales de alcantarillado pluvial.

Empleos Generados: **38**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-407-2021

Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre del Contratista:

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 72.318.929,67

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG.

Antes

*Ficha 4 – Vías y alcantarillado

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 27 - ABR – 2021

Fecha de terminación programada: 18- ENE- 2022

Fecha de terminación real: 18- ENE- 2022

Avance financiero: 49,41%

Avance físico: 100%

INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 1.089.977.324,67

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589



El futuro es de todos

Presidencia de la República

Obras de Pavimentación



En **desarrollo del proyecto** se pavimentaron 318,65 metros lineales de vías en concreto hidráulico con sus respectivos andenes.

Empleos Generados: **40**

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-518-2021
 Valor: \$ 1.206.210.066

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 85.718.175,52

Nombre del Contratista:
 UNIÓN TEMPORAL CAIMARON

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER 5HG.

*Ficha 6 – Vías y alcantarillado

**ESTADO
 TERMINADO**

Fecha acta de inicio: 19 - ABR – 2021
 Fecha de terminación programada: 18- NOV- 2021
 Fecha de terminación real: 18 – NOV – 2021
 Avance financiero: 90%
 Avance físico: 100%

INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 1.291.928.241,52

**POBLACIÓN
 BENEFICIADA**

45.589



Proyecto finalizado

Mejoramiento de vías urbanas

En **desarrollo del proyecto** se mejoraron 1048.716ml de vía rural a través de sistema de placa huella, con sistema de recolección de aguas lluvias a través de berma cuneta.

Empleos Generados: **40**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-549-2021

Valor: \$1.830.025.649

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PAVIMENTOS
 MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-551-2021

Valor: \$ 130.049.038,90

(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO INTER 5HG

Antes

*Ficha 10 – Vías y alcantarillado

ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 06 – JUL - 2021

Fecha de terminación programada: 18- MAY- 2022

Fecha de terminación real: 18 – MAY-2022

Avance financiero: 38,37%

Avance físico: 100%

INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 1.960.074.687,90

POBLACIÓN BENEFICIADA

45.589



El futuro es de todos

Presidencia de la República

1.2

**SEGUIMIENTO A OBRAS DE
MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN**

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN



CUADRO DE CONTROL OBRAS DE MITIGACIÓN*

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
2	\$ 32.838.401.531,00	81,80%	32,47%	\$ 10.662.628.977,12	83,80%	\$ 27.518.580.482,98	+ 51,33%
3	\$ 4.649.908.733,08	19,24%	73,47%	\$ 3.416.287.946,19	54,84%	\$ 2.550.009.949,22	- 18,63%
4	\$ 6.169.543.804,64	22,45%	70,62%	\$ 4.356.931.834,84	35,49%	\$ 2.189.571.096,27	-35,13%
5	\$ 7.470.111.514,00	22,91%	61,59%	\$ 4.600.841.681,47	36,81%	\$ 2.749.748.048,30	- 24,78%
6	\$ 11.015.174.280,00	20,83%	93,84%	\$ 10.336.639.544,35	65,92%	\$ 7.261.202.885,38	-27,92%
7	\$ 12.251.982.484,00	20,67%	73,00%	\$ 8.943.947.213,32	42,00%	\$ 5.145.832.643,28	-31,00%
8	\$ 7.201.817.823,00	35,40%	51,76%	\$ 3.727.660.905,18	50,04%	\$ 3.603.789.638,63	-1,72%
9	\$ 6.826.692.363,00	36,37%	56,38%	\$ 3.848.889.154,26	69,02%	\$ 4.711.783.068,94	+12,64%
10	\$ 5.707.203.584,54	58,89%	75,81%	\$ 4.326.631.037,44	77,18%	\$ 4.404.819.726,55	+ 1,37%
11	\$ 16.650.891.855,01	46,51%	76,13%	\$ 12.676.323.969,22	76,77%	\$ 12.782.889.677,09	+ 0,64%
12	\$ 26.513.662.153,00	25,79%	69,62%	\$ 18.458.811.590,92	68,24%	\$ 18.092.923.053,21	- 1,38%
13	\$ 2.942.990.793,02	36,76%	85,11%	\$ 2.504.779.463,94	87,42%	\$ 2.572.762.551,26	+2,31%
14	\$ 2.087.786.575,20	0%	31,61%	\$ 659.949.336,42	25,67%	\$ 535.934.813,85	-5,94%
15	\$ 6.700.484.099,80	0%	13,84%	\$ 927.346.999,41	10,13%	\$ 678.759.039,31	-3,71%
16	\$ 8.981.109.126,81	0%	35,41%	\$ 3.180.210.741,80	6,95%	\$ 624.187.084,31	-28,46%
17	\$ 8.470.387.014,38	25,24%	39,67%	\$ 3.360.202.528,60	32,34%	\$ 2.739.323.160,45	- 7,33%
18	\$ 4.816.288.237,00	0%	0,83%	\$ 39.975.192,37	0,57%	\$ 27.452.842,95	- 0,26%
TOTAL	\$ 171.294.435.971,48	\$61.875.121.688,24		\$ 96.028.058.116,86		\$ 98.189.569.761,98	
		36,12 %		56,06%		57,32%	

*Obras de mitigación Cuenca media y baja

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 32.838.401.531,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020

Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2021

Fecha de suspensión: 24 - DIC - 2021

Fecha de terminación: 15- FEB - 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

Estado Actual:

El 22 de abril 2022 se radicó trámite de **ampliación suspensión** del contrato de obra e interventoría, por un tiempo de 4 meses.

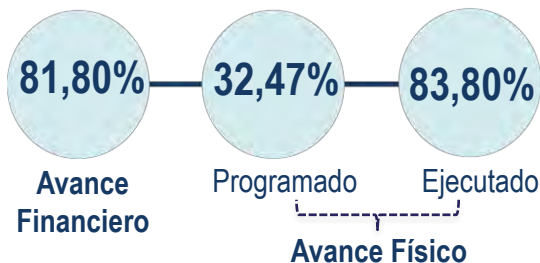

45.589 
Población beneficiada

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.413.014.931,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.386.600,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 4.649.908.733,08

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de terminación: 11-JUL-2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
Total Projectado: 19

Local: 14
74%


Foráneo: 5
26%

Calificados: 6
43%

No Calificados: 8
57%

Calificados: 3
60%

No Calificados: 2
40%

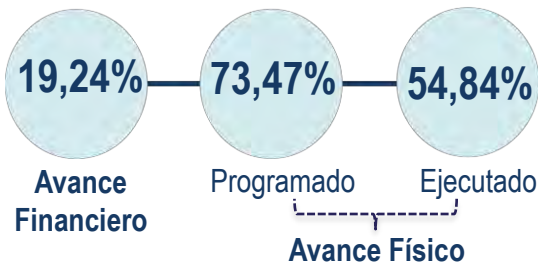

45.589
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 347.867.356,08 (valor para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.169.543.804,64

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES

Fecha de suscripción: 16 – SEP- 2020

Fecha acta de inicio: 12 – FEB – 2021

Fecha de suspensión: 27 –MAY- 2021

Fecha de reinicio: 16 - JUN – 2021

Fecha de terminación: 01- SEP-2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

Estado Actual:

Reprogramación con plan de contingencia exhaustivo. No se presenta avance ejecutado a causa de ola invernal.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 9
Total Projectado: 9

Local: 7
78%

Foráneo: 2
22%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 2
100%

No Calificados: 0
0%

22,45%

Avance
Financiero

70,62%

Programado

35,49%

Ejecutado

Avance Físico

45.589
Población beneficiada



Dique tipo Azud 9



Muro 7

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 7.470.111.514,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021
 Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021
 Fecha de terminación: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

**PERSONAL EN
 OBRA**

Total Obra: 19
 Total Projectado: 19

Local: 12
63%


Foráneo: 7
37%

Calificados: 12
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 7
100%

No Calificados: 0
0%

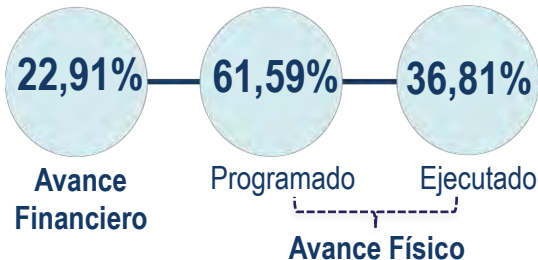

45.589
 Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1334-2020 Valor: \$ 6.923.961.014</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-141-2021 Valor: \$ 546.150.500,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO MULATO.</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA RÍO MULATO</p>
<p>Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa</p>	



Instalación de aceros



Fundición de nuevos
 módulos de dentellón

ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

6 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO 1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.174.280,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - JUL - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

Estado Actual:
Se presenta plan de contingencia por parte del contratista de obra. Interventoría reporta programado de acuerdo a reprogramación No.2

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 33 Total Projectado: 33	Local: 23 70%	Calificados: 7 30%
		No Calificados: 16 70%
	Foráneo: 10 30%	Calificados: 8 80%
		No Calificados: 2 20%

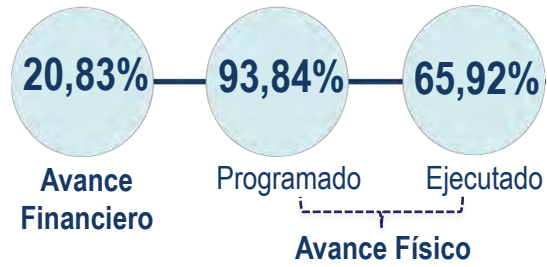

45.589 
Población beneficiada

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.094.882	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.079.398
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



-  **ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 12.251.982.484,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

Estado Actual:

Contratista avanza con plan de contingencia y se adelanta proceso de incumplimiento por atraso. Interventoría reporta programado de acuerdo a reprogramación No.2

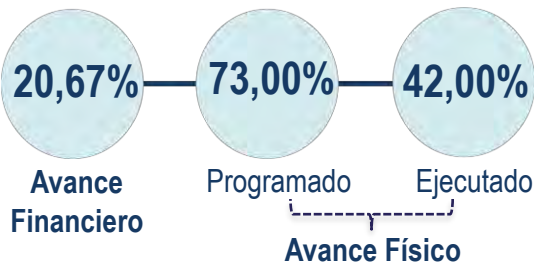

45.589 Población beneficiada

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 45
Total Projectado: 45

Local: 31
69%

Foráneo: 14
31%

Calificados: 11
35%

No Calificados: 20
65%

Calificados: 12
86%

No Calificados: 2
14%

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-201-2021
Valor: \$ 11.323.151.784

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-344-2021
Valor: \$ 928.830.700

Nombre del Contratista:
CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO MUROS MOCOCA

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



Visita comunidad azud 6



Afectación formaleta azud 7



ALCANCE

- Azud 06 - Muro 4 - Azud 07 - Muro 5
- Muro 5 - Muro 09 - Azud 11 - Muro 8
- Muro 10 - Azud 12 - Obras de drenaje



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 7.201.817.823,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

Estado Actual:

Se realizó reprogramación de obra en dique abierto 1 a partir del 06 de junio de 2022.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20
Total Projectado: 35

Local: 15
75%

Foráneo: 5
25%

Calificados: 7
47%

No Calificados: 8
53%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1388-2020
Valor: \$ 6.665.699.934

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DIQUE 1


Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 536.117.889,10
(para este contrato)


Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa

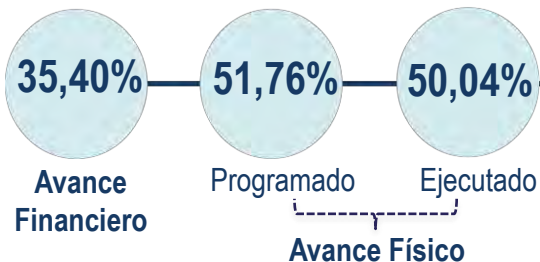

45.589 
Población beneficiada

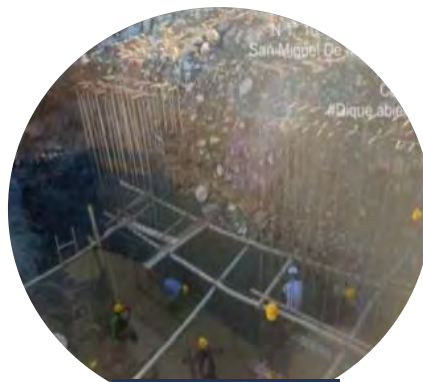

Instalación de aceros



Afectación dique abierto 1



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$6.826.692.363,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención **CONSTRUCCIÓN** de dique abierto.

Estado Actual:
Se adelanta elaboración de plan de contingencia por parte del contratista de obra para aprobación de interventoría.

PERSONAL EN OBRA	Local: 12 50%	Calificados: 8 67%
		No Calificados: 4 33%
	Foráneo: 12 50%	Calificados: 8 67%
		No Calificados: 4 33%
Total Obra: 24		
Total Projectado: 35		

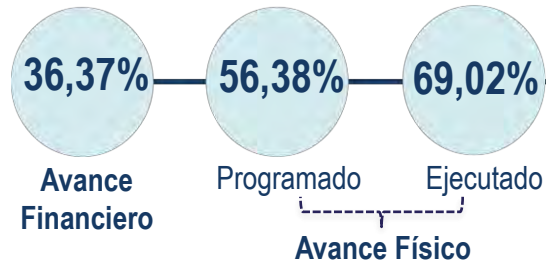

45.589 
Población beneficiada

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1023-2020 Valor: \$ 6.318.499.572	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 508.192.790,90 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO MURO RIO MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Fundición de cemento



Instalación de aceros para nuevos módulos

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.203.584,54

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 20
Total Projectado: 35

Local: 9
45%


Foráneo: 11
55%

Calificados: 4
44%

No Calificados: 5
56%

Calificados: 4
36%

No Calificados: 7
64%

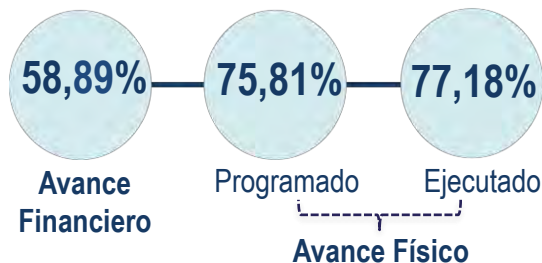

45.589
Población beneficiada

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.236.745,59

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Construcción muro 04



ALCANCE

• Azud 11 • Muro 04 • Muro 05



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 16.650.891.855,01

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de terminación: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 41
Total Projectado: 45

Local: 29
71%


Foráneo: 12
29%

Calificados: 6
21%

No Calificados: 23
79%

Calificados: 7
58%

No Calificados: 5
42%

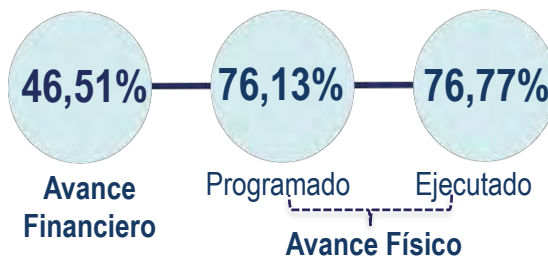

45.589
Población beneficiada

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1064-2020
Valor: \$ 15.407.336.784,60

Nombre del Contratista:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS RÍO SANGOYACO 2020

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 1.243.555.070,41
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mococa



Construcción Jarillón 02



Construcción Azud 12

ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.513.662.153,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de terminación: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 42

Total Projectado: 42

Local: 29
69%

Foráneo: 13
31%

Calificados: 10

34%

No Calificados: 19


66%

Calificados: 7

54%

No Calificados: 6

46%

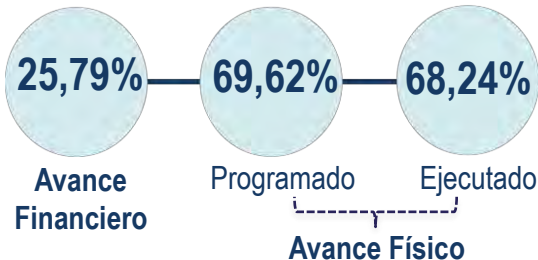

45.589
 Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1382-2020 Valor: \$ 24.560.158.153,0</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-205-2021 Valor: \$ 1.953.504.000,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO DRAGADO MOCOA 2020</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDRAGADOS MOCOA</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa</p>	



Daño gavión de cimentación por creciente del río

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 2.942.990.793,02

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021
 Fecha de terminación: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 41
 Total Projectado: 41

Local: 21
51%


Foráneo: 20
49%

Calificados: 7
33%

No Calificados: 14
67%

Calificados: 20
100%

No Calificados: 0
0%

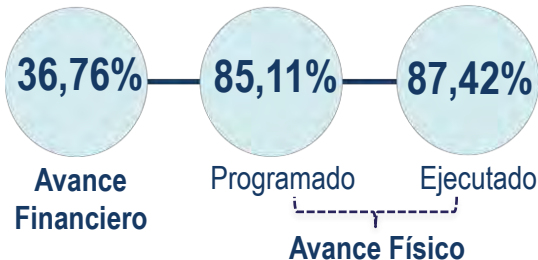

45.589
 Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.386.639</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.604.155 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Adecuación de terreno para instalación de gaviones ribera derecha aguas arriba del dique



Instalación gaviones ribera derecha aguas abajo Dique



ALCANCE

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.087.786.575,20

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
 Fecha de terminación: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
 Total Projectado: 30

Local: 10
67%


Foráneo: 5
33%

Calificados: 10
100%

No Calificados: 0
0%

Calificados: 5
100%

No Calificados: 0
0%

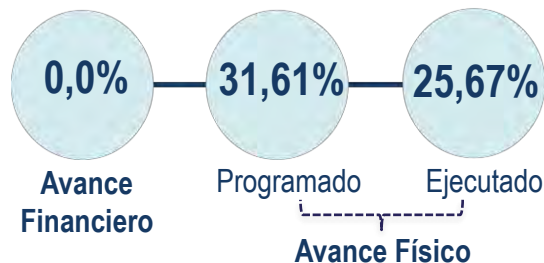

45.589
 Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.930.861.194,00</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 156.925.381,20 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



Construcción azud 15

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.700.484.099,80

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR – 2021
 Fecha de suspensión: 18 – JUL - 2021
 Fecha acta de reinicio: 19 – OCT - 2021
 Fecha de terminación actualizada: 14 - ENE – 2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 29
 Total Projectado: 30

Local: 13
45%


Foráneo: 16
55%

Calificados: 2
15%

No Calificados: 11
85%

Calificados: 16
100%

No Calificados: 0
0%

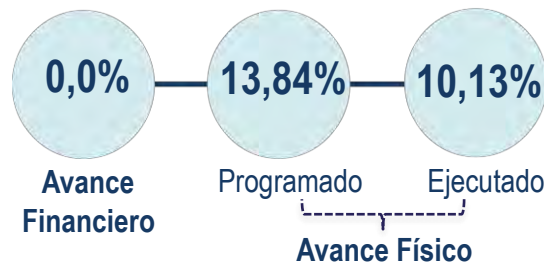

45.589
 Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.196.852.151,00</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.631.948,80 (para este contrato)</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa</p>	



Construcción muro gavión 10



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.126,81

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 28 – JUL -2021
 Fecha acta de inicio: 11 – NOV- 2021
 Fecha de terminación: 10 - MAY -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y azud.

Estado Actual:

En ejecución de proceso de incumplimiento a Interventoría.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 36
 Total Projectado: 36

Local: 24
67%


Foráneo: 12
33%

Calificados: 15
63%

No Calificados: 9
38%

Calificados: 12
100%

No Calificados: 0
0%

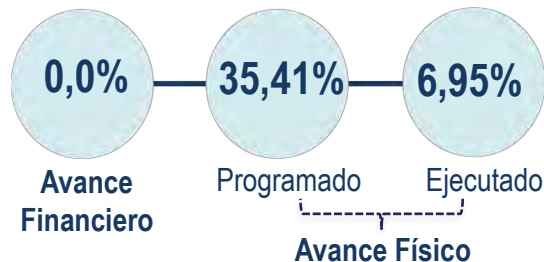

45.589
 Población beneficiada



Fundición de cimientos de zarpa Azud 04

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.026,81</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOA 520</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOA 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 16- JUN- 2021
Fecha acta de inicio: 26 – AGO - 2021
Fecha de terminación: 25- FEB -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 15

Local: 9
60%

Foráneo: 6
40%

Calificados: 5

56%

No Calificados: 4


44%

Calificados: 6

100%

No Calificados: 0

0%

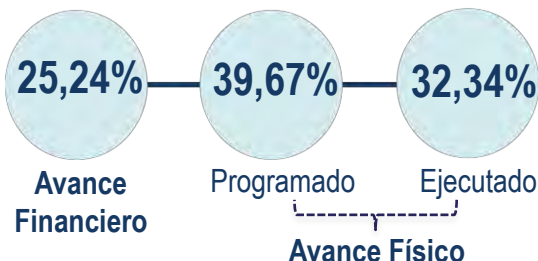

45.589
Población beneficiada

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-639-2021
Valor: \$ 7.838.331.969

Nombre del Contratista:
CONSORCIO
CONSTRUOBRAS MOCOA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-110-2021
Valor: \$ 632.055.045,38

_____(para este contrato)_____
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Consecución de mallas
para gaviones



Visita técnica con Alcaldía Municipal,
comunidad, contratista de obra e interventoría

ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCHA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES
Fecha de suscripción: 13 – MAR -2021
Fecha acta de inicio: 11 – ABR - 2022
Fecha de terminación: 10- ABR -2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 13
Total Projectado: 13

Local: 8
62%


Foráneo: 5
38%

Calificados: 6
75%

No Calificados: 2
25%

Calificados: 2
40%

No Calificados: 3
60%

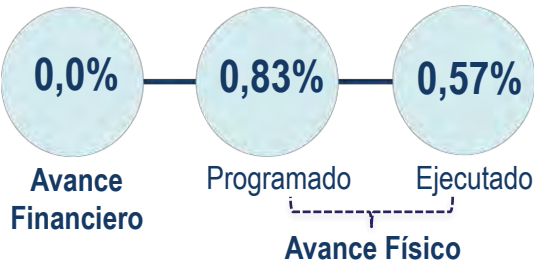

45.589 
Población beneficiada

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-183-2021
Valor: \$ 4.452.771.492,00

Nombre del Contratista:
CONSTRUVAL
INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-743-2021
Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INGENIERÍA
DE MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa



Adecuación de terreno

 **ALCANCE**

Construcción:

- Estructuración de Disipación
- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos



El futuro es de todos

Presidencia de la República

1.3

CONSULTORÍA FAJA PARALELA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.999.422.108.00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Consultoría - Interventoría

Plazo: QUINCE (15) MESES
Fecha de suscripción: 05- MAY-2021
Fecha acta de inicio: 13 – SEP- 2021
Fecha de terminación: 12- DIC-2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Identificación de los usos y ocupaciones del suelo

IMPACTO

Protección ronda hídrica de los ríos Mulato y Sangoyaco

PERSONAL EN CONSULTORÍA

Total Obra: 21
Total proyectado: 21

Local: 19
90%


Foráneo: 2
10%

Calificados: 17
89%

No Calificados: 2
11%

Calificados: 2
100%

No Calificados: 0
0%

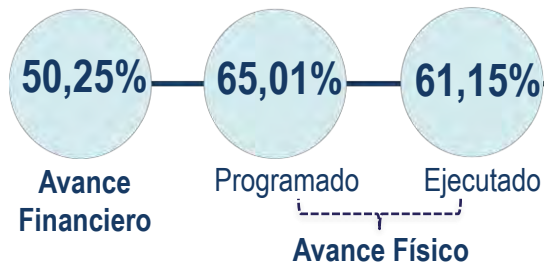

15.000 
Población beneficiada

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-606-2021
Valor: \$ 5.519.435.608.00

Nombre del Contratista:
UNIÓN TEMPORAL
SERVICIONAL - CSAL

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-621-2021
Valor: \$ 479.986.500,00

Nombre de la Interventoría:
UNIÓN TEMPORAL MOCOCA
INTERVENTORÍA

Supervisor UNGRD
Ing. Wilson Eduardo Porras Estrada- Reconstrucción Mococa



ALCANCE

- Faja Paralela



El futuro es de todos

Presidencia de la República

1.3

SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



CUADRO DE CONTROL VÍAS Y ALCANTARILLADO

FICHA	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO				ESTADO
			PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
1	\$ 8.840.532.147,00	0,00%	94,05%	\$ 8.314.520.484,25	59,07%	\$ 5.222.102.339,23	-34,98%
2	\$ 1.348.310.810,87	89,01%	99,00%	\$ 1.334.827.702,76	95,11%	\$ 1.282.378.412,22	- 3,89%
3	\$ 2.485.832.907,67	36,19%	97,30%	\$ 2.418.715.419,16	74,91%	\$ 1.862.137.431,14	- 22,39%
4	\$ 1.089.977.324,67	49,41%	100,00%	\$ 1.089.977.324,67	100,00%	\$ 1.089.977.324,67	Finalizado
5	\$ 3.025.332.743,22	0,00%	95,96%	\$ 2.903.109.300,39	15,45%	\$ 467.413.908,83	- 80,51%
6	\$ 1.291.928.241,52	90,00%	100,00%	\$ 1.291.928.241,52	100,00%	\$ 1.291.928.241,52	Finalizado
7	\$ 2.887.889.611,85	0,00%	87,28%	\$ 2.520.550.053,22	42,95%	\$ 1.240.348.588,29	- 44,33%
8	\$ 1.342.679.144,30	69,75%	97,45%	\$ 1.308.440.826,12	97,87%	\$ 1.314.080.078,53	+ 0,42%
9	\$ 4.581.902.966,83	22,24%	61,86%	\$ 2.834.365.175,28	36,56%	\$ 1.675.143.724,67	-25,30%
10	\$ 1.960.074.687,90	38,37%	100,00%	\$ 1.960.074.687,90	100,00%	\$ 1.960.074.687,90	Finalizado
11	\$ 1.365.555.977,75	0,00%	69,50%	\$ 949.061.404,54	70,00%	\$ 955.889.184,43	+ 0,50%
12	\$ 6.643.141.316,25	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
13	\$ 2.617.277.429,17	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL	\$39.480.435.309,00	\$ 6.508.662.176,25		\$ 26.925.570.619,82		\$ 18.361.473.921,42	
		16,49%		68,20%		46,51%	



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021

Fecha de terminación: 17- JUL-2022

11- ABR-2022 se realiza solicitud de prórroga y adición de recursos.



TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

Estado Actual:

Se encuentra suspendido a partir del 12 de mayo 2022 hasta el 11 de julio 2022. Se trabaja de la mano con alcaldía para aprobar las modificaciones en los proyectos de regalías.

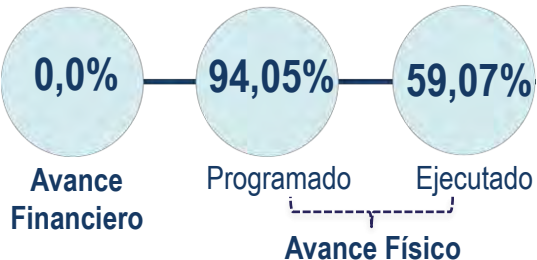

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150,00</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición de vía

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.
- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$1.348.310.810,87

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES
 Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
 Fecha de finalización: 18 – JUL -2022
 30 – MAR - 2022 se solicitó recursos adicionales




TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:
 Se encuentra suspendido, el trámite requerido es un adicional en recurso y requiere ser aprobado por la Alcaldía de Mocoa, se radicó el trámite para revisión a alcaldía el día 13 de mayo de 2022. Se devolvieron documentos con observaciones para corrección.

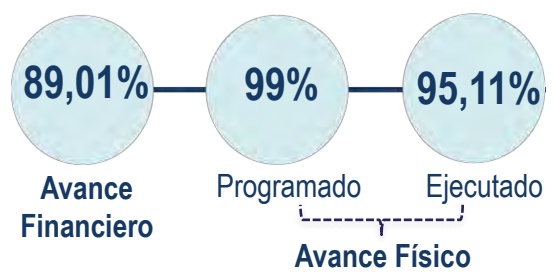

45.589 
 Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.459.103,87</p>
<p>Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa</p>	



Canalización de aguas lluvias



Fundición de placa

ALCANCE

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
 - Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN


**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto
\$2.485.832.907,67

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
 Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021
 Fecha de terminación: 16-SEP-2022
 12-ABR-2022 se solicita prórroga de 3 meses




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

Estado Actual:
Se encuentra suspendido, el trámite requerido es un adicional en recurso y requiere ser aprobado por la Alcaldía de Mocoa, el ajuste se encuentra en revisión de supervisión. La suspensión inicia el 15 de junio de 2022 al 14 de agosto de 2022.

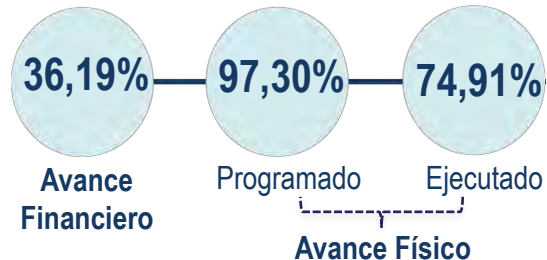

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.932.582,67</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa</p>	



Fundición de placa andenes



Adecuación piso andenes

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 3.025.332.743,22

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de terminación: 05-JUL-2022

Se solicita suspensión N°1 Estudio reemplazo de alcantarillado



TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación 7 VÍAS en 2 SECTORES

Estado Actual:

Suspendido desde el 4/01/2022 al 3/07/2022. Requiere solicitar adicional en recursos y presentar ajuste ante alcaldía.

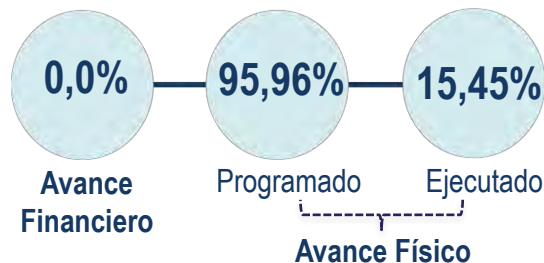

45.589
Población beneficiada

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.727.869,22
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa	



Localización y replanteo Condominio Norte



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.889.611,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de finalización: 22 – AGO -2022



TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

Estado Actual:

Se solicitó ampliación de la suspensión 2 por un término de dos meses a partir del 14 de junio de 2022 hasta 13 de agosto de 2022.

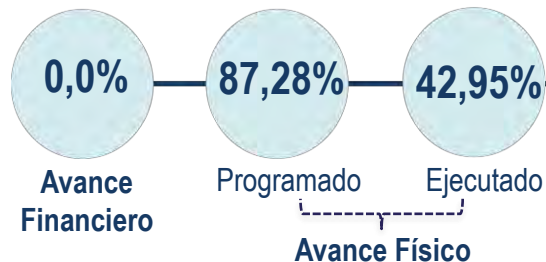

45.589 
Población beneficiada

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.608.651,85
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz– Reconstrucción Mocoa	



Fundición de placa de andén



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$1.342.679.144,30

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021

Fecha de finalización: Pendiente.

Se solicita recursos adicionales para alcantarillado pluvial y suspensión por 60 días



TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de 1 vía

Estado Actual:

Se solicitó suspensión n° 4 por un término de dos meses a partir del 23 de junio de 2022 hasta 22 de agosto de 2022, para subsanar observaciones entregadas por alcaldía de Mocoa.

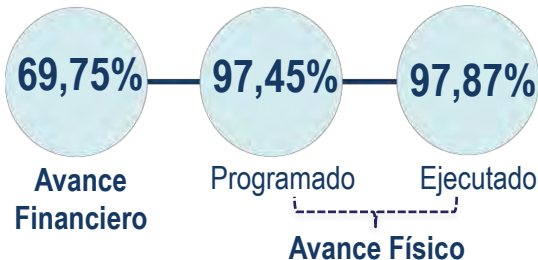

45.589 Población beneficiada

**Reprogramación por prórroga No. 2*

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.448,30
Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Santacruz – Reconstrucción Mocoa	



Sello de juntas

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS TRAMOS VÍA CIUDADELA DEPORTIVA, QUINTA PAREDES , SECTOR ENTRE JOSÉ HOMERO Y URBANIZACIÓN VILLA LEYVA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA


Valor total del proyecto

\$ 4.581.902.966,83

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 29 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Ampliación de suspensión: 06-JUN-2022
29-MAR-2022 Interventoría solicita adición recursos




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-532-2021 Valor: \$ 4.268.718.305</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 313.184.661,83</p>
<p>Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOCA</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mococa</p>	

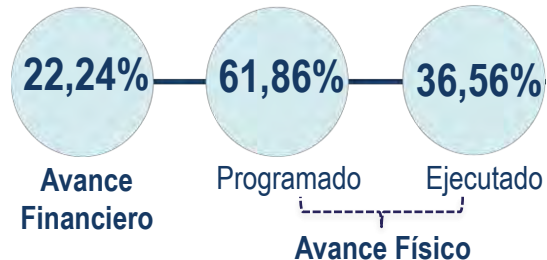

45.589 
Población beneficiada

ALCANCE

Ciudadela deportiva entre CII 12 y Cra 7, y Cra 6 entre CII 4 barrio Jose Homero y CII 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y CII 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

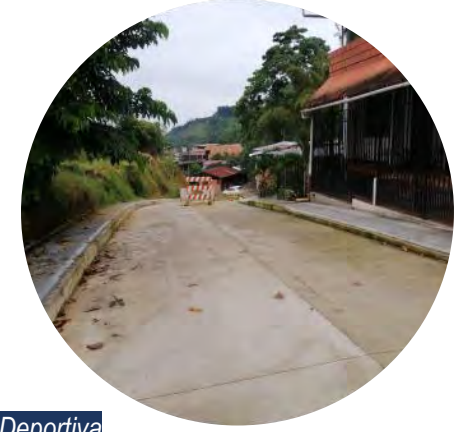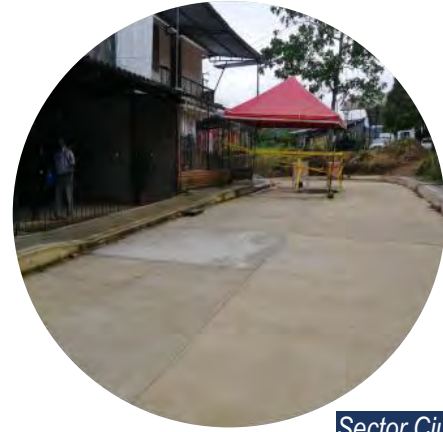

Sector Ciudadela Deportiva

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.365.555.977,75

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – SEP - 2021
Fecha de terminación: 16 - AGO - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN


Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Reinicio de actividades el 26 de junio del 2022.

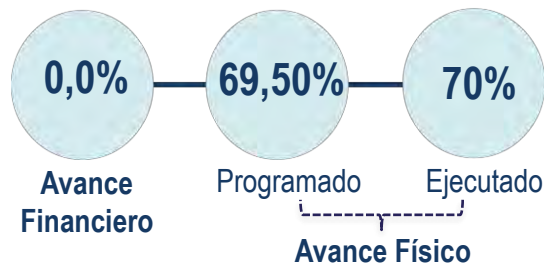

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.799.166</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.756.811,75 (Para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



Proceso de fundición de tapas de alcantarillado



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.643.141.316,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES
 Fecha de suscripción: 28 – JUL – 2021
 Fecha acta de inicio: 31 – MAY – 2022
 Fecha de finalización: 31-MAY-2023



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Se avanza en topografía detallada para solicitar permisos de vertimiento y permisos de ocupación de cauce para implantar disipadores a Corpoamazonia.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
 Total Projectado: 12

**Local: 8
 67%**

**Foráneo: 4
 33%**

**Calificados: 7
 87,5%**

**No Calificados: 1
 12,5%**

**Calificados: 4
 100%**

**No Calificados: 0
 0%**



Toma de topografía

45.589
Población beneficiada



<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 402.620.383,25</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$2.617.277.429,17

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 02 – AGO-2021
Fecha acta de inicio: Pendiente



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO


Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Ampliación de suspensión de contrato de interventoría desde el 6 de junio.

45.589 
Población beneficiada

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 2.435.079.371</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 182.198.058,17</p>
<p>Nombre del Contratista: MEGACONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC</p>
<p>Supervisor UNGRD Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa</p>	



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.



**El futuro
es de todos**

Presidencia
de la República

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II

TOTAL VIVIENDAS

1.209

VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

	NO. VIP	CONTRATISTA	VALOR ACTUAL CONTRATOS	VALOR ADICIONAL (En estudio UNGRD)	AVANCE TECNICO	AVANCE FIN/	VALOR PAGADO	SALDO
CONTRATO 243 DE 2018	436	CONSORCIO MOCOA 2019	\$ 25.731.568.960,00	\$ 17.868.431.040,00	34,92%	20%	\$ 5.146.313.792,00	\$ 20.585.255.168,00
CONTRATO 244 DE 2018	473		\$ 27.915.211.280,00	\$ 19.384.788.720,00	31,27%	17,40%	\$ 4.855.292.697,54	\$ 23.059.918.582,46
			\$ 53.646.780.240,00	\$ 37.253.219.760,00				
TOTAL DE VIVIENDAS	909	VALOR TOTAL	\$ 90.900.000.000,00				\$ 10.001.606.489,54	\$ 43.645.173.750,46

Declarado incumplimiento parcial y penal contratos 243 y 244 de 2018: Contrato 243: \$1.990.594.174,74 y contrato 244: \$1.943.457.009,31. Quedaron en firme el 23 de mayo de 2022. Junio 14 de 2022 declarado siniestro de incumplimiento total en primera instancia Contratos 243 y 244 de 2018, Contrato 243 \$3.155.719.617 y Contrato 244: \$3.639.585.246. Consorcio presentó recurso de reposición el 23 de junio de 2022 en audiencia y presentó plan de choque para construcción de viviendas a 31 de julio de 2022 y cronograma general para cumplimiento de construcción de las 909 viviendas, en revisión por interventoría, MINVIVIENDA y UNGRD. En audiencia del 23 de junio se decretaron pruebas, se realizará visita de terreno para el 1 y 2 de julio de 2022 para verificar avances en obra de acuerdo a lo propuesto por el Consorcio.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA



HMV INGENIEROS LTDA

VALOR



\$7.049.420.065

AVANCE FINANCIERO



32,04%

META JULIO 2022

Declarado incumplimiento total de los contratos de obra PRIMERA INSTANCIA- Consorcio presentó recurso de reposición junto con propuesta para entregar 84 viviendas a 31 de julio de 2022. En revisión por Interventoría, MINVIVIENDA y UNGRD



Julio 31 / 2022

909



Número de viviendas contratos 243 y 244 de 2018

45



El futuro es de todos

Presidencia de la República



ACTIVIDADES RELEVANTES



Estudios y diseños 98,23% (Contrato 244).

Movimiento de tierras **61,497 m3** de tierra (incluido expansión). 284 terrazas.

Cimentaciones fundidas: **140**, armadas y listas para fundir: 2.

Viviendas con muros de primer piso fundidos: **44**, listos para fundir: 2.

Viviendas con muros de segundo piso fundidos: **4**, listos para fundir: 2.

Viviendas con losa entrepiso fundida: **22**, listas para fundir: 2.

Insumos en obra de acero para muros y cimentaciones, 2 proveedores INTERMITENTES de concreto, en obra 4 formaletas. **FALTA EN OBRA: CUBIERTAS, PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS ARQUITECTÓNICOS** para primeras 48 viviendas.

Se inició la construcción de la línea de alcantarillado que conecta al megacolegio.

Continúan actividades en obra para la reparación de estructuras, 10 viviendas intervenidas.



Obra presenta ingreso de personal, promedio semanal de 54 trabajadores (Administrativos 17, mano de obra 27 y maquinaria amarilla 10), para cumplimiento de metas debe ingresar mayor personal, **No se cumplió compromiso del consorcio para mayo y junio: 234 personas en obra.** Mano de obra insuficiente para cumplimiento de metas. Iniciaron actividades de reparación de estructuras.

En obra 4 formaletas. SENA HA ENTREGADO 211 HOJAS DE VIDA A CONSORCIO ayudantes y oficiales de construcción (dic 2021/may 2022). Consorcio presentó solicitud de trámites ambientales ante la Corporación (En estudio por Corporación).



Se espera que las gestiones del consorcio ante Corpoamazonía confirmen lo prescrito en la licencia de urbanismo en el sentido de poder construir las 909 viviendas en el predio. El consorcio radicó 7 de marzo de 2022 ante la corporación la solicitud ambiental (Ocupación de Cauce), Consorcio realizó **reunión con la CORPORACIÓN el 17 de junio de 2022, a la espera de resultados. Fue solicitado a Consorcio iniciar trámite PRÓRROGA LICENCIA DE URBANISMO. Vence 24 de julio de 2022.** En Comités de obra del 7 y 15 de junio de 2022 informó avances de esta actividad manifestando que cumplirán en tiempos la radicación de solicitud de prórroga.



Continúa en proceso de **cobro 72 cimentaciones \$960 millones** aprox. Interventoría aprobará una vez se realicen las acciones técnicas solicitadas.



Avance movimiento de tierras





COMPROMISOS REUNIONES 12, 25 y 28 DE ENERO 2022 y 01 DE JUNIO DE 2022

VICEPRESIDENCIA-MINVIVIENDA-UNGRD.

1

Inventario de materiales para adelantarnos a los posibles problemas, insumos y otros.

Entregado 28 de enero, Interventoría emitió observaciones, en ajuste por Consorcio. Compromiso de entrega: 18 de abril de 2022. **Entregado.**

2

Mano de obra en todos los frentes a más tardar en una semana.

54 trabajadores promedio esta semana, se espera mayor **rendimiento para cumplimiento de metas.** **A finales de junio** se ve ingreso de mayor cantidad de personal. Se inició construcción línea de alcantarillado para conexión del Megacollegio y reparación de estructuras de viviendas muros primer piso.

3

Reunión con Corpoamazonía 26 de enero Consorcio, Interventoría, MINVIVIENDA, Gobernación, UNGRD

Temas ambientales: Ocupación de cauce costado occidental del predio. Consorcio radicó solicitud de trámite ante la corporación. A la espera de pronunciamiento de CORPOAMAZONÍA. Consorcio se reunió con la CORPORACIÓN el 17 de junio, **a la espera de resultados.**

4

A 30 de enero 4 formaletas en obra y 200 obreros activos.

En obra 4 formaletas. Bajo número de personal en obra, se requiere de manera urgente la vinculación de personal para instalación de formaletas para cumplimiento de metas. Se solicitó Consorcio informe de gestión con las 211 hojas de vida presentadas por SENA.

5

Reunión 1/14 de junio 2022 - Ministra de Vivienda Director UNGRD

Consorcio Mocoa 2019 presentó nueva conformación consorcial. Plan de trabajo para construcción **viviendas (15 de junio / 31 de julio 2022) presentado** el 23 de junio en audiencia como recurso de reposición ante la declaratoria en primera instancia incumplimiento total contratos de obra. (documentos administrativos-técnicos-financieros)

VIVIENDA URBANA SAUCES II

PERSONAL STAFF	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							PROMEDIO SEMANAL
		JUNIO							
		L	M	M	J	V	S	D	
SEMANA 4 DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022		20	21	22	23	24	25	26	
CONSORCIO MOCOA 2019	ADMINISTRACION DE OBRA	1	7	7	7	7	7		4
CONSORCIO MOCOA 2019	AUXILIARES DE OBRA, AUXILIAR ADMON	3	3	3	5	5	5		3
INTERVENTORIA HMV	PERSONAL ORCINA, OPERATIVOS	0	8	8	8	8	8		4
TOTAL		4	18	18	20	20	20		17

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	TOTAL PERSONAL POR CONTRATISTA							PROMEDIO
		L	M	M	J	V	S	D	
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO CONSORCIO MOCOA 2019	0	1	1	2	2	2		1
VIGILANCIA CM 2019	CELADURIA OBRA	2	2	2	2	2	2		2
JE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CIMENTACION	0	1	1	1	1	1		1
RDL LOGISTICA Y SOLUCIONES	ESTRUCTURA	4	12	12	20	23	21		15
MET SAS	INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	0	2	2	2	2	2		2
EDUARDO MORA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0	4	4	4	4	3		3
BCH INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0	3	3	3	3	3		3
TEJA CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0	0	0	0	0	0		0
SEBCO SAS	BOMBA MOVIL DE CONCRETO	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL TRABAJADORES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		6	25	25	34	37	34		27
JUAN PABLO GUERRERO	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	5	0	0	0		1
JUAN PABLO GUERRERO	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	0	3	0	0	0		1
JUAN PABLO GUERRERO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	0	1	1	0	0	0		0
EDUARDO MORA	OPERADORES	1	1	1	1	1	0		1
EDUARDO MORA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	5	0	0	1	0	0		1
EDUARDO MORA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	2	0	0	0	0	0		0
LEONEL OJEDA	PALETEROS Y LIMPIALLANTAS, DESPACHADOR	0	2	2	2	2	0		1
LEONEL OJEDA	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	4	6	0	6	0		3
LEONEL OJEDA	OPERADOR PAJARITA	0	0	0	0	0	0		0
LEONEL OJEDA	OPERADOR EXCAVADORA	0	0	1	1	1	1		1
WILSON PUENTES	OPERADOR EXCAVADORA	0	0	1	0	1	1		1
WILSON PUENTES	OPERADOR MINICARGADOR, VIBROCOMPACTAD	1	0	1	1	2	2		1
WILSON PUENTES	CONDUCTORES DE VOLQUETA	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL PERSONAL EN EXCAVACION MECANICA		9	8	21	6	13	4		10
TOTAL PERSONAL EN EL DIA		19	51	64	60	70	58		54

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 54	Local: 30 56%	Calificados: 15 50%
		No Calificados: 15 50%
	Foráneo: 24 44%	Calificados: 15 63%
		No Calificados: 9 38%

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA**

Valor total del proyecto

\$ 2.626.701.730,00

EJECUTOR

UNGRD – FNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 26-ENE-2022
Fecha acta de inicio: 26-ENE-2022
Fecha de terminación: 25 – SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Construcción Vivienda rural

IMPACTO

Construcción de **36 viviendas** en sitio propio

Estado Actual:

El contratista continúa con las actividades programadas teniendo en cuenta el plan de contingencia realizado, en el marco del cual se establecieron 4 frentes de trabajo mas, completando 12 frentes de obra. Se adelantan trabajos de excavación, cimentación y levante de muros.

De acuerdo a la última reunión con el contratista e interventoría, se definió una primera entrega de 8 viviendas el 30 de julio de 2022.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total proyectado: 21

Local: 13
62%

Foráneo: 8
38%

Calificados: 2

15%

No Calificados: 11

85%

Calificados: 8

100%

No Calificados: 0

0%

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1737-2021
Valor: \$ 2.367.193.692,48

Nombre del Contratista:
OSCAR CAPELLINI

Contrato de Interventoría


No. 9677-PPAL001-1843-2021
Valor: \$ 240.667.980,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO APOYOS 2022

Supervisor UNGRD

Carlos Mario Arteaga –Reconstrucción Mocoa

General Proyecto

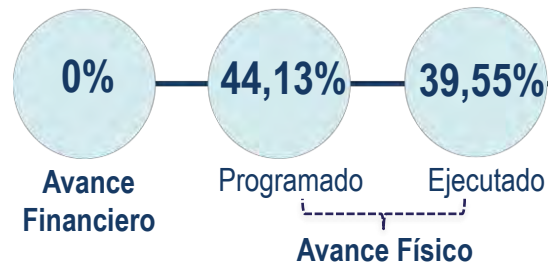

144 
Población beneficiada



Nota: El contratista de interventoría presenta informe ajustado y aprobado en donde se distribuyeron las cargas porcentuales del contrato de obra.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$19.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 19.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: CUARENTA Y SEIS (46) MESES
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018
Fecha de finalización: Pendiente por definir



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado actual:

El proyecto se encuentra en proceso de suspensión por un mes, teniendo en cuenta la solicitud de prórroga realizada por el contratista por un periodo de 3 meses más.

Lo anterior, está siendo analizado técnico y jurídicamente teniendo en cuenta que se debe revisar a quién recae la responsabilidad de dicha solicitud dado que la sustentación de esta es por causa de la no ejecución a tiempo de las actividades requeridas por el proyecto de Sauces II que afectaron directamente la ejecución del Megacollegio, y que fue advertido por este proyecto desde el mes de enero del presente año.

67,42%

Avance
Financiero

87,08%

Programado

80,58%

Ejecutado

Avance Físico



Fotos: Avance Fase 2

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-225-2018 Valor: \$ 17.176.740.466</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-228-2018 Valor: \$1.275.731.970</p>
<p>Nombre del Contratista: Consortio Colegio Mocoa</p>	<p>Nombre de la Interventoría: INGEVAL S.A.S.</p>
<p>SUPERVISOR UNGRD Yineth Arinda Cumplido Botello - SRR</p>	

*\$741.527.564: Se tienen como excedente para compra de computadores - MINTIC



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

PROYECTO CENTRO PENITENCIARIO



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
VALOR CONTRATO ETAPA I	\$ 24.001.631.006
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO
VALOR INTERVENTORIA ETAPAS I Y II	\$ 4.061.664.838
CONSULTOR	CDM Smith
VALOR CONSULTORIA	\$ 630.135.033
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR CONTRATO ETAPA II AGUAS MOCOA S.A E.S.P.	\$ 2.954.350.397
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 31.647.781.274,00



ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	15- JUL-2022
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	90,58%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	89,88%
AVANCE FINANCIERO ETAPA I Y II	89,68%

ESTADO

Proyecto en ejecución, se adelanta actividades de instalación de micromedidores en las redes de distribución del proyecto. Se prorroga el contrato por 45 días (hasta el 15 de julio de 2022) y se reprograman actividades de obra.



El futuro es de todos

Presidencia de la República

4.

PROYECTOS EN CONTRATACIÓN

Impacto

32 Intervenciones – obras de estabilización y recuperación



Actores e inversión

\$206.257 Millones

FNGRD - UNGRD

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración

2022

Mes:

2023

Mes:

FEB

MAR

ABR

MAY - JUN

JUN - DIC

ENE - NOV

1

Estructuración de los procesos (Precontractual).

1

mes

2

Proceso de contratación.

4

meses

3

Ejecución de obras.

18

meses

- Estudios y diseños de obras de mitigación para los sectores medio y alto de las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y parte alta de la quebrada Taruca.
- Se asignaron los recursos para la ejecución de las obras de mitigación.
- Para invitar a cotizar 2 procesos de obra y 2 de interventoría.
- En verificación preliminar 1 proceso de obra y 1 proceso de interventoría.
- En etapa de subsanación 1 proceso de interventoría.
- En espera de RUT y certificación bancaria por parte del contratista 1 proceso de obra y 4 procesos de interventoría.
- En instrucción de elaboración de contrato: 2 procesos de interventoría
- En elaboración de la minuta del contrato por parte de Fiduprevisora 1 proceso de interventoría.
- En expedición de pólizas por parte del contratista 7 procesos de obra y 1 proceso de interventoría
- En perfeccionamiento y legalización de la minuta del contrato 1 proceso de obra.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



AVANCES

- Se adelantan los trámites para la incorporación de los recursos al convenio.
- Equipo de trabajo de la UNGRD realizó desplazamiento al municipio de Mocoa para realizar visita al predio. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la UNGRD y la alcaldía con el fin de verificar los requisitos de postulación del predio.
- El municipio de Mocoa se comprometió a allegar a la UNGRD al 30 de junio, la documentación para postular un nuevo predio para el desarrollo del proyecto.

Impacto

87 Familias




Actores e inversión

\$ 9.309 Millones

- \$ 5.763 millones: Fonvivienda
- \$ 3.545 millones: FNGRD - UNGRD

CRONOGRAMA

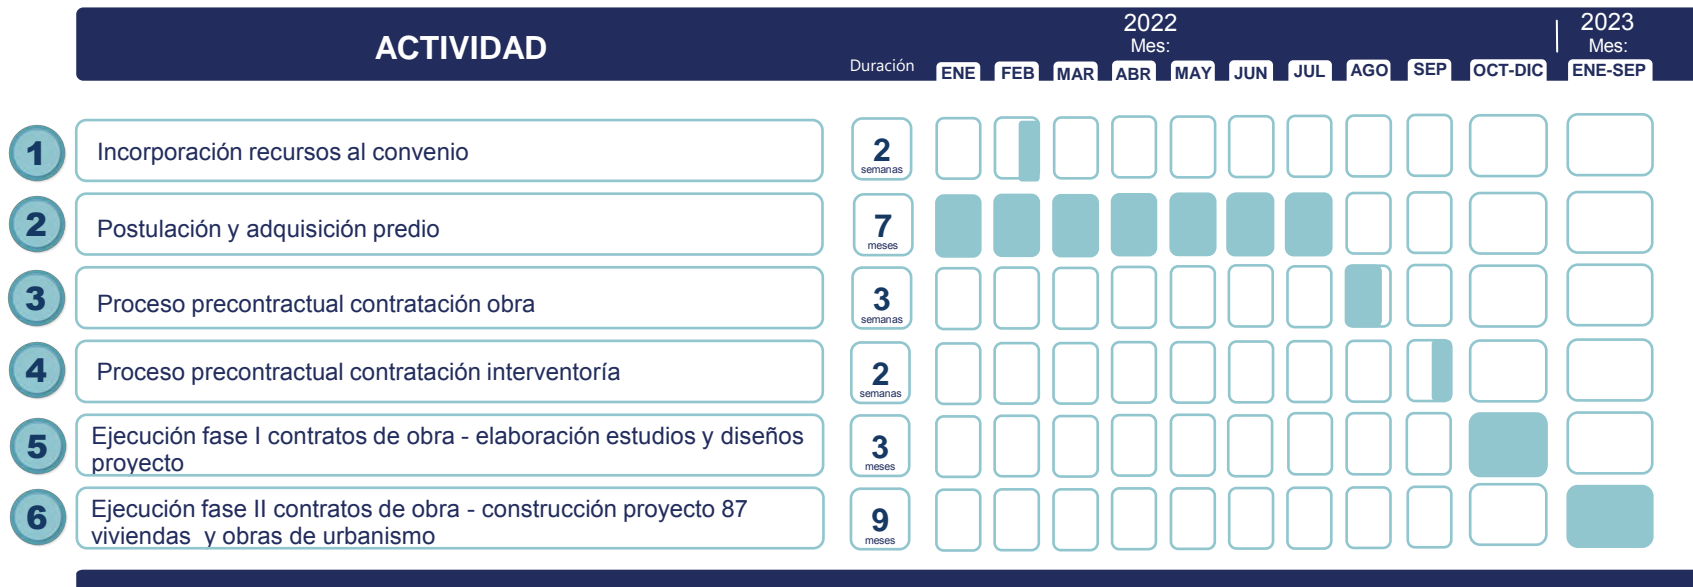

NOTA: Los tiempos anteriores dependerán de la postulación del predio por parte de la Alcaldía de Mocoa.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Impacto **216 Familias**



Actores e inversión

\$ 32.107 Millones


- \$ 22.590 millones: FNGRD - UNGRD
- \$ 9.517 millones: BAC

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE 216 VIVIENDAS Y OBRAS DE URBANISMO	\$ 15.881.977.890	OBRA
RED ELÉCTRICA	\$ 248.646.353	INTERVENTORÍA
TOTAL	\$ 21.463.710.307	

CRONOGRAMA

AVANCES

- El día 22 de abril de 2022 se cargó en la plataforma SECOPII el proceso de selección Licitación Pública FNGRD-LP-001-2022 (CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS RURALES NUCLEADAS MUNICIPIO DE MOCOA).
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2914035&isFromPublicArea=True&isModal=False>
- El día 26 de mayo de 2022 se cerró el plazo para la presentación de ofertas, para lo cual se recibió una propuesta del CONSORCIO URBANISMO RURAL MOCOA.
- El día jueves 9 de junio de 2022, se expidió Resolución “POR MEDIO DE LA CUAL EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FNGRD-LP-001-2022”. Teniendo en cuenta que el proponente no presentó documentos de subsanación.
- Se presenta nuevo cronograma del proceso:

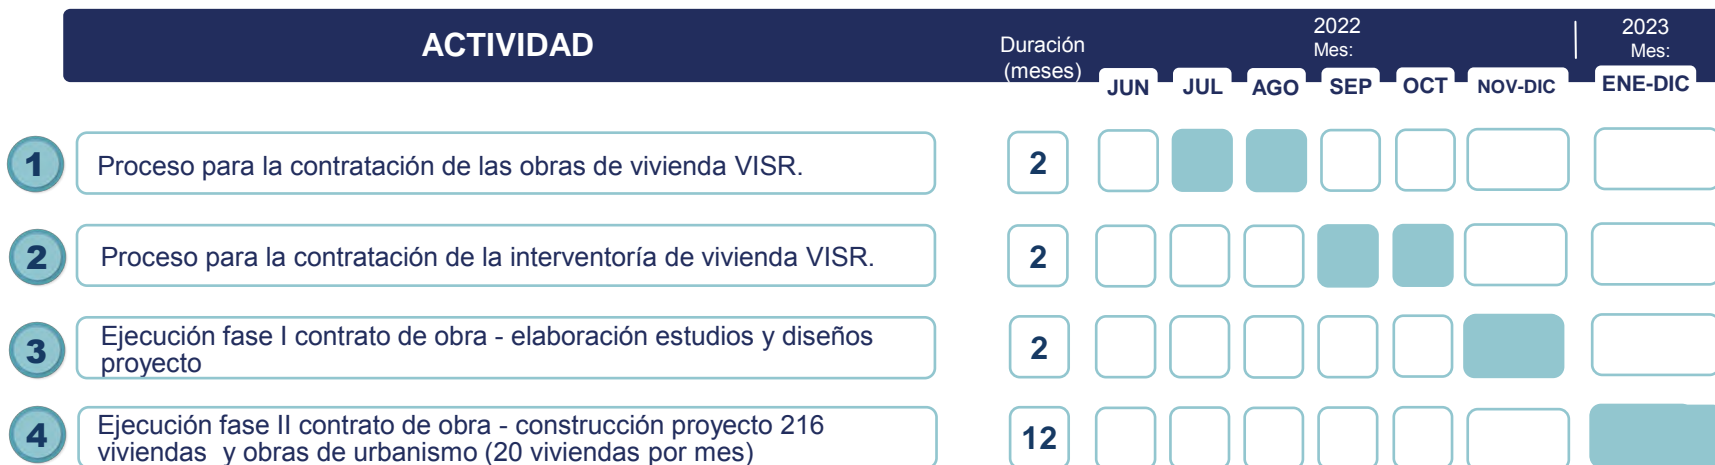

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO

Impacto

435 Comerciantes beneficiados de forma directa

Actores e inversión

\$23.374 Millones

Compra Predio: \$ 400.000.000,00 (ejecutado)

Estudios, diseños y obras compl.: \$1.687.684.080 (ejecutado)

Valor Interventoría: \$311.009.478 (ejecutado)

Valor inicial: \$ 18.976.637.030,00 (Por ejecutar)

Valor Adición: \$ 1.998.695.214,29 (Por ejecutar)

FNGRD



AVANCES

- \$ 2.398.693.558 (valor ejecutado).
- \$ 20.975.332.244,29 (valor por ejecutar).
- Se liquidó el convenio interadministrativo No. 9677-PPAL001-522-2022 suscrito entre el FNGRD y el Municipio de Mocoa.
- Actualmente se adelanta la estructuración del nuevo convenio.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Duración (meses)	2022										2024	
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV - DIC	ENE - MAR	Mes:	Mes:	
1 Liquidación convenio con municipio de Mocoa	1												
2 Estructurar nuevo Convenio con Municipio de Mocoa	15 días												
3 Estructurar proceso licitatorio de obra e interventoría	15 días												
4 Publicación y adjudicación contrato de obra (Ley 80)	2												
5 Publicación y adjudicación contrato de Interventoría (Ley 80)	2												
6 Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	5 días												
7 Ejecución fase I contrato de obra - revision estudios y diseños	1												
8 Ejecución fase II contrato de obra - construcción de la galería de la plaza de mercado	18												



El futuro es de todos

Presidencia de la República

Impacto

16 barrios **2.522** usuarios

Actores e inversión

\$7.500 Millones

FNGRD - UNGRD

- Viceministerio de agua y Saneamiento Básico, Findeter y FNGRD – UNGRD.



AVANCES

- Se suscribió convenio No. 9677-PPAL001-463-2022, entre el FNGRD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El 16/02//2022 se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos No. 9677-PPAL001-609-2022, celebrado con Findeter.
- Entre el 13 y 15 de junio de 2022 se realizó visita para socializar el proyecto y hacer reconocimiento de campo con el contratista de obra (Consortio Captumayo), interventoría (Consortio Interventoría Mocoa 083), empresa de servicios públicos (Aguas de Mocoa) y la UNGRD.
- Se prevé la firma de actas de inicio para el 30 de junio. A la fecha, se están evaluando los requisitos para la validación y firma del acta de inicio de obra. Los requisitos de interventoría se encuentran completos.


ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	TIEMPO	2022			2023	
		ENE	FEB	MAR-MAY	ENE	FEB
1 Suscripción del convenio con el Viceministerio de agua y saneamiento básico	2 semanas	█				
2 Suscripción del contrato con Findeter para la ejecución del proyecto	2 semanas		█			
3 Creación del patrimonio autónomo y trámites precontractuales	2 semanas		█			
4 Proceso de contratación obra e interventoría	13 semanas			█	█	
5 Legalización de los contratos de obra e interventoría	3 semanas				█	
6 Ejecución	7 meses y 2 semanas				█	█



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



Impacto

45.589 Personas beneficiadas

Actores e inversión

\$553 Millones

FNGRD - UNGRD



AVANCES

- Se asignaron los recursos para el fortalecimiento del SAT.
- Actualmente se realiza el estudio de mercado para actualizar precios y establecer el presupuesto oficial del proyecto.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Duración
(meses)

2022

Mes:

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL - OCT

1

Proceso contratación

4



2

Ejecución de actividades

4




El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

5.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

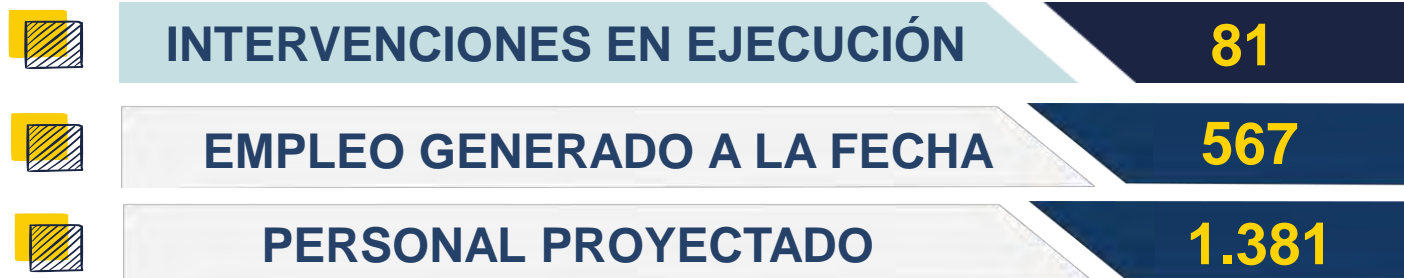

	22/06/22	29/06/22		22/06/22	29/06/22
MANO DE OBRA LOCAL	358	363	MANO DE OBRA FORÁNEA	200	204
CALIFICADOS	184	173	CALIFICADOS	158	162
NO CALIFICADOS	174	190	NO CALIFICADOS	42	42
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	64%	64%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	36%	36%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.021	1.130
EMPLEOS INDUCIDOS	227	251
TOTAL EMPLEOS	1.248	1.381

GRACIAS
