

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Junio 30 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos:

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

18 de obra

18

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones

17 →
CONTRATOS

Total de contratos:

13 de obra

4 de interventoría

Ejecución

12

4

Contratación

1

0

Perfeccionamiento

0

0

% en Perfeccionamiento ejecución

92,3%

100%

Inicio total de las obras de vías y alcantarillado:

8 de julio 2021

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
Fecha de finalización actualizada por suspensión:
: 12 - AGO – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

Estado de la Obra:

La Alcaldía de Mocoa presenta acta de suspensión No. 03 al contrato de Obra No. 063 del 2019; esto sustentado en la falta de materiales en la zona, producto de los cierres viales que ha generado el paro nacional.

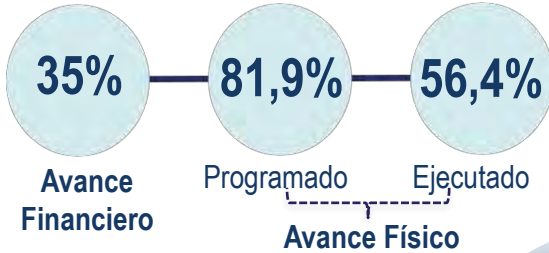

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960
Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa	Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
Fecha de finalización actualizada: 14 - JUN - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 99 Total Projectado: 100	Local 66 67%	Calificados 31 47%
		No Calificados 35 53%
	Foráneo 33 33%	Calificados 31 94%
		No Calificados 2 6%

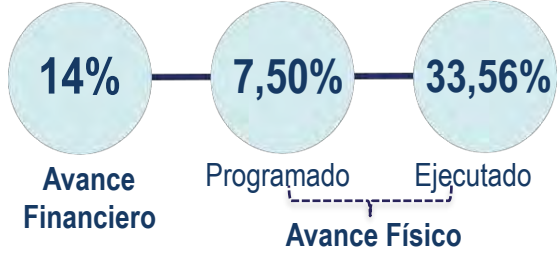

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
 Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 27
 Total Projectado: 30

Local 22 81%	Calificados 14 64%
	No Calificados 8 36%
Foráneo 5 19%	Calificados 5 100%
	No Calificados 0 0%

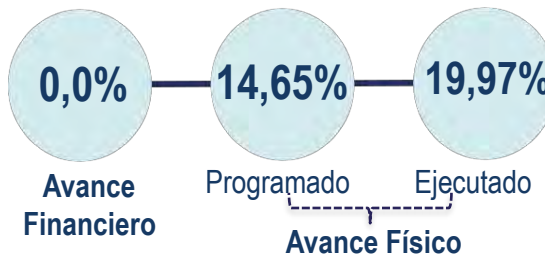

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOCA LH 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de colcho gaviones del muro No. 6



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

Estado Actual:

Está en proceso de reprogramación de la obra y presentación de un plan de contingencia para cumplimiento del objeto contractual dentro de los plazos establecidos.
Una vez se cuente con lo anterior, se ajustará los porcentajes de programado vs lo ejecutado.



45.589
Personas beneficiadas

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12
Total Projectado: 30

Local 10
83%

Calificados 10
100%

No Calificados 0
0%

Foráneo 2
17%

Calificados 2
100%

No Calificados 0
0%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-980-2020
Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre del Contratista:
HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD
Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



Visita al sitio de obra para localización del Azud 10.

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021
 Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

Obra física:

Se prepara soluciones en la implantación de la estructura, en trabajo conjunto con los diseñadores HIDROCONSULTAS S.A.S para la primera semana de julio. Con el objetivo de iniciar obra física, el contrato cuenta con los productos entregados y revisados por interventoría PMT, SST, PB, PGS Y PMA.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26
 Total Projectado: 35

**Local 18
 69%**

**Foráneo 8
 31%**

Calificados 14
78%

No Calificados 4
22%

Calificados 8
100%

No Calificados 0
0%



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1334-2020
 Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO RIO MULATO.

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-141-2021
 Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 RÍO MULATO

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



**El futuro
 es de todos**

Presidencia
 de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 08 - JUL - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 14 Total Projectado: 40	Local 12 86%	Calificados 8 67%
		No Calificados 4 33%
	Foráneo 2 14%	Calificados 2 100%
		No Calificados 0 0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 08 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 16 Total Projectado: 45	Local 12 75%	Calificados 6 50%
		No Calificados 6 50%
	Foráneo 4 25%	Calificados 4 100%
		No Calificados 0%

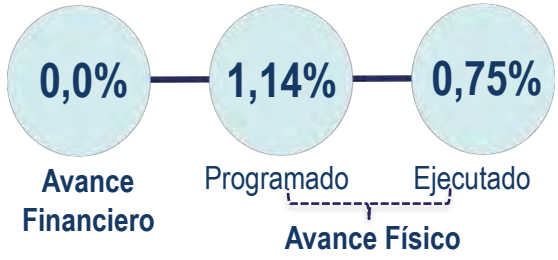

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOA
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 35

Local 11
73%

Foráneo 4
27%

Calificados 9

82%

No Calificados 2

18%

Calificados 3

75%

No Calificados 1

25%

0,0%

Avance
Financiero

7,03%

Programado

7,95%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1388-2020
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DIQUE 1

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 536.303.878,1967

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Acero Fisurado



Excavaciones



ALCANCE

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%

Foráneo 10
48%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 6
60%

No Calificados 4
40%

0,0%

Avance
Financiero

1,01%

Programado

7,14%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOCA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 508.303.365,8033

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mococa



Fisurado



Solado para Dentellón



ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020

Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5

Total Projectado: 35

Local: 3
60%


Foráneo: 2
40%

Calificados: 3
100%

No Calificados 0
0%


Calificados : 2
100%

No Calificados 0
0%

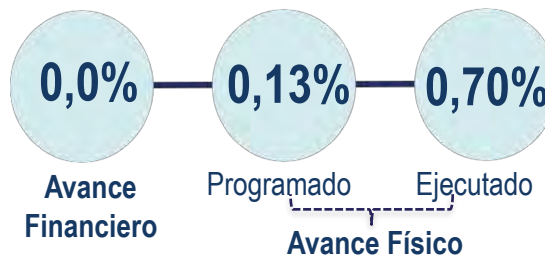

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1119-2020 Valor: \$ 5.280.966.838,95	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 426.384.755,43 (para este contrato)
Nombre del Contratista: A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	

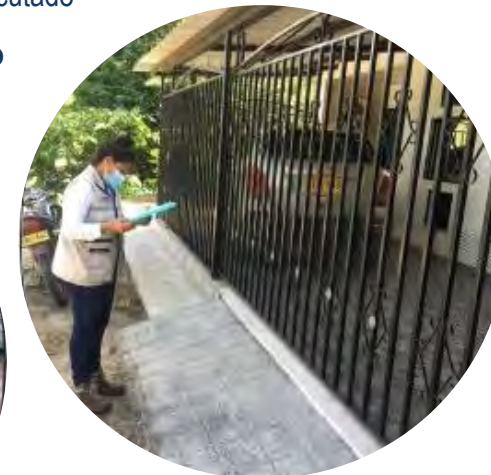

Toma muestras agua y actas de vecindad



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 8 Total Projectado:45	Local: 4	Calificados: 4
	50%	100%
		No Calificados 0
		0%
	Foráneo: 4	Calificados : 3
50%	75%	No Calificados 1
		25%

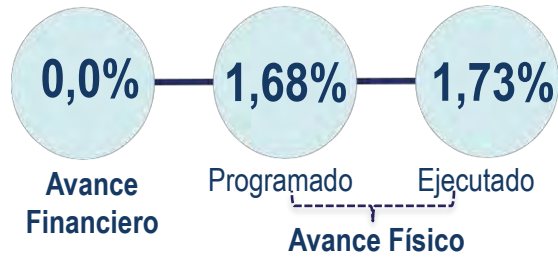

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68 <hr/> Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RÍO SANGOYACO 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



Construcción Dique Azud 13



Actas de vecindad



- ALCANCE**
- Jarillón 02 (200 m)
 - Azud 12
 - Muro 06
 - Azud 13
 - Azud 14
 - Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

Estado Actual:

El contratista de obra continúa realizando los ajustes requeridos por la interventoría a los documentos del PMT, PMA y Protocolo de Bioseguridad.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
 Total Projectado: 61

Local 6
75%

Foráneo 2
25%

Calificados 3

50%

No Calificados 3

50%

Calificados 2

100%

No Calificados 0

0%



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1382-2020
 Valor: \$ 24.574.127.979,39

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-205-2021
 Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO DRAGADO
 MOCOA 2020

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO
 INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro
 es de todos

Presidencia
 de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 25
 Total Projectado: 37

Local: 12
48%

Foráneo: 13
52%

Calificados: 11


92%

No Calificados 1
8%

Calificados : 13

100%

No Calificados 0
0 %

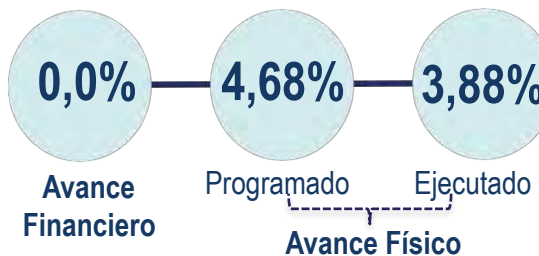

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.478.287,36	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.807.563,26 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	



Mejoramiento de Accesos



Excavaciones y control topográfico



ALCANCE • Azud 10, Sector Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020
Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 7
Total Projectado: 30

Local: 4
57%


Foráneo: 3
43%

Calificados: 4
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 2
67%

No Calificados 1
33%

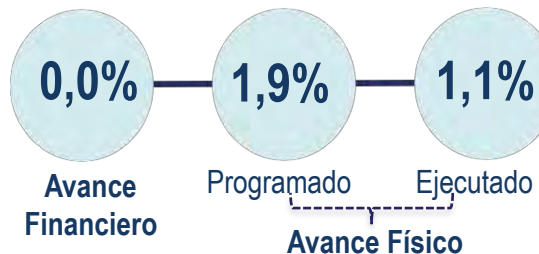

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5
 Total Projectado:30

Local: 1 20%	Calificados: 1 100%
	No Calificados 0 0%
Foráneo: 4 80%	Calificados : 4 100%
	No Calificados 0 0%

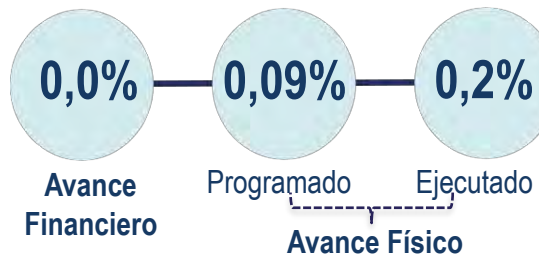

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Replanteo



Actas de vecindad



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10



El futuro
 es de todos

Presidencia
 de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 8.991.999.385,27

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES



Fecha de suscripción: Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

Fecha acta de inicio: Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

Estado Actual:

Esta obra cuenta con interventoría y contratistas de obra en sitio desde el **22/06/21** para iniciar el proceso de socialización y revisión de los estudios y diseños e iniciar localización de las obras.



Visita de obra Muro 01



45.589

Personas beneficiadas



Visita de obra Azud 7

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1342-2020
 Valor: \$ 8.317.396.139,27

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-098-2021
 Valor: \$ 674.603.246,00

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO AZUD MOCOA
 520

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 MUROS MOCOA 2020

Supervisor UNGRD
 Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.474.375.500,46

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: En proceso de perfeccionamiento

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

Estado Actual:


Esta intervención cuenta con interventoría desde el **23/03/21** y se remitió a Fidupervisora las pólizas para el respectivo perfeccionamiento y legalización, de esta manera poder dar inicio a las actividades de obra.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.841.500.569,72 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.874.930,74 (para este contrato) <hr/> Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	



45.589

Personas beneficiadas

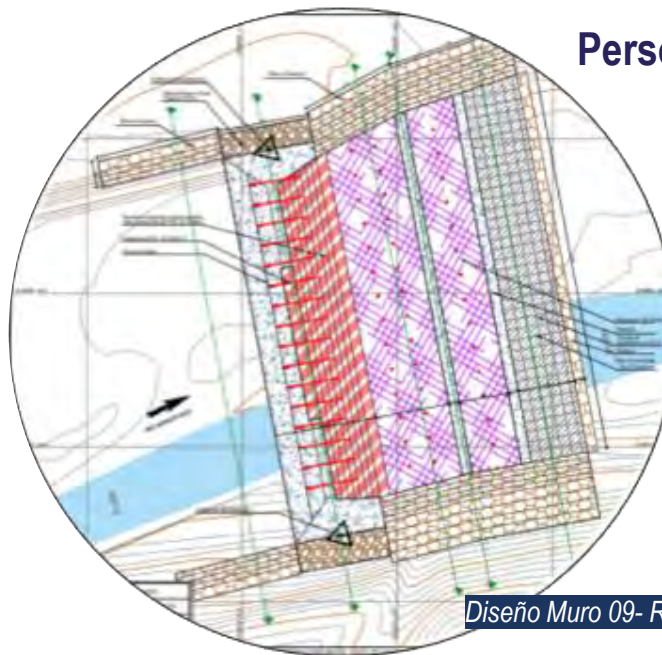

Diseño Muro 09- Río Sangoyaco



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: Se está a la espera de aclaración con
Corpoamazonía para dar inicio.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes
intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

En julio se definirá inicio de obras toda vez que se solicitó aclaraciones a Corpoamazonía sobre los estudios y diseños entregados.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-183-2021
Valor: \$ 4.452.771.492,00

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-743-2021
Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre del Contratista:
CONSTRUVAL
INGENIERÍA S.A.S.

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INGENIERÍA DE
MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa




Sector a intervenir



45.589

Personas beneficiadas

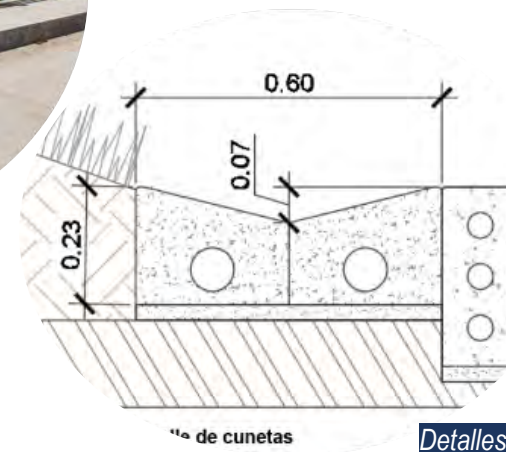

ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.2

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y
ALCANTARILLADO EN
EJECUCIÓN**

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021

Fecha de finalización actualizada: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 15	Local 5 45%	Calificados 4 80%
		No Calificados 1 20%
	Foráneo 6 55%	Calificados 6 100%
		No Calificados 0 0%

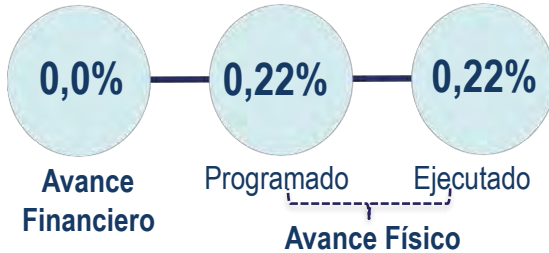

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES
Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:
18 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:
El contrato se encuentra suspendido por motivos de orden nacional, sin embargo, la interventoría adelanta revisión del PMA, PMT, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad. Se adelanta trámite de anticipo, antes de la suspensión el contratista adelantó figurado de acero.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Tramos a intervenir



 **45.589**
Personas beneficiadas

 **ALCANCE**

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
 - Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
 Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
 Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

Estado Actual:

El contrato se encuentra suspendido por motivos de paro nacional.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Tramos a intervenir



 **45.589**
 Personas beneficiadas

✓ ALCANCE

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
 - Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
 - Barrio Piñayaco Z4 – 3.
 - Barrio Piñayaco Z4 – 4.
 - Barrio Peñón Z5 – 1.
 - Barrio Peñón Z5 - 2B.
 - Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 19 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 27 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



26 - OCT - 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

Estado Actual:

Se adelantó visita técnica por parte de la Alcaldía para verificación de líneas de paramentos, el contratista recibió material, está pendiente por parte de la Secretaría de Tránsito aprobación de PMT para iniciar labores de obra.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-407-2021
Valor: \$ 1.017.658.395

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 72.268.367

Nombre del Contratista:
ALEX ALBERTO CALVACHE
MENA

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD
Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Verificación de paramentos por parte de la Alcaldía



Llegada de material

45.589
Personas beneficiadas

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

Estado Actual:

El contrato se encuentra suspendido por motivos de paro nacional.


Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Sectores a intervenir



 **45.589**
Personas beneficiadas

 **ALCANCE**

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
 Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
 Fecha de finalización actualizada por suspensión:



18 - NOV - 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Se adelantó verificación de topografía por parte de interventoría, el contratista recibió material, está pendiente por parte de la Secretaría de Tránsito aprobación de PMT para iniciar labores de obra.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-518-2021 Valor: \$ 1.206.210.066	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 85.658.245
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL CAIMARON	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Verificación de topografía por parte de la interventoría



Acopio de material

45.589
 Personas beneficiadas



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión: 18 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

Estado Actual:

Se adelantó verificación de topografía por parte de interventoría, está pendiente por parte de la Secretaría de Tránsito aprobación de PMT para iniciar labores de obra.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Verificación de topografía por parte de la interventoría



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7ª.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
 - Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
 - Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
 - Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión: 09 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

El contrato se encuentra suspendido por motivos de orden nacional, sin embargo, se adelantó verificación de topografía por parte de interventoría, así mismo del PMA, plan de gestión social, plan SISO, protocolo de bioseguridad. Pendiente aprobación de PMT por parte de Secretaria de Tránsito.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.329
Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Verificación de topografía por parte de la interventoría



45.589

Personas beneficiadas

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Visita técnica de obra para reconocimiento del sitio con interventoría y contratista. Reunión técnica para revisión de diseños y observaciones.



Box Couvert- Jose Homero

45.589

Personas beneficiadas



Sector Jose Homero- Villa de Leyva

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-532-2021
Valor: \$ 4.268.718.305

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-774-2021
Valor: \$ 495.382.720

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO PAVIMENTOS
 MOCOCA

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO
 INTERPAVIMENTOS EDUPAC

Supervisor UNGRD
 Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: No cuenta aún con fecha

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Se realizó visita técnica al sector de la vereda Nueva Esperanza.



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-549-2021 Valor: \$1.830.025.649 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOAC CONSTRUCCIONES	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 130.312.324 (Para este contrato) <hr/> Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Visita técnica



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.769.435.891

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

No se ha dado inicio al contrato de obra ya que el contrato de interventoría se encuentra suspendido, sin embargo, se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.



Visita Campo

45.589

Personas beneficiadas



Localización

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-550-2021
Valor: \$ 1.282.970.234

Nombre del Contratista:
DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-969-2021
Valor: \$ 82.948.494
(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD
Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.644.745.708,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

No se ha dado inicio al contrato de obra ya que el contrato de interventoría se encuentra suspendido, sin embargo, se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.




Visita lugar de ejecución

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.241.228.546	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897	Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	

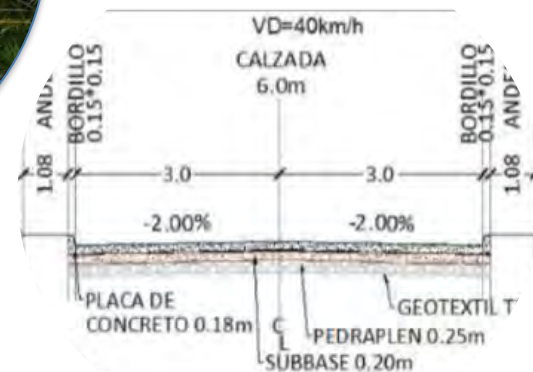

Sección Transversal Típica



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

1.3

**SEGUIMIENTO VÍAS
Y ALCANTARILLADO**

1 Mejoramiento de la vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.



2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones

*Avance



30,12%

Avance financiero

0%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%

0%

total de
viviendas



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

*Avance estudios, diseños y construcción preliminares primera fase constructiva del proyecto. Aprobado plan de choque. Avance a trámite de desembolso \$1.400 mill.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$ 4.852 millones

Avance financiero

30,05%

CRONOGRAMA

FECHA DE
TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



519

909

PERSONAL
PROYECTADO



82

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Continúa movimiento de tierras 15.607,8 m3 de tierra (incluido expansión).
- En revisión por Alcaldía concepto emitido por CORPOAMAZÓNÍA.
- Programación de obra ajustada de acuerdo a plan de choque.
- Vinculación Director de Obra, Residente Ambiental pendiente, Residente Social vinculado.
- Dos cuadrillas de maquinaria amarilla funcionando en obra.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	12	2	14
No calificado	27	0	27
Total	39	2	41





N° DE VIVIENDAS



87

INVERSIÓN



5.764 millones

valor otorgado por FONVIVIENDA a través del Convenio No. 9677-PPAL001-783-2018



AVANCES

- Elaboración de Documentos para contratación derivada Convenio 783. Se entregarán a Secretaria General el día **2/07/21** para su revisión:

Contrato de obra

- Formato de Presupuesto oficial.
- Justificación.
- Anexo técnico.
- Formatos del 1 al 6b.
- Formato N° 11: Acta de compromiso de confidencialidad de información relacionada con el proyecto.
- Formato de Excel del 7 al 10.


Contrato de interventoría

- Formato de Presupuesto oficial.
- Justificación.
- Anexo técnico.
- Formatos del 1 al 6b.
- Metodología de plan de cargas.
- Formato N° 11: Acta de compromiso de confidencialidad de información relacionada con el proyecto.
- Formato de Excel del 7 al 10.



AVANCES

VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



VIVIENDA RURAL NUCLEADA



\$9.516.549.300 En convenio con **Banco**
\$15.436.450.700 Recursos faltantes

- **Mocoa Disperso:** El proceso de **contratación por ley 80** se encuentra en revisión para publicación, teniendo en cuenta los requisitos de ley con los que debe cumplir, ya que técnicamente se encuentra avalado y estructurado según los **requerimientos del BAC**. Se continúa la ruta del publicación del proceso esta semana y esperará el plazo de ley del proceso (2 meses para adjudicación)

- **Mocoa Nucleada:** Se obtuvo según compromisos y trabajo mancomunado con el **BAC** y la **alcaldía municipal** el aval técnico del proyecto; quedando como compromiso la presentación en la medida que se obtenga toda la documentación faltante de los beneficiarios para completar los **216** beneficiarios, la subsanación del prototipo que debe presentar **SPIA** y que a la **fecha NO se ha realizado**.

Sin embargo, por el interés de las entidades en iniciar la contratación se da aval a la **UNGRD** para esta contratación; subsanando o entregando los pendientes en la medida que avancen los procesos.

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



12 - SEP - 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado Actual:

El proyecto reinicia el **01/07/21**

10%

Avance
Financiero

94,7%

Programado

66%

Ejecutado

Avance Físico



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

Supervisor UNGRD
Yineth Arinda Cumplido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo

PROYECTO PLAZA DE MERCADO

INVERSIÓN
\$6.000.000,00*

*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.




PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56



AVANCES

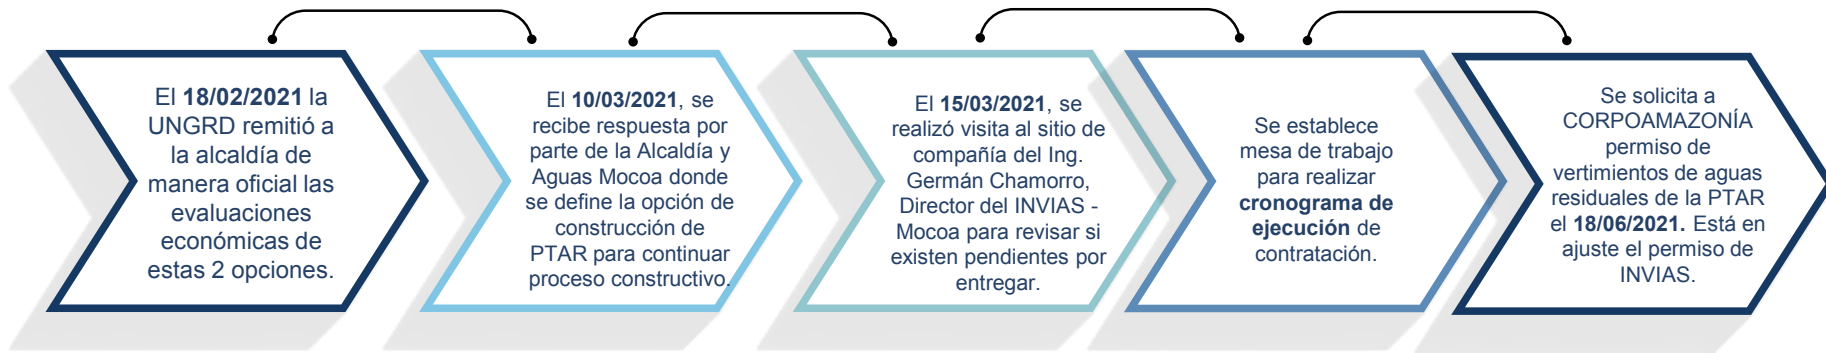

CRONOGRAMA



COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO



AVANCES



INVERSIÓN

\$ 1.257.921.000,00* lote

\$ 80.000.000.000,00 Construcción

* Estos recursos serán gestionados por el FNGRD para su adquisición.



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12
ESTADO	Terminado



ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente 107 l/s.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% AVANCE PROGRAMADO	0,8%
% AVANCE EJECUTADO	0,8%
ESTADO	En ejecución






El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

	OBRAS EN EJECUCIÓN	32
	EMPLEO GENERADO A LA FECHA	329
	PERSONAL PROYECTADO	802

	23/06/21	30/06/21		23/06/21	30/06/21
MANO DE OBRA LOCAL	214	231	MANO DE OBRA FORÁNEA	97	98
CALIFICADOS	134	136	CALIFICADOS	88	89
NO CALIFICADOS	80	95	NO CALIFICADOS	9	9
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	69%	70%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	31%	30%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	592	1.444
EMPLEOS INDUCIDOS	132	321
TOTAL EMPLEOS	724	1.765

GRACIAS
