

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Julio 07 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos:

Ejecución

% en Perfeccionamiento ejecución

18 de obra

18

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones

17 →
 CONTRATOS

Total de contratos:

13 de obra

4 de interventoría

Ejecución

12

4

Contratación

1

0

Perfeccionamiento

0

0

% en Perfeccionamiento ejecución

92,3%

100%

Inicio total de las obras de vías y alcantarillado:

27 de julio 2021

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
 Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
 Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
 Fecha de finalización actualizada por suspensión:
 12 - AGO – 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
 77.20 ml Pantalla inclinada 457 m3

Estado de la Obra:

El proyecto se encuentra suspendido. La alcaldía de Mocoa aprobó suspensión por dos (2) meses y se reiniciará el 13/08/21.

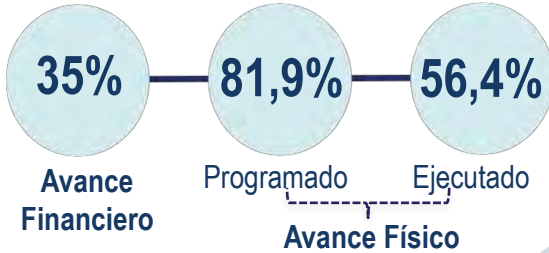

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960
Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa	Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
 Fecha de finalización actualizada: 14 - JUN - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 130 Total Projectado: 140	Local 95 73%	Calificados 38 40%
		No Calificados 57 60%
	Foráneo 35 27%	Calificados 28 80%
		No Calificados 7 20%

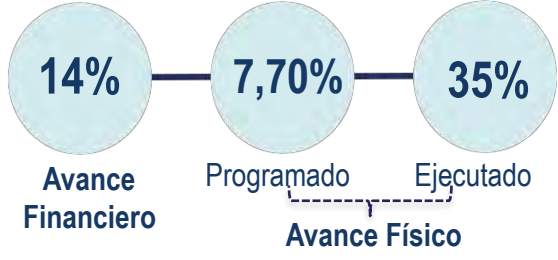

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
 Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 29 Total Projectado: 32	Local 24 83%	Calificados 14 58%
		No Calificados 10 42%
	Foráneo 5 17%	Calificados 5 100%
		No Calificados 0 0%

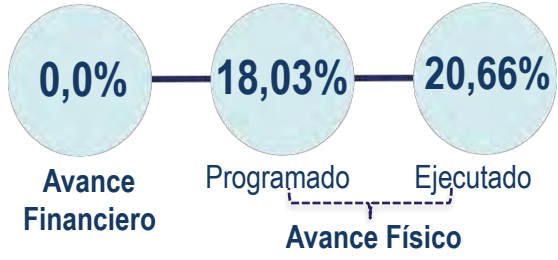

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de colcho gaviones del muro No. 6



Visita de los especialistas del contratista de obra con la interventoría

ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

Estado Actual:

Se reinicia con actividades de manejo de cauce de río, conformación de Jarillón y excavación para gavión de muro 7. Contratista de obra presenta nueva reprogramación la cual fue avalada por la interventoría.

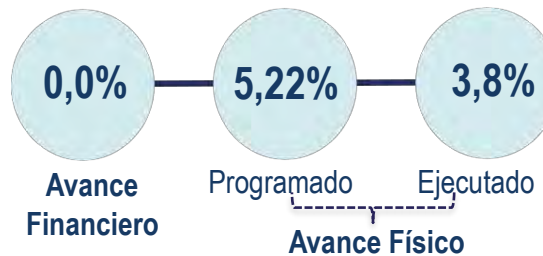

45.589
Personas beneficiadas

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 12 Total Projectado: 30	Local 10 83%	Calificados 10 100%
		No Calificados 0 0%
	Foráneo 2 17%	Calificados 2 100%
		No Calificados 0 0%



ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-980-2020 Valor: \$ 5.710.699.339,98 <hr/> Nombre del Contratista: HAROLD MUÑOZ MUÑOZ	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mococa	

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

Obra física:

En espera de la reunión y validación de la propuesta presentada a los diseñadores HIDROCONSULTA S.A.S para la implantación de las estructuras dique 1. Actualmente el proyecto cuenta con los productos entregados y revisados por interventoría PMT, SST, PB, PGS Y PMA.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26
 Total Projectado: 35

**Local 18
 69%**

**Foráneo 8
 31%**

Calificados 14
78%

No Calificados 4
22%

Calificados 8
100%

No Calificados 0
0%

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1334-2020
 Valor: \$ 6.924.254.899,43


Nombre del Contratista:
 CONSORCIO RIO MULATO.

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-141-2021
 Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 RÍO MULATO

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa

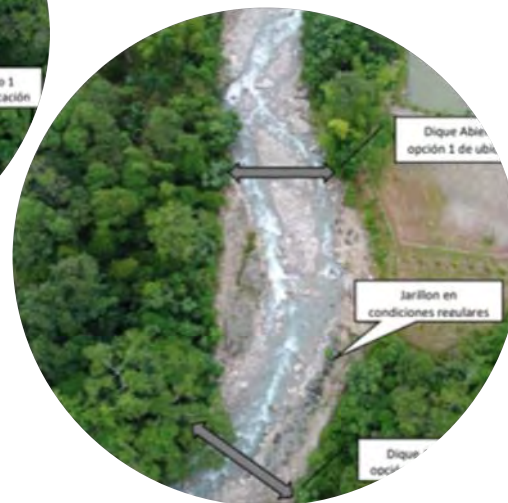

45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 08 - JUL - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 14 Total Projectado: 40	Local 12 86%	Calificados 8 67%
		No Calificados 4 33%
	Foráneo 2 14%	Calificados 2 100%
		No Calificados 0 0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto
\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 08 - SEP - 2022


TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 16 Total Projectado: 45	Local 12 75%	Calificados 6 50%
		No Calificados 6 50%
	Foráneo 4 25%	Calificados 4 100%
		No Calificados 0%

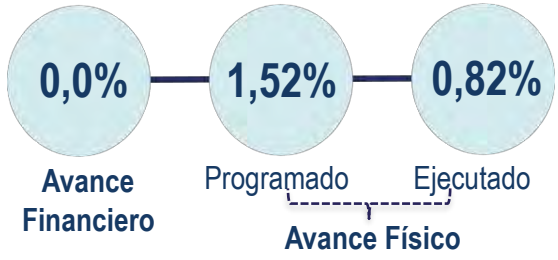

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-201-2021 Valor: \$ 11.334.163.511,06	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-344-2021 Valor: \$ 929.229.966,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO MUROS MOCOCA
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 35

Local 11
73%

Calificados 9

82%

No Calificados 2

18%


Foráneo 4
27%

Calificados 3

75%

No Calificados 1

25%

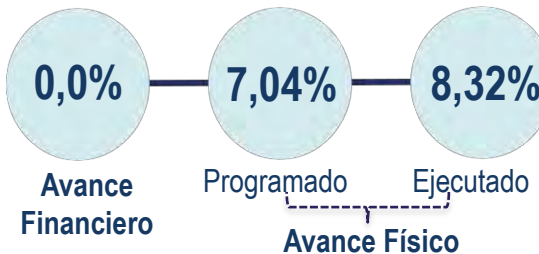

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%

Foráneo 10
48%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 6
60%

No Calificados 4
40%

0,0%

Avance
Financiero

2,15%

Programado

7,57%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 508.303.365,8033

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Formaleta dentellón



Armado de acero para dentellón



ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020

Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5

Total Projectado: 35

Local: 3
60%


Foráneo: 2
40%

Calificados: 3
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 2
100%

No Calificados 0
0%

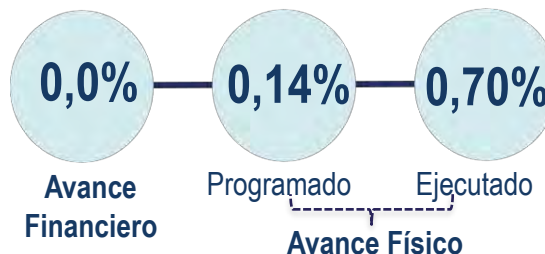


45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1119-2020 Valor: \$ 5.280.966.838,95	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 426.384.755,43 (para este contrato)
Nombre del Contratista: A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



Replanteo y reprogramación

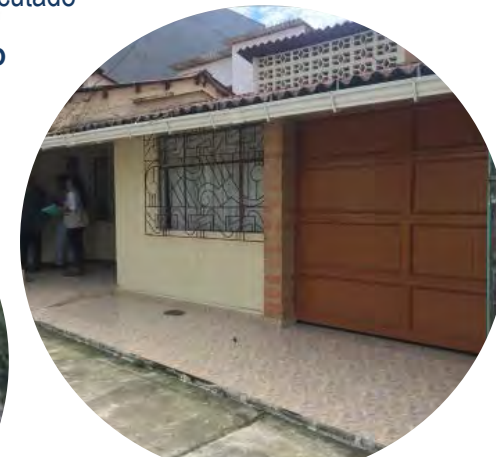

Actas de vecindad



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
 Total Projectado: 45

Local: 4
50%


Foráneo: 4
50%

Calificados: 4
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 3
75%

No Calificados 1
25%

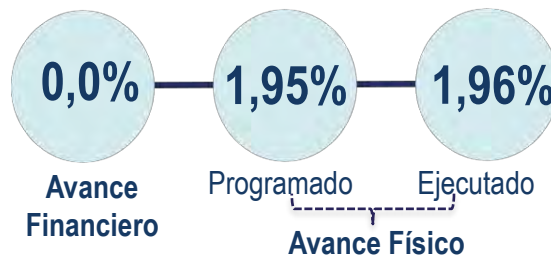

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68 ----- Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



Replanteo Muro 06



Construcción Dique Azud 13



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

Estado Actual:

Se solicita por parte del contratista el permiso de servidumbre en el predio del señor Carlos Melo, sector donde quedará implantado el Jarillón.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 61

Local 6
75%

Foráneo 2
25%

Calificados 3
50%

No Calificados 3
50%

Calificados 2
100%

No Calificados 0
0%



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO
MOCOA 2020

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021

Fecha de finalización actualizada: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 27

Total Projectado: 37

Local: 11
41%

Foráneo: 16
59%

Calificados: 9

82%

No Calificados 2

18%

Calificados : 15

94%

No Calificados 1

6%

0,0%

Avance
Financiero

7,06%

Programado

4,92%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-311-2021
Valor: \$ 2.723.478.287,36

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-110-2021
Valor: \$ 219.807.563,26

(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Fragmentación de rocas por el método manual con rotomartillo



Excavación mecánica en material aluvial del cauce para desviación



ALCANCE • Azud 10, Sector Río Sangoyaco



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020
Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12

Total Projectado: 30

Local: 6
50%


Foráneo: 6
50%

Calificados: 6
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 6
100%

No Calificados 0
0%

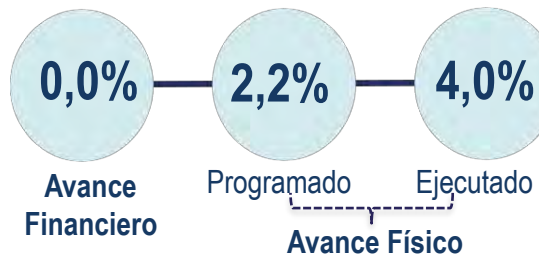

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Topografía calcular cantidades



Excavaciones azud 15



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 4
Total Projectado:30

Local: 0
0%


Foráneo: 4
100%

Calificados: 0
0%

No Calificados 0
0%

Calificados : 4
100%

No Calificados 0
0%

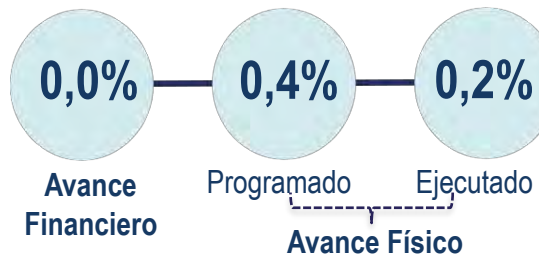

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Instalación Valla



Replanteo y Reprogramación frente predios en uso



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES



Fecha de suscripción: Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

Fecha acta de inicio: Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

Estado Actual:

Se encuentra en trámite de adquisición de pólizas para presentar a Fiduprevisora.

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1342-2020
 Valor: \$ 8.307.462.027

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-098-2021
 Valor: \$ 673.647.100

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO AZUD MOCOA
 520

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 MUROS MOCOA 2020

Supervisor UNGRD
 Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Visita de obra Azud 07 – Q. Taruca



Localización Azud 8 -Río Sangoyaco



45.589

Personas beneficiadas



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: Se está a la espera de aclaración con
Corpoamazonía para dar inicio.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes
intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

En espera de respuesta por parte de
Corpoamazonía sobre aclaración de los estudios y
diseños entregados.

45.589
Personas beneficiadas

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-183-2021
Valor: \$ 4.452.771.492,00

Nombre del Contratista:
CONSTRUVAL
INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-743-2021
Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INGENIERÍA DE
MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

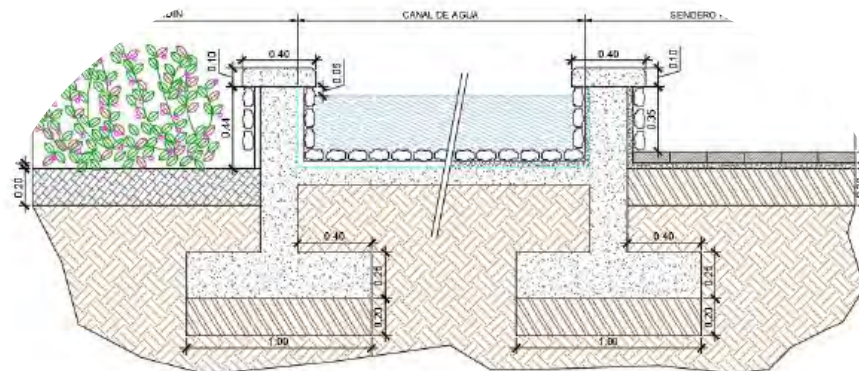


Figura 4-4. Esquema canal.

Detalles de canal



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.2

SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021

Fecha de finalización actualizada: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 21 Total Projectado: 35	Local 11 52%	Calificados 6 55%
		No Calificados 5 45%
	Foráneo 10 48%	Calificados 6 60%
		No Calificados 4 40%

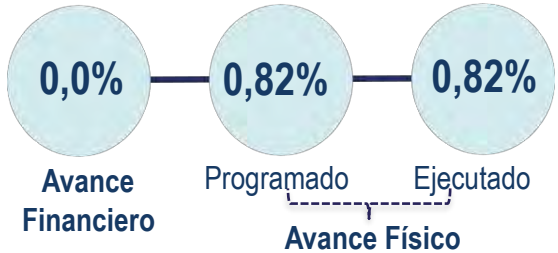

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Socialización Vda El Pepino



Socialización B/ San Andrés

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto
\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES
Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:
18 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

Estado Actual:
El contratista reiniciará el día **18/07/2021**, la interventoría adelanta revisión del PMA, plan de gestión social, plan SST, protocolo de bioseguridad y levantamiento topográfico.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Tramos a intervenir



 **45.589**
Personas beneficiadas

✓ **ALCANCE**

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
 - Barrio Bajo Cañaverall y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

Estado Actual:

El contrato se encuentra en revisión y aclaración de los estudios y diseños.

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa</p>	



Tramos a intervenir



 **45.589**
Personas beneficiadas

✓ **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
 - Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
 - Barrio Piñayaco Z4 – 3.
 - Barrio Piñayaco Z4 – 4.
 - Barrio Peñón Z5 – 1.
 - Barrio Peñón Z5 - 2B.
 - Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021
Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:
26 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 15
Total Projectado: 25

Local 14
93%

Foráneo 1
7%

Calificados 4

29%

No Calificados 10


71%

Calificados 1

100%

No Calificados 0

0%

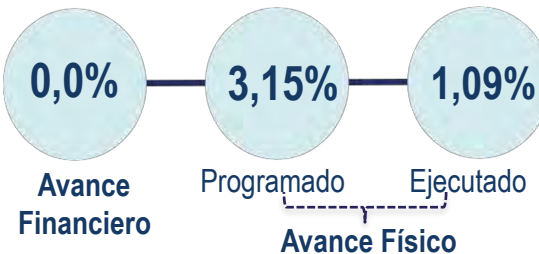

45.589
Personas beneficiadas

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-407-2021
Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre del Contratista:
ALEX ALBERTO CALVACHE
MENA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 72.268.367

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19



Instalación de tubería de 12" PVC para red de alcantarillado pluvial

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL - 2021
Fecha de finalización actualizada: 05 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación 7 VÍAS en 2 SECTORES

Estado Actual:

Se suscribió acta de inicio el día **06/07/2021**, se realizó recorrido para la verificación de los tramos a intervenir.



Visita técnica sector Villa Diana



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.
- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
 Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
 Fecha de finalización actualizada por suspensión:



18 - NOV - 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Continua llegada de material, inicio de actividades de obra el **06/07/2021**, en obra ya se encuentra maquinaria, equipos y señalización. Se adelantó tala de árbol que afectaba la sección del pavimento, esto con el respectivo permiso de Corpoamazonia.

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-518-2021
 Valor: \$ 1.206.210.066

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 85.658.245

Nombre del Contratista:
 UNION TEMPORAL
 CAIMARON

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER
 5HG

Supervisor UNGRD
 Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Tala de árbol



Maquinaria y equipos en obra

45.589
 Personas beneficiadas



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



18 - ENE - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

Estado Actual:

Se realizó recorrido con Planeación Municipal para aclaración de líneas de paramentos y con el Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (PMAMO) para revisión del descole de la red pluvial del sector de Villa Daniela.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-554-2021
Valor: \$ 2.696.280.960

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 191.474.688

Nombre del Contratista:
CONSORCIO ORC 2020

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Verificación de topografía por parte de la interventoría

 **45.589**

Personas beneficiadas



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7ª.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



09 - ENE - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Se reinició contrato el día **03/07/2021**, se adelantó verificación de líneas de paramentos, revisión por parte de interventoría del PMA, plan de gestión social, plan SST, protocolo de bioseguridad. Pendiente aprobación de PMT por parte de Secretaria de Tránsito.



Revisión de líneas de paramentos

45.589

Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.329
Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Revisión técnica de diseños, verificación de coordenadas y localización de los sectores a pavimentar.



Visita y revisión de diseños Ciudadela Deportiva

45.589

Personas beneficiadas



Revisión de coordenadas y Nomenclatura, sector José Homero- Villa de Leyva

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-532-2021
Valor: \$ 4.268.718.305

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-774-2021
Valor: \$ 495.382.720

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS
MOCOCA

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERPAVIMENTOS EDUPAC

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión:
05 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

Estado Actual:

Se suscribió acta de inicio el día **06/07/2021**, se realizó levantamiento topográfico, pendiente por parte de Planeación Municipal la entrega de líneas de paramentos de la zona a intervenir.



Levantamiento topográfico

45.589

Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-549-2021 Valor: \$1.830.025.649 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOAC CONSTRUCCIONES	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 130.312.324 (Para este contrato) <hr/> Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.769.435.891

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **OCHO (8) MESES**
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Contrato de interventoría sin perfeccionar.
Se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.



Estado inicial de la vía a intervenir

 **45.589**

Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-550-2021 Valor: \$ 1.282.970.234 ----- Nombre del Contratista: DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 82.948.494 (Para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Contrato de interventoría sin perfeccionar. Se adelanta revisión de estudios, diseños y presupuesto.



Localización del tramo a ejecutar

45.589

Personas beneficiadas



Estado inicial de la vía a intervenir

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897	Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

1.3

SEGUIMIENTO VÍAS Y ALCANTARILLADO

1

Mejoramiento de la vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.



2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones

*Avance



30,13%

Avance financiero



0%



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



30,07%



0%

total de
viviendas



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

Avance estudios, diseños, construcción preliminares primera fase constructiva del proyecto. Aprobado Plan de Choque. Radicado cobro por \$1.400 mill.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$ 4.852 millones

Avance financiero

30,05%

CRONOGRAMA

FECHA DE
TERMINACIÓN



DIC 2021

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



JUL 2022



519

TOTAL

909

PERSONAL
PROYECTADO



82

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Continúa movimiento de tierras 17.302,68 m3 de tierra (incluido expansión).
- En revisión por Alcaldía concepto emitido por CORPOAMAZÓNIA.
- Programación de Obra ajustada de acuerdo a plan de choque.
- Director de Obra, Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente Social vinculados.
- Dos cuadrillas de maquinaria amarilla funcionando en obra.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	10	2	12
No calificado	20	0	20
Total	30	2	32





N° DE VIVIENDAS



87

INVERSIÓN



5.764 millones

valor otorgado por FONVIVIENDA a través del Convenio No. 9677-PPAL001-783-2018



AVANCES

- Elaboración de Documentos para contratación derivada Convenio 783. En revisión:

Contrato de obra

- Formato de Presupuesto oficial.
- Justificación.
- Anexo técnico.
- Formatos del 1 al 6b.
- Formato N° 11: Acta de compromiso de confidencialidad de información relacionada con el proyecto.
- Formato de Excel del 7 al 10.


Contrato de interventoría

- Formato de Presupuesto oficial.
- Justificación.
- Anexo técnico.
- Formatos del 1 al 6b.
- Metodología de plan de cargas.
- Formato N° 11: Acta de compromiso de confidencialidad de información relacionada con el proyecto.
- Formato de Excel del 7 al 10.



AVANCES

VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



VIVIENDA RURAL NUCLEADA



\$9.516.549.300 En convenio con **Banco**
\$15.436.450.700 Recursos faltantes

- **Mocoa Disperso:** El proceso de **contratación por ley 80** se encuentra en revisión para publicación, teniendo en cuenta los requisitos de ley con los que debe cumplir, ya que técnicamente se encuentra avalado y estructurado según los **requerimientos del BAC**. Se continúa la ruta de publicación del proceso esta semana y esperará el plazo de ley del proceso (2 meses para adjudicación)

- **Mocoa Nucleada:** Se realiza segundo envío de 82 beneficiarios el 03 de julio, para un total de 182, se está pendiente por la entrega de los 34 faltantes por parte de la **Alcaldía de Mocoa**; por parte de **SPIA** se realizó entrega en digital de lo requerido para subsanar, por parte del equipo de **reconstrucción de Mocoa** se da respuesta a oficio enviado por la sociedad Putumayense y se está revisando los productos enviados con el fin de verificar si cumple con lo requerido por el **BAC**; en paralelo se sigue trabajando con el desenglobe del predio de vivienda Planadas, para lo cual esta en revisión por la Abogada designada por Fiduprevisora.

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018
Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



12 - SEP - 2021

TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado Actual:

El proyecto reinició el **01/07/2021**.
Se tramitará una prórroga por 3 meses más para poder terminar la fase contractual del proyecto.

10%

Avance
Financiero

96%

Programado

67%

Ejecutado

Avance Físico

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

Supervisor UNGRD
Yineth Arinda Cumplido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo



PROYECTO PLAZA DE MERCADO


INVERSIÓN
\$6.000.000,00*

*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.

PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56

AVANCES

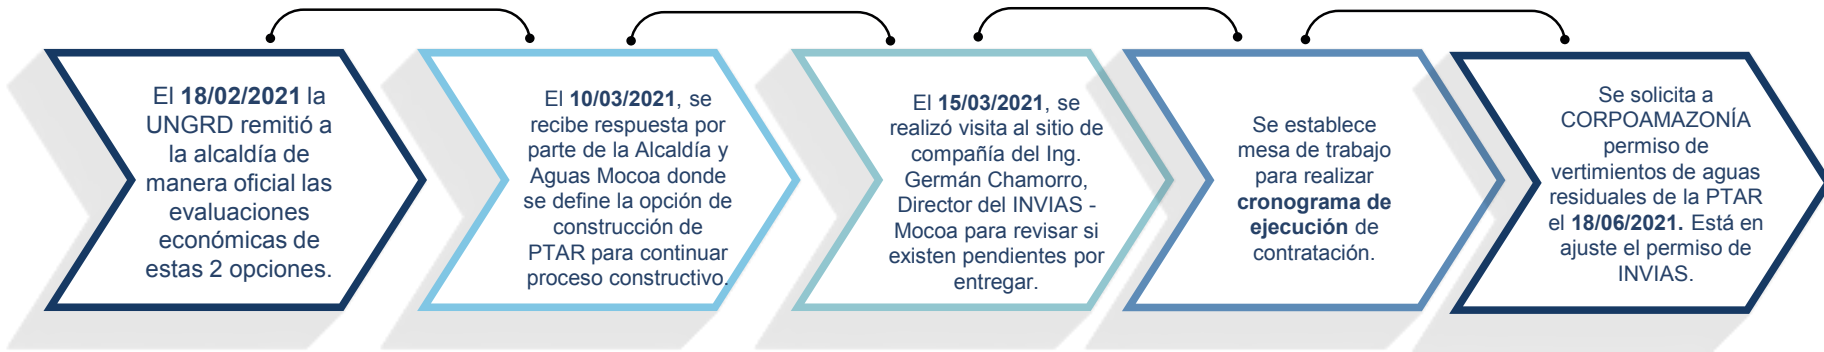

CRONOGRAMA



COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO



AVANCES



INVERSIÓN

\$ 1.257.921.000,00* lote

\$ 80.000.000.000,00 Construcción

* Estos recursos serán gestionados por el FNGRD para su adquisición.



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12
ESTADO	Terminado



ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente 107 l/s.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% AVANCE PROGRAMADO	0,8%
% AVANCE EJECUTADO	0,8%
ESTADO	En ejecución






El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

	OBRAS EN EJECUCIÓN	32
	EMPLEO GENERADO A LA FECHA	368
	PERSONAL PROYECTADO	827

	30/06/21	07/07/21		30/06/21	07/07/21
MANO DE OBRA LOCAL	231	262	MANO DE OBRA FORÁNEA	98	106
CALIFICADOS	136	142	CALIFICADOS	89	92
NO CALIFICADOS	95	120	NO CALIFICADOS	9	14
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	70%	71%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	30%	29%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	662	1.489
EMPLEOS INDUCIDOS	147	331
TOTAL EMPLEOS	809	1.820

GRACIAS

