

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Julio 28 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos

18 de obra

Ejecución

18

% en Perfeccionamiento ejecución

100%

13 de interventoría

13

100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones



Total de contratos

13 de obra

Ejecución

13

% en Perfeccionamiento ejecución

100%

4 de interventoría

4

100%

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019
Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019
Fecha de finalización actualizada por suspensión:
12 - AGO – 2021




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 26	Local 24 100%	Calificados 14 58%
		No Calificados 10 42%
	Foráneo 0 0%	Calificados 0 0%
		No Calificados 0 0%

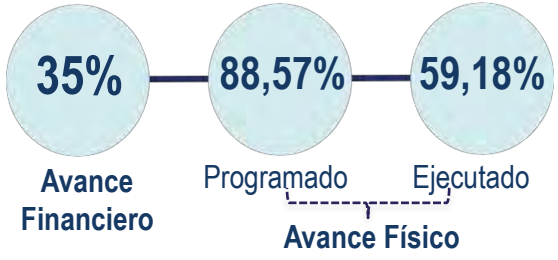


 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 063 del 2019 Valor: \$ 3.841.235.901	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-261-2019 Valor: \$ 360.589.960
Nombre del Contratista: Virgilio Bravo Sosa	Nombre de la Interventoría: Yahara Maritza Viveros Ortiz
Supervisor UNGRD Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Anclajes

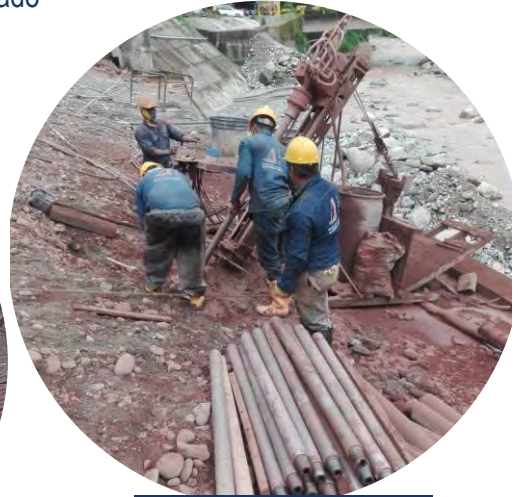

Perforación para anclajes

ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
Fecha de finalización actualizada: 14 - JUN - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 126 Total Projectado: 140	Local 90 71%	Calificados 40 44%
		No Calificados 50 56%
	Foráneo 36 29%	Calificados 28 78%
		No Calificados 8 22%

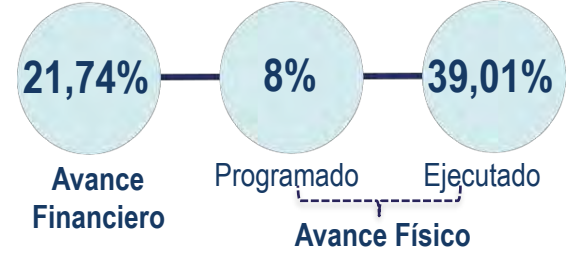

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 29 Total Projectado: 32	Local 24 83%	Calificados 14 58%
		No Calificados 10 42%
	Foráneo 5 17%	Calificados 5 100%
		No Calificados 0 0%

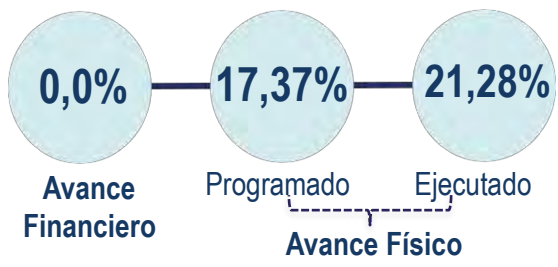

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1025-2020 Valor: \$4.302.041.377,00 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Recolección de monitoreo de laboratorio del Valle.
Protocolo de recolección de muestras espolón 1 K1+950



Colocación de piedra para el colcha gavión del muro n°6

 **ALCANCE**

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 17
Total Projectado: 20

Local 12
71%


Foráneo 5
29%

Calificados 7
58%

No Calificados 5
42%

Calificados 1
20%

No Calificados 4
80%

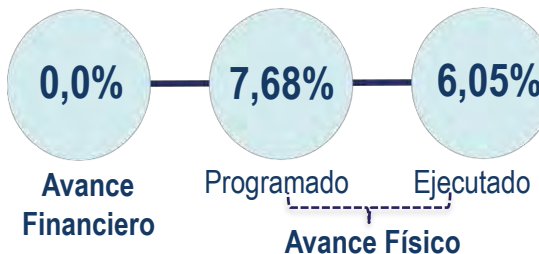

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-980-2020 Valor: \$ 5.710.699.339,98 <hr/> Nombre del Contratista: HAROLD MUÑOZ MUÑOZ	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-139-2020 Valor: \$ 404.710.562,00 (valor para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO HECAD VIAL
Supervisor UNGRD Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de gabi6n de muro 7



Afectaciones del avance de obra por la creciente del 21 de julio de 2021

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021
 Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

Estado actual:

Se entrega reprogramación de obra. Se inicia actividades preliminares de acuerdo a la reprogramación. Se continua en la espera de la visita de HIDROCONSULTA S.A.S al sitio de ejecución de la obra.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26
 Total Projectado: 35

**Local 18
 69%**

**Foráneo 8
 31%**

Calificados 14
78%

No Calificados 4
22%

Calificados 8
100%

No Calificados 0
0%



45.589
 Personas beneficiadas



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-1334-2020
 Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre del Contratista:
 CONSORCIO RIO MULATO.

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-141-2021
 Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 RÍO MULATO

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



El futuro es de todos

Presidencia de la República

6 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO 1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 08 - JUL - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, muros y azud.


PERSONAL EN OBRA Total Obra: 14 Total Projectado: 40	Local 12 86%	Calificados 8 67%
		No Calificados 4 33%
	Foráneo 2 14%	Calificados 2 100%
		No Calificados 0 0%

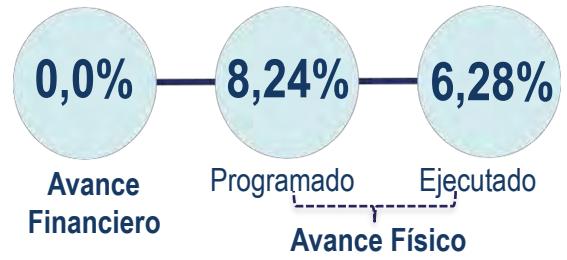

45.589
Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	

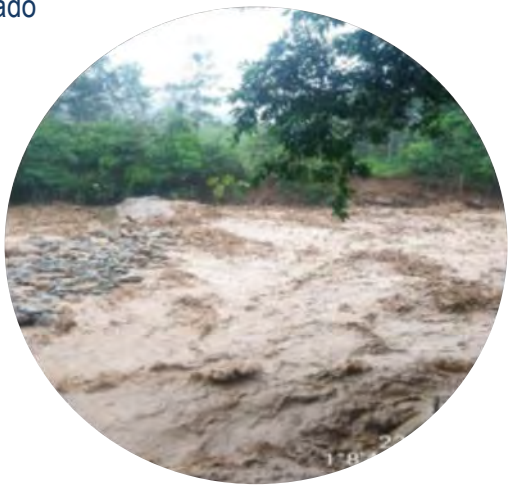

ALCANCE

- Dique Abierto 3
- Muro 1
- Azud 05
- Muro 2
- Azud 04
- Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 16
Total Projectado: 45

Local 12
75%

Foráneo 4
25%

Calificados 6

50%

No Calificados 6

50%

Calificados 4

100%

No Calificados

0%

0,0%

Avance Financiero

3,59%

Programado

1,75%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-201-2021
Valor: \$ 11.334.163.511,06

Nombre del Contratista:
CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-344-2021
Valor: \$ 929.229.966,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO MUROS MOCO A

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 27

Total Projectado: 35

Local 20
74%

Foráneo 7
26%

Calificados 7

35%

No Calificados 13

65%

Calificados 5

71%

No Calificados 2

29%

0,0%

Avance
Financiero

8,16%

Programado

8,70%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1388-2020
Valor: \$ 6.667.715.826,33

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DIQUE 1

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 536.303.878,1967

(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Armado Acero Dentellón



Armado Acero Dentellón



ALCANCE

• Dique Abierto 1 - Q. Taruca



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%


Foráneo 10
48%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 6
60%

No Calificados 4
40%

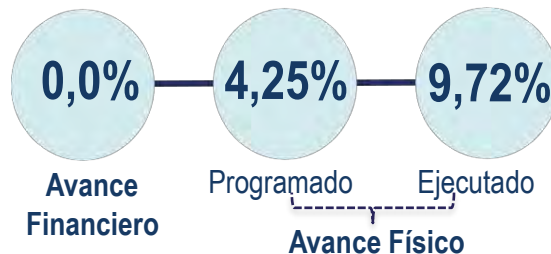

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOCA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 508.303.365,8033
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOCA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Inundaciones debido a fuertes lluvias



Retiro formaleta



ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCO A

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020

Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5
Total Projectado: 35

Local: 3
60%

Foráneo: 2
40%

Calificados: 3
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 2
100%

No Calificados 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

0,18%

Programado

0,70%

Ejecutado

Avance Físico



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.384.755,43

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCO A

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Moco a



Comités Técnico Estructuras



Replanteo Estructura



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020
 Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
 Total Projectado: 45

Local: 4
50%


Foráneo: 4
50%

Calificados: 4
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 3
75%

No Calificados 1
25%

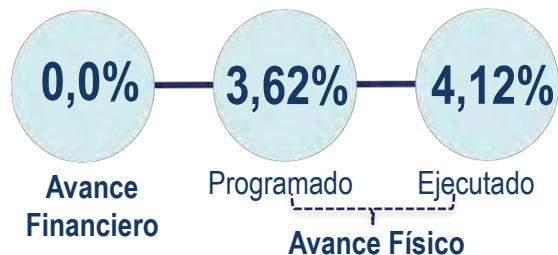

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1064-2020 Valor: \$ 15.407.631.114,68 <hr/> Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-154-2021 Valor: \$ 1.244.010.656,57 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOCA
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa	



Excavación Azud 12



Almacenamiento Materiales



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de Jarillón y espolones.

Estado Actual:

Se realizó visita técnica por parte de Corpoamazonia para realizar el inventario forestal y otorgar permiso de tala de árboles.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 61

Local 6

75%

Calificados 3

50%

No Calificados 3

50%

Foráneo 2

25%

Calificados 2

100%

No Calificados 0

0%



45.589

Personas beneficiadas



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO
MOCOA 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021

Fecha de finalización actualizada: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 27

Total Projectado: 37

Local: 11
41%


Foráneo: 16
59%

Calificados: 9
82%

No Calificados 2
18%

Calificados : 15
94%

No Calificados 1
6%

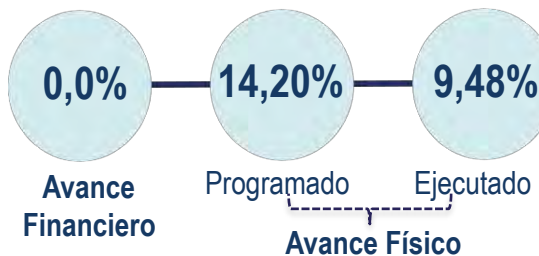

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-311-2021 Valor: \$ 2.723.478.287,36	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 219.807.563,26 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO MIRAVALLE	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	



Levantamiento de actas de vecindad



Lavado del material conformado y colmatación sobre las cotas de fundación debido a las crecientes del río Sangoyaco.



ALCANCE • Azud 10, Sector Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020
Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12

Total Projectado: 30

Local: 6
50%

Foráneo: 6
50%

Calificados: 6
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 6
100%

No Calificados 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

3,58%

Programado

4,66%

Ejecutado

Avance Físico




45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Actividades Revisión
Maquinaria en campamento

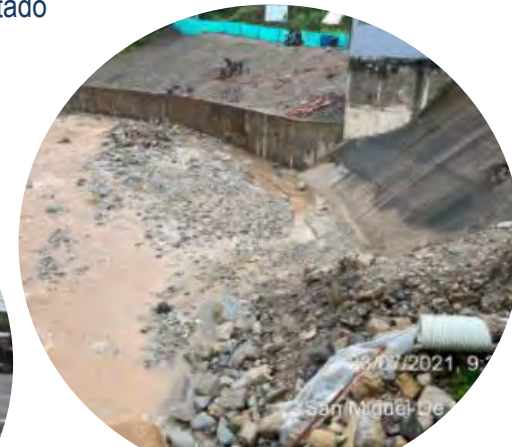

Sitio de excavación después
crecientes



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA



Total Obra: 4
 Total Projectado:30

Local: 0 0%	Calificados: 0 0%
	No Calificados 0 0%
Foráneo: 4 100%	Calificados : 4 100%
	No Calificados 0 0%

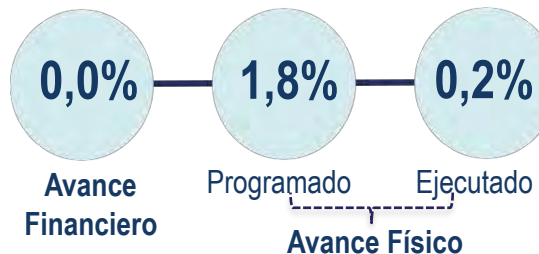

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	

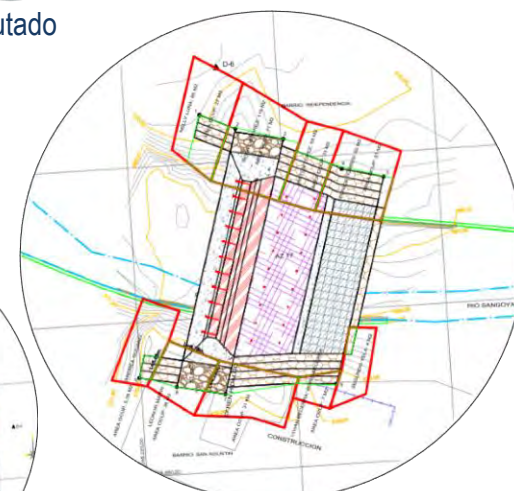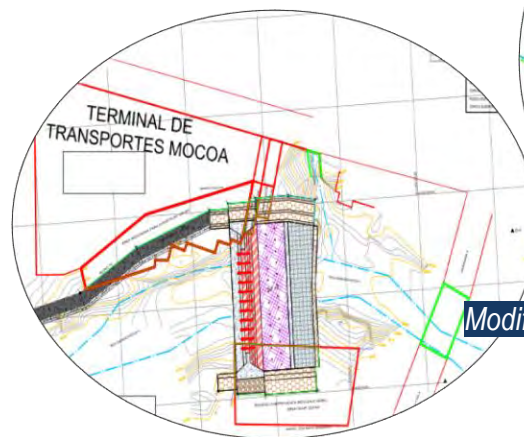

Modificación a diseños por prediales



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

Fecha acta de inicio: Se está a la espera del trámite administrativo del cambio de consorciado.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación


IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

Estado Actual:
 Se encuentra en trámite de adquisición de pólizas para presentar a Fiduprevisora.

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.027	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100
Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOCA 520	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	

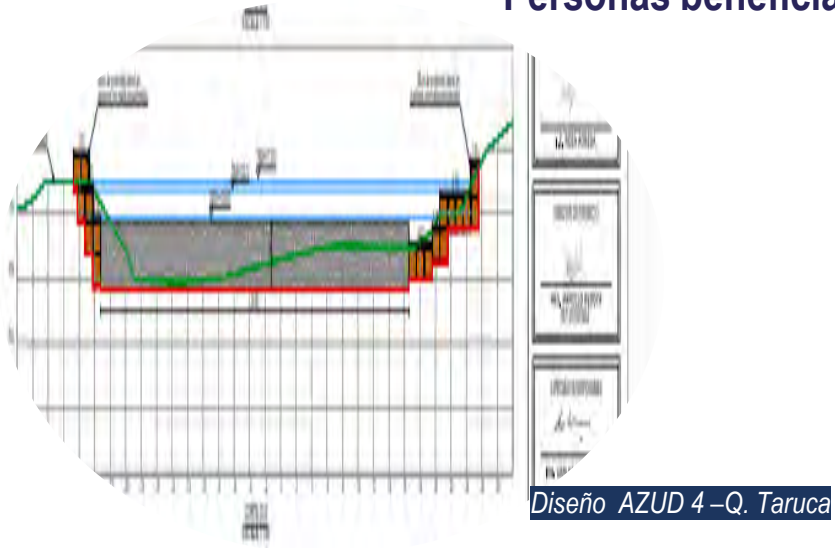

ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: 15- JUL - 2021

Fecha de finalización actualizada: 14 - ENE - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras Estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

Estado Actual:

Elaboración de cronogramas de ejecución, validación, El **21/07/21** se realizó solicitud visita Corpoamazonia para permiso de aprovechamiento forestal, elaboración de PMT, así mismo, se realizó reiteración de solicitud de cambio de representante legal a Fiduprevisora y reunión inicial con obra e interventoría.

 **45.589**

Personas beneficiadas

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato)</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020</p>
<p>Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa</p>	



Oficio reiteración cambio de R.L. Consorcio.



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: Se está a la espera de aclaración con Corpoamazonía para dar inicio.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

Continua en espera de respuesta por parte de Corpoamazonía sobre aclaración de los estudios y diseños entregados, a la fecha se han realizado 6 solicitudes formales.

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-183-2021
 Valor: \$ 4.452.771.492,00

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-743-2021
 Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre del Contratista:
 CONSTRUVAL
 INGENIERÍA S.A.S.

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INGENIERÍA DE
 MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD
 Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

45.589

Personas beneficiadas



Río Sangoyaco donde se realizarán las obras



ALCANCE

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación
- Espejos de agua
- Canales y vertederos

1.2

**SEGUIMIENTO A VÍAS Y
ALCANTARILLADO EN
EJECUCIÓN**

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR


FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES

Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021

Fecha de finalización actualizada: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local 5	Calificados 4
	45%	80%
		No Calificados 1
		20%
	Foráneo 6	Calificados 6
55%	100%	No Calificados 0
		0%

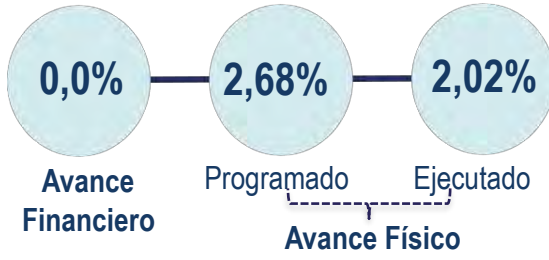

45.589 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Socialización Barrios Babilonia – La Unión



Socialización Barrio 1ro de Enero

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES
 Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
 Fecha de finalización actualizada por suspensión:
 18 - OCT – 2021


TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 20 Total Projectado: 25	Local 17	Calificados 11
	85%	65%
		No Calificados 6
		35%
	Foráneo 3	Calificados 1
	15%	33%
		No Calificados 2
		67%

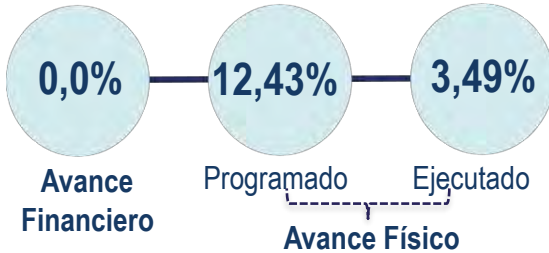

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Instalación de tubería para red pluvial barrio El Carmen

ALCANCE

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
 - Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021

Fecha de finalización : 18 – ENE – 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

Estado Actual:

Se suscribió acta de inicio el **19/07/2021**, se realizará socialización y levantamiento de actas de vecindad en el transcurso de la semana, la interventoría adelanta revisión de documentación de PMT, PMA, Plan Social, Plan SISO y calidad.



Tramos a intervenir

 **45.589**

Personas beneficiadas



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
- Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
- Barrio Piñayaco Z4 – 3.
- Barrio Piñayaco Z4 – 4.
- Barrio Peñón Z5 – 1.
- Barrio Peñón Z5 - 2B.
- Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021

Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021

Fecha de finalización actualizada: 26 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **6 VÍAS** en **1 SECTOR**

**PERSONAL EN
OBRA**

Total Obra: 9
Total Projectado: 25

Local 7
78%

Calificados 4

58%

No Calificados 3

42%


Foráneo 2
22%

Calificados 2

100%

No Calificados 0

0%

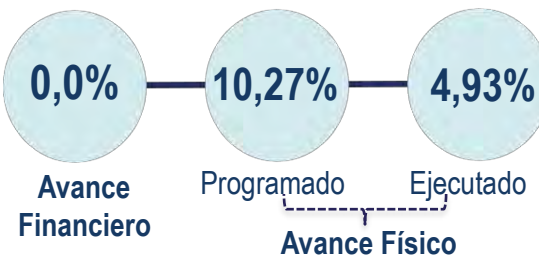

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-407-2021
Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre del Contratista:
ALEX ALBERTO CALVACHE
MENA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 72.268.367

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER
5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Cajeo de vía para instalación de geotextil y pedraplén



Construcción de cámara de inspección red pluvial

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
Fecha de finalización actualizada: 05 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 10
Total Projectado: 25

Local 10
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 8

80%

No Calificados 2


20%

Calificados 0

0%

No Calificados 0

0%

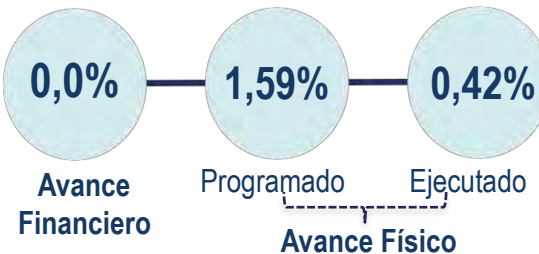

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-492-2021
Valor: \$ 2.824.604.874

Nombre del Contratista:
CONSORCIO VIAS DE MOCOA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 200.587.530

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



Cajeo de vía para instalación de geotextil y pedraplén

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

- Condominio Norte Z5-30.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
 Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
 Fecha de finalización actualizada por suspensión: 18 - NOV - 2021


TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 15 Total Projectado: 25	Local 14	Calificados 6
	93%	43%
		No Calificados 8
		57%
	Foráneo 1	Calificados 1
7%	100%	No Calificados 0
		0%

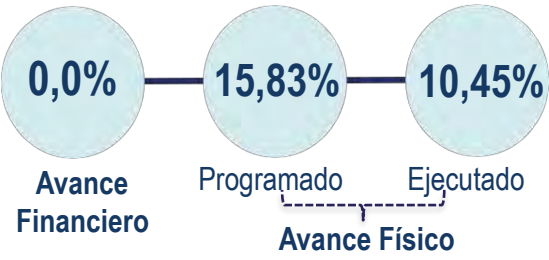

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-518-2021 Valor: \$ 1.206.210.066	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 85.658.245
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL CAIMARON	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.



Construcción cámara de inspección para red pluvial



Cajeo de la vía, instalación de geotextil y pedraplén

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 18 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas


IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 6
Total Projectado: 25

Local 5 83%	Calificados 3 60%
	No Calificados 2 40%
Foráneo 1 17%	Calificados 1 100%
	No Calificados 0 0%

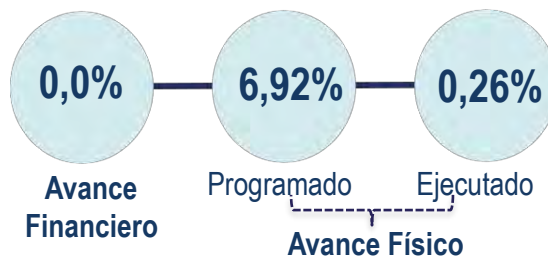

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-554-2021 Valor: \$ 2.696.280.960	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 191.474.688
Nombre del Contratista: CONSORCIO ORC 2020	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Cajeo de la vía, instalación de geotextil y pedraplén

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:



09 - ENE - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 11
Total Projectado: 25

Local 11
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 7

64%

No Calificados 4


36%

Calificados 0

0%

No Calificados 0

0%

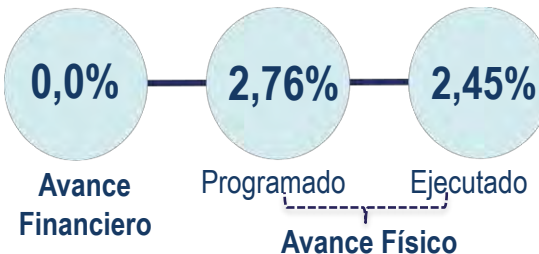

45.589

Personas beneficiadas



Instalación de tubería 12" para red lluvia

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-636-2021
Valor: \$ 1.253.593.696

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 89.085.329

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de Finalización: 07 – MAR -2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Socialización de cada proyecto en cada sector de influencia de las obras: Barrio José Homero, Ciudadela Deportiva, Quinta Paredes.

45.589

Personas beneficiadas



Socialización Barrio Quinta Paredes



Socialización Barrio Jose Homero

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-532-2021
Valor: \$ 4.268.718.305

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-774-2021
Valor: \$ 495.382.720

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS
MOCOCA

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERPAVIMENTOS EDUPAC

Supervisor UNGRD
Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES

Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021

Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021

Fecha de finalización actualizada: 05 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de **1 vía**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 11
Total Projectado: 25

Local 11
100%

Foráneo 0
0%

Calificados 6

55%

No Calificados 5


45%

Calificados 0

0%

No Calificados 0

0%

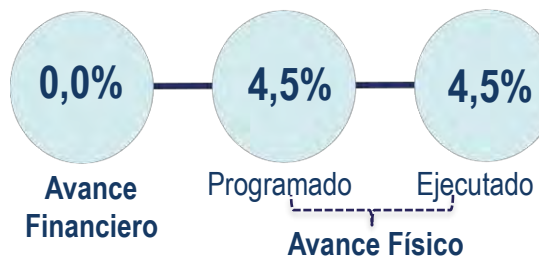

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-549-2021 Valor: \$1.830.025.649 Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS MOAC CONSTRUCCIONES	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 130.312.324 (Para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Limpieza de vía



Instalación de valla



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 21 – JUL - 2021
Fecha de finalización: 20 - MAR - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Contratista adelanta la estructuración de los PMT, PMA, PGS y Protocolos de bioseguridad previo al inicio físico de obra.



45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-550-2021
Valor: \$ 1.282.799.166

Nombre del Contratista:
DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-969-2021
Valor: \$ 82.948.494
(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD
Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa

Intervenciones de Aguas Mocoa previas al inicio del contrato de pavimentación



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

En la revisión de estudios, diseños y presupuesto se determina que el tramo a intervenir no cuenta con alcantarillado sanitario por lo que se adelanta la búsqueda de recursos adicionales.

Se han realizado reuniones con Alcaldía y Aguas Mocoa.



Estado inicial de la vía a intervenir

 **45.589**

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897	Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



Mesa de trabajo con funcionarios de la alcaldía de Mocoa



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.435.104.449

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021
Fecha acta de inicio: 30- JUL -2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

En elaboración de modificación de minuta de contrato de obra – Fiduprevisora.

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1113-2021
Valor: \$ 2.435.104.449

Nombre del Contratista:
MEGACONSTRUCCIONES
S.A.S

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-774-2021
Valor: \$ 495.382.720

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERPAVIMENTOS EDUPAC

Supervisor UNGRD

Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa

ERIKA FINEROS PINILLA
Coordinadora Jurídica de Contratos de Negocios Especiales
Vicepresidencia Jurídica

Doctor
SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios FIDUPREVISORA S.A.

SEÑORES

PROCESOS SDG
Proyectos de Infraestructura
Subdirección General

Solicitud de modificación minuta

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1113-2021

Buenos días

una vez revisado la solicitud de aclaración al contrato en mención, manifestamos que aceptamos la aclaración realizada al contrato

ANA DEISY DELGADO DIAZ RL MEGACONSTRUCCIONES PUTUMAYO LTDA CEL 320 414 85 38 DIRECCION CALLE 5 Nº 3-23 BARRIO FATIMA VILLAGARZON PUTUMAYO



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones

total de
viviendas



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

*Avance

Avance financiero



30,16%



5%



30,07%



0%

Avance estudios y diseños, construcción preliminar del proyecto. Consorcio Entregó Plan de Choque. Aprobado Contrato 243, con observaciones contrato 244. Seguimiento compromisos Comité General de Obra 7/7/21. Citación a Contratista posible incumplimiento fase I, 30 de julio de 2021.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$7.049.420.065

Avance financiero

20,05%

CRONOGRAMA

FECHA DE
TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



519

909

PERSONAL
PROYECTADO



82

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Continúa movimiento de tierras 19.298,9 m3 de tierra (incluido expansión).
- En revisión por Alcaldía concepto emitido por CORPOAMAZÓNÍA.
- Aprobado plan de choque contrato 243, con observaciones el plan de choque del contrato 244, consorcio realiza ajustes.
- 19/07/21 se presentó a veedurías fases constructivas y fechas de entrega de viviendas.
- Llegada a la obra tubería de alcantarillado fluvial y sanitario para primera fase constructiva.
- Terraceo primera fase constructiva.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	5	2	7
No calificado	12	0	12
Total	17	2	19





N° DE VIVIENDAS



87

INVERSIÓN



5.764 millones

valor otorgado por FONVIVIENDA a través del Convenio No. 9677-PPAL001-783-2018



AVANCES

- Elaboración de Documentos para contratación derivada Convenio 783. Fue trasladada la documentación e información a la Subdirección General UNGRD. En revisión.

Derivado de obra

- Justificación Contratación Obra
- Anexo Técnico
- F1 Formatos del 1 al 6B
- F2 Formatos Excel 8-10
- F3 Formato 11

Derivado de interventoría

- Justificación Contratación Interventoría
- Metodología y Plan de Cargas
- F1 Formatos del 1 al 6B
- F2 Formatos Excel 7-10
- F3 Formato 11
- Presupuesto oficial interventoría.





AVANCES

VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO

N° DE VIVIENDAS



37

INVERSIÓN



\$3.850.882.740,00

VIVIENDA RURAL NUCLEADA

N° DE VIVIENDAS



215

Urbanismo **6.453 mill**
 Vivienda **13.500 mill**
 PTAR: **1.500 mill**
 Subestación eléctrica: **3.500 mill**

Total: **\$ 24.953 millones**

\$9.516.549.300 En convenio con **Banco**

\$15.436.450.700 Recursos faltantes

- **Mocoa Disperso:** Se da inicio a la segunda fase de publicación del proceso en el SECOB, teniendo en cuenta el ajuste de la documentación técnica luego de recibir las cotizaciones en la plataforma, estando en el proceso de revisión final por parte de la oficina de Gestión Contractual de la unidad para quedar cargado el pliego definitivo esta semana.

- **Mocoa Nucleada:** La alcaldía remite el quinto paquete de documentos relacionados con los beneficiarios para su legalización ante el **BAC**, quedando pendiente a la fecha 7 beneficiarios con condiciones especiales sobre los cuales la alcaldía debe realizar las gestiones pertinentes para la remisión de información; el BAC adelanta la revisión de las 38 sustituciones de familias para aprobación e inclusión del nuevo grupo familiar en el proyecto.

El apoderado de Fidupervisora se encuentra en Mocoa para la firma de la minuta del desenglobe, continuando el proceso con el registro en instrumentos públicos, para poder obtener el número de matrícula inmobiliaria de cada lote, lo cual permitirá la asignación a través de resolución del dominio del lote a cada beneficiario del proyecto.



3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 25 - ABR -2018

Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018

Fecha de finalización: 01 - NOV – 2021 (Según trámite de prórroga).



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado Actual:

Ya fue aprobado el trámite por Ministerio de Educación de manera oficial, en espera que contratación de la UNGRD lo apruebe para poder remitir a FIDUPREVISORA solicitud de elaboración de minuta.

Se empezó el proceso de instalación de tubería para remitir directamente las aguas lluvias a la vía y de esta manera evitar caudales.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 32

Local 17 53%	Calificados 7 41%
	No Calificados 10 59%
Foráneo 15 47%	Calificados 8 53%
	No Calificados 7 47%


Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

Supervisor UNGRD
Yineth Arinda Cumplido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo

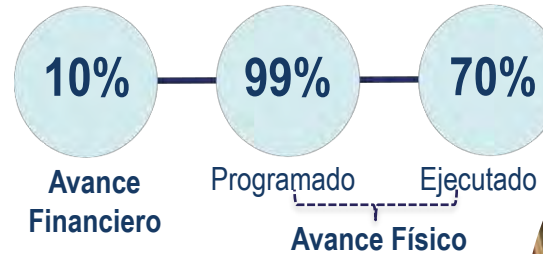

PROYECTO PLAZA DE MERCADO

INVERSIÓN
\$6.000.000,00*

*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.




PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56



AVANCES

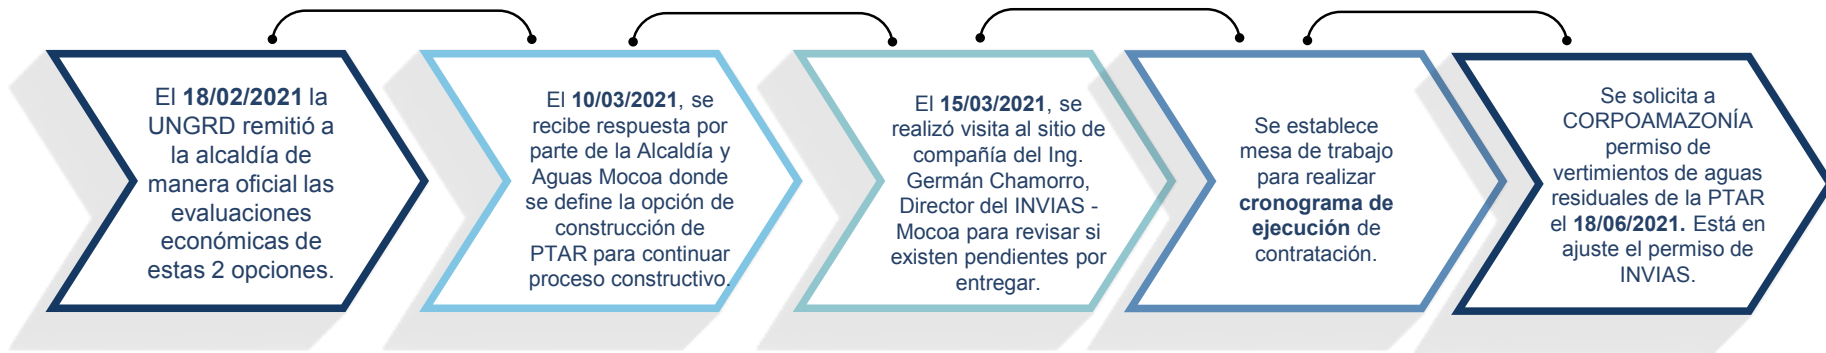

CRONOGRAMA



COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO



AVANCES



INVERSIÓN

\$ 1.310.921.000* lote

\$ 80.000.000.000,00 Construcción

* Estos recursos serán gestionados por el FNGRD para su adquisición.



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ETAPA

2

ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.


CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	6,85%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	6,55%
ESTADO	En ejecución



4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO

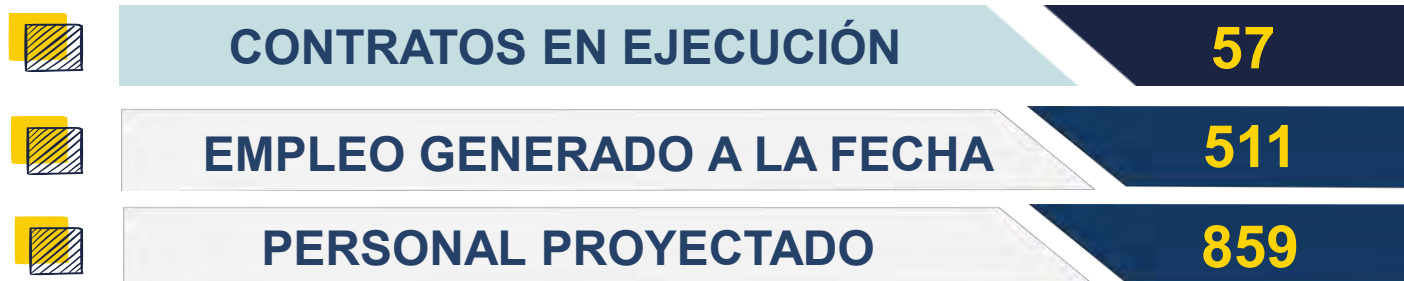

	22/07/21	28/07/21		22/07/21	28/07/21
MANO DE OBRA LOCAL	324	367	MANO DE OBRA FORÁNEA	139	144
CALIFICADOS	182	202	CALIFICADOS	113	115
NO CALIFICADOS	142	165	NO CALIFICADOS	26	29
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	70%	72%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	30%	28%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	920	1.546
EMPLEOS INDUCIDOS	204	344
TOTAL EMPLEOS	1.124	1.890

GRACIAS

