

PROYECTOS DEPARTAMENTO DEL CASANARE

Agosto 05 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres


Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

INVERSIONES FNGRD - UNGRD EN COLOMBIA

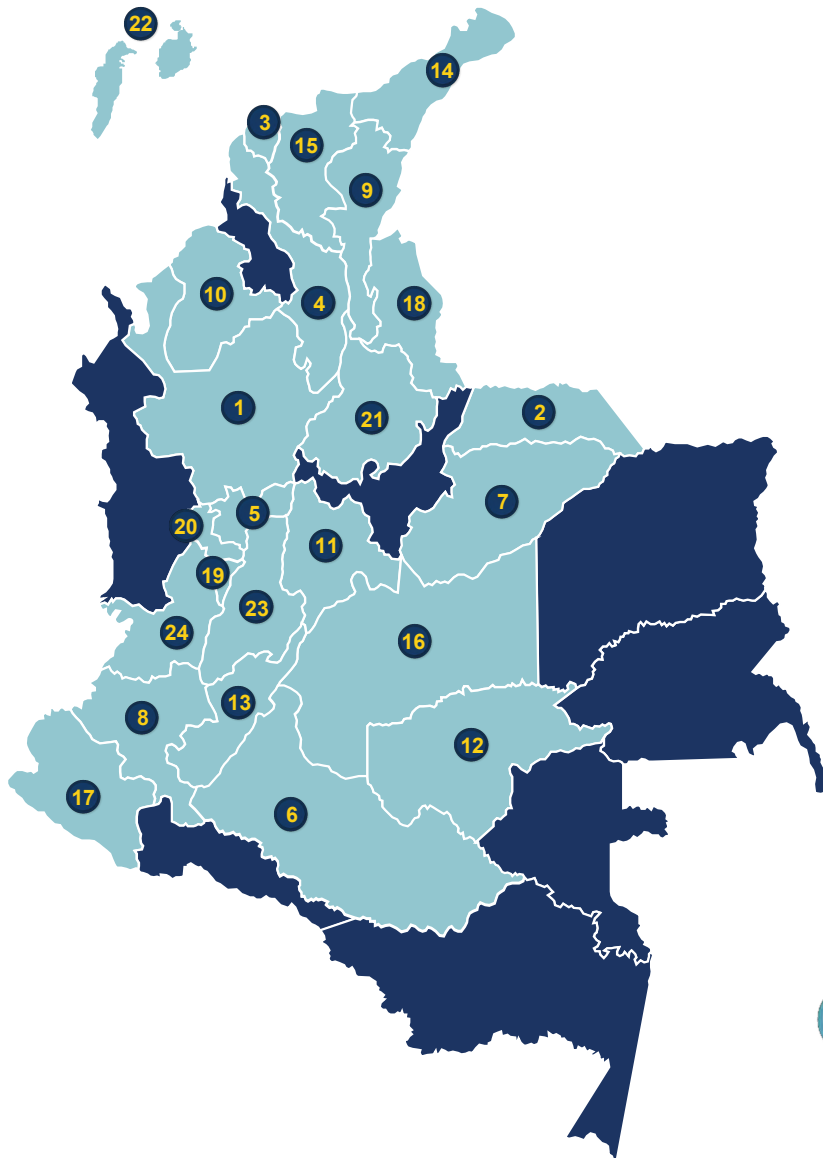

N°	DEPARTAMENTO	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (MILLONES)
1	ANTIOQUIA	320.754	\$58.478
2	ARAUCA	2.000	\$7.500
3	ATLANTICO	64.288	\$39.241
4	BOLÍVAR	107.158	\$92.213
5	CALDAS	446.160	\$18.500
6	CAQUETÁ	72.466	\$80.879
7	CASANARE	100.000	\$86.580
8	CAUCA	6.507	\$7.734
9	CESAR	19.123	\$75.524
10	CÓRDOBA	36.168	\$62.595
11	CUNDINAMARCA	1.200	\$3.300
12	GUAVIARE	6.000	\$29.633
13	HUILA	11.795	\$25.024
14	LA GUAJIRA	130.146	\$32.500
15	MAGDALENA	221.841	\$220.032
16	META	47.977	\$76.144
17	NARIÑO	424.543	\$46.357
18	NORTE DE SANTANDER	26.882	\$136.610
19	QUINDIO	100	\$238
20	RISARALDA	3.541	\$5.951
21	SANTANDER	359.764	\$468.283
22	SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	70.000	\$44.774
23	TOLIMA	22.854	\$39.034
24	VALLE DEL CAUCA	7.642	\$10.986



2.5 millones personas beneficiadas



\$1.6 billones

- Total Proyectos: 136
- N° Departamentos: 24
- Total Convenios: 18
- N° Municipios: 104





MUNICIPIOS

1	Orocué	\$10.000
2	Pore	\$21.517
3	Sabanalarga	\$1.200
4	Villanueva	\$13.638
5	Yopal	\$40.225



TIPO DE INTERVENCIÓN

- Obras de **control de inundaciones y erosión**
- Obras de **contención y estabilización**





ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 9.499.832.703

Valor total del proyecto

\$ 9.499.832.703

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTE (20) MESES

Fecha de suscripción: 14 - ENE - 2020

Fecha acta de inicio: 06 - MAY - 2020

Fecha de finalización actualizada: 04 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras de protección y/o Estabilización


IMPACTO

Construcción de 245 ml Bolsacretos y dos Muros de Contención de 45 mts c/u

Estado Actual:

Contratos de Obra e Interventoría Suspendidos debido al incremento del nivel del rio Meta y a falta de Permisos Ambientales que debe expedir CORPORINOQUIA

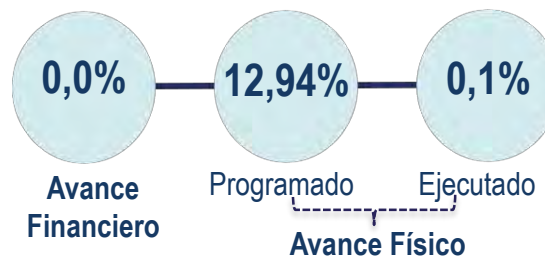

5.215 
Población beneficiada

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-756-2019
Valor: \$ 8.967.166.803,00



Nombre del Contratista:
Luis Guillermo Ruiz Machado

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-105-2020
Valor: \$ 532.665.900,00

Nombre de la Interventoría:
Consortio Inter Obras Orocué

Supervisor Interventoría UNGRD

Giovanni Alexander León Pérez –
Subdirección para la Reducción del Riesgo

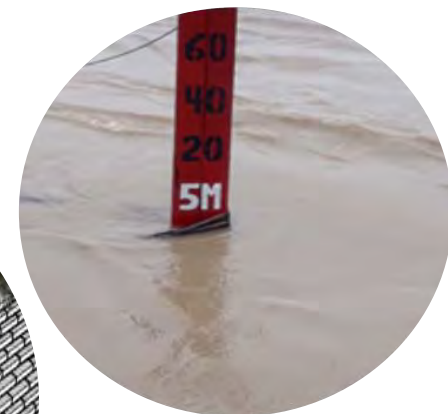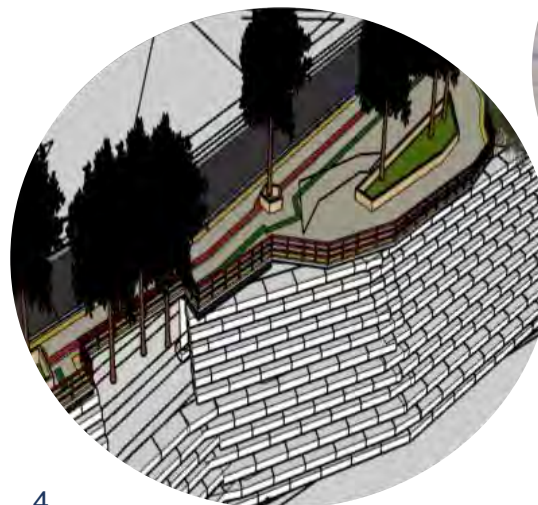



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 1.139.307.625

Valor total del proyecto

\$ 1.139.307.625

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 26 - MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 13 - ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 13 - OCT - 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN


Obras de protección y/o Estabilización

IMPACTO

Construcción de muro Contención para protección PTAP de 4,1m de altura, 3,15 de base y 0,3m de espesor, reparación losa de cimentación de la PTAP

Estado Actual:

Se allega el preliminar del diseño estructural, el cual se encuentra en etapa de observaciones por parte del especialista estructural de interventoría. Se realizó visita a la PTAP por parte del especialista en hidrología del contratista de obra para verificar los caudales de excesos allegados en el informe enviado el día **10/07/21** por parte de la administración municipal. Además se hacen observaciones al informe de geotecnia de la altura de relleno de los muros y si este va escalonado, recto o con alguna pendiente.

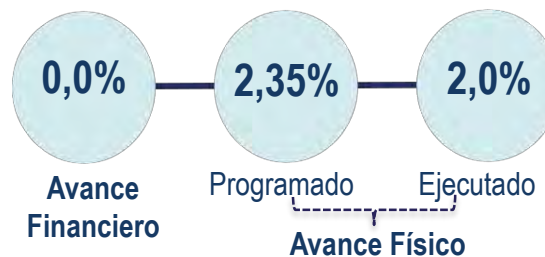

3.379 
Población beneficiada

EMPLEOS GENERADOS

14

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-439-2021
Valor: \$ 1.064.783.875,00


Nombre del Contratista:
INTECVIAS S.A.S.

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-486-2021
Valor: \$ 74.523.750,00

Nombre de la Interventoría:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE
PROTECCIÓN SABANALARGA 2020

Supervisor Interventoría UNGRD

Giovanny Alexander León Pérez –
Subdirección para la Reducción del Riesgo

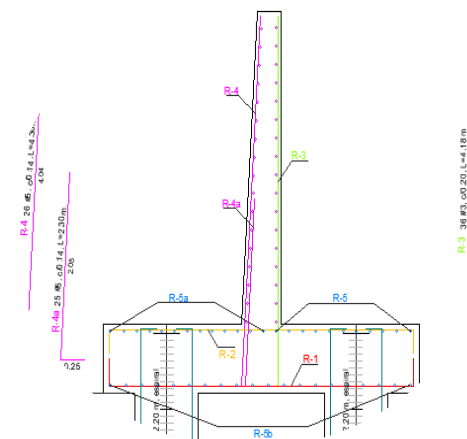



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 35.640.178.999,74
 DPTO CASANARE \$ 4.054.270.702,00
 CORPORINOQUIA \$ 531.349.745,00

Valor total del proyecto

\$ 40.225.799.446,74

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría
 DPTO CASANARE: Obra

Plazo: QUINCE (15) MESES

Fecha de suscripción: 29 - SEPT – 2020

Fecha acta de inicio: 09 - NOV – 2020

Fecha de finalización actualizada: 09 - FEB - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de protección y estabilización

IMPACTO

Construcción de Gaviones- Pendiente finalización
 revisión y ajustes a estudios y diseños para
 establecer el alcance

Estado Actual:

Se encuentra en ejecución de contrato de consultoría suscrito por la Gobernación de Casanare, para actualizar los estudios y diseños iniciales del proyecto. El contrato de consultoría presenta una ejecución del 75%

EMPLEOS GENERADOS

25



25.264 **Población beneficiada**



Contrato de Obra Pendiente inicio proceso de contratación por parte de la Gobernación de Casanare -----	Contrato de Interventoría Pendiente Contratación de obra ----- Nombre de la Interventoría: Consorcio Riesgos GS
Supervisor Interventoría UNGRD Camila Andrea Barreto – Subdirección para la Reducción del Riesgo	

Gracias
