

PROYECTOS DEPARTAMENTO CASANARE

Diciembre 21 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República



ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL



PERSONAS
BENEFICIADAS



NÚMERO DE
DEPARTAMENTOS



NÚMERO DE
MUNICIPIOS



TOTAL
PROYECTOS



TOTAL CONVENIOS
INCLUIDOS



PROYECTOS EN
EJECUCIÓN




PROYECTOS EN
CONTRATACIÓN



PROYECTOS
TERMINADOS



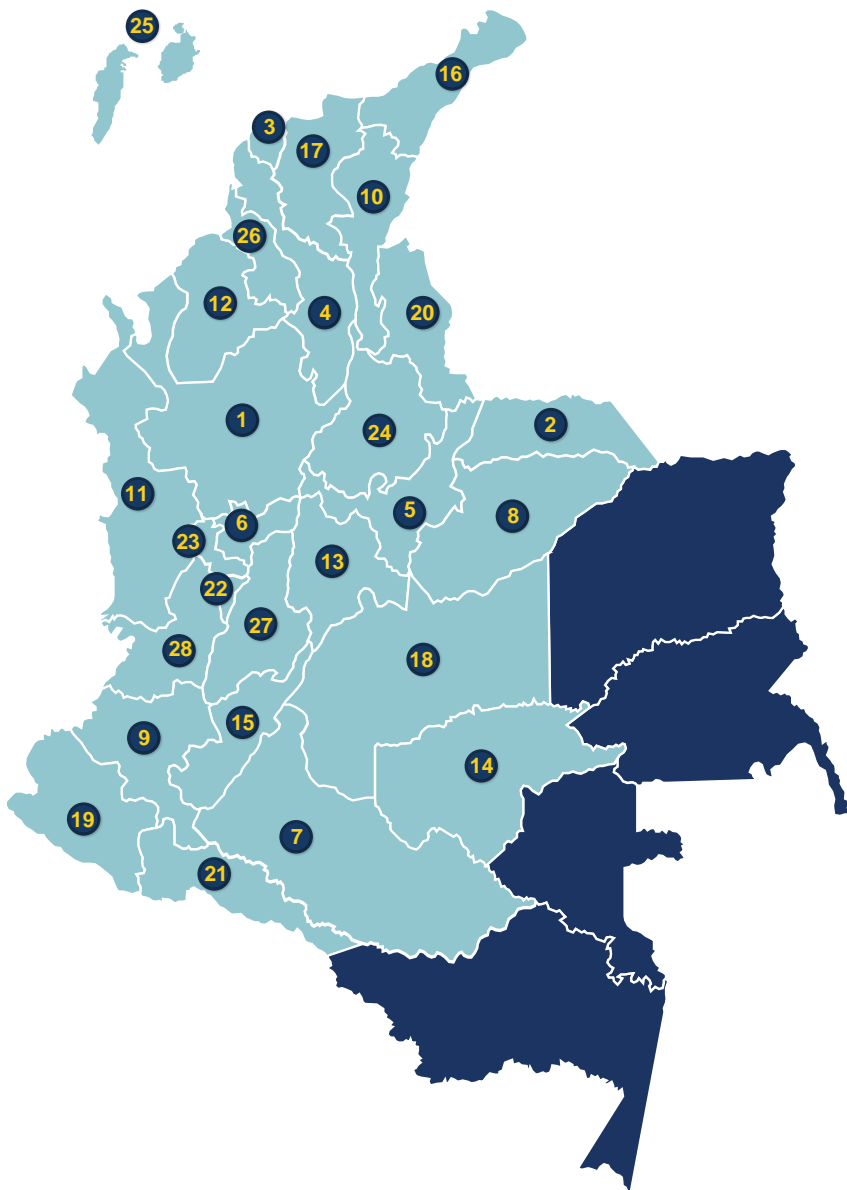

N°	DEPARTAMENTO	N° DE PROYECTOS	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (MILLONES)
1	ANTIOQUIA	8	464.501	\$79.722
2	ARAUCA	1	2.000	\$7.121
3	ATLÁNTICO	12	432.876	\$144.347
4	BOLÍVAR	13	374.353	\$197.480
5	BOYACÁ	1	5.687	\$1.500
6	CALDAS	1	446.160	\$17.575
7	CAQUETÁ	10	612.443	\$159.542
8	CASANARE	9	140.851	\$140.115
9	CAUCA	4	7.153	\$9.438
10	CESAR	6	19.123	\$73.405
11	CHOCÓ	3	36.612	\$45.503
12	CÓRDOBA	15	86.694	\$146.631
13	CUNDINAMARCA	2	2.383	\$8.135
14	GUAVIARE	2	6.000	\$28.210
15	HUILA	5	33.395	\$29.330
16	LA GUAJIRA	2	286.488	\$30.874
17	MAGDALENA	27	402.774	\$472.399
18	META	10	244.900	\$102.800
19	NARIÑO	7	43.896	\$49.354
20	NORTE DE SANTANDER	29	626.132	\$292.695
21	PUTUMAYO	1	7.290	\$2.503
22	QUINDÍO	1	100	\$222
23	RISARALDA	3	53.541	\$26.548
24	SANTANDER	49	803.928	\$953.050
25	SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1	70.000	\$44.774
26	SUCRE	5	86.537	\$77.015
27	TOLIMA	4	21.926	\$37.294
28	VALLE DEL CAUCA	4	50.068	\$21.088
TOTAL		235	5.3 Millones	3.1 Billones



MUNICIPIOS

1	Mani	\$19.427
2	Orocué	\$9.500
3	Paz de Ariporo	\$10.299
4	Pore	\$21.568
5	Sabanalarga (PTAP)	\$1.139
6	Sabanalarga (El secreto)	\$12.000
7	Villanueva	\$12.956
8	Villanueva	\$13.000
9	Yopal	\$40.226

1.

SEGUIMIENTO PROYECTOS EN EJECUCIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 9.499.832.703

Valor total del proyecto

\$ 9.499.832.703

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTE (20) MESES

Fecha de suscripción: 14 - ENE – 2020

Fecha acta de inicio: 06 - MAY - 2020

Fecha de terminación: 04 - ABR - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de protección y/o Estabilización

IMPACTO

Construcción de 245 ml Bolsacretos y dos Muros de Contención de 45 mts c/u.

5.215  Población beneficiada

Estado Actual:

El 14/12/2021, se dio reinicio al contrato de obra. Toda vez que el alto nivel del río Meta que oscilaba entre los 3,5 metros y los 4 metros para los meses mayo a noviembre de 2021 y que había impedido el inicio de las actividades de excavación y cimentación para las obras de protección contempladas, ha disminuido conforme a cesado la temporada invernal en el territorio colombiano.

PERSONAL EN OBRA			
TOTAL OBRA E INTERV: 18		TOTAL PROYECTADO: 50	
LOCAL: 0 – 0%		FORÁNEO: 18 – 100%	
Calificados 0 0%	No Calificados 0 0%	Calificados 18 100%	No Calificados 0 0%

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-756-2019 Valor: \$ 8.967.166.803,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-105-2020 Valor: \$ 532.665.900,00
Nombre del Contratista: Luis Guillermo Ruiz Machado	Nombre de la Interventoría: Consorcio Inter Obras Orocué
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado Amaya Subdirección para la Reducción del Riesgo	



0,00%
AVANCE FINANCIERO



1,06%
AVANCE FÍSICO



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 1.139.307.625

Valor total del proyecto

\$ 1.139.307.625

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 26 - MAR – 2021

Fecha acta de inicio: 13 - ABR - 2021

Fecha de terminación: 13 - ENE - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de protección y/o Estabilización

IMPACTO

Construcción de muro Contención 50,93 ml y 0.30 m de ancho **3.379** Población beneficiada

Estado Actual:

Se realizó Comité el 06/12/2021, con presencia de la interventoría y contratista, y se trataron temas relacionados con el trámite del permiso del predio donde se tiene proyectada la ejecución de las obras, el mismo día el contratista de obra radica a esta interventoría un nuevo comunicado informando de manera reiterativa la aprobación del permiso para dar inicio a la ejecución de las obras. El contratista de obra informa que esta semana no se adelanta ninguna actividad en razón a que no se cuenta con la legalización de los predios donde se tiene proyectada la ejecución de la obra. Esta interventoría manifiesta que en cumplimiento de sus funciones contractuales ha solicitado a la Administración Municipal y a la entidad contratante, que no se cuenta con el permiso del predio para iniciar las actividades programadas.


PERSONAL EN OBRA			
TOTAL OBRA E INTERV: 16		TOTAL PROYECTADO: 32	
LOCAL: 0 – 0%		FORÁNEO: 16 – 100%	
Calificados 0 0%	No Calificados 0 0%	Calificados 14 87,5%	No Calificados 2 12,5%
Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-439-2021 Valor: \$ 1.064.783.875,00		Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-486-2021 Valor: \$ 74.523.750,00	
Nombre del Contratista: INTECVIAS S.A.S.		Nombre de la Interventoría: UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE PROTECCIÓN SABANALARGA 2020	
Supervisor Interventoría UNGRD Giovanni Alexander León Pérez – Subdirección para la Reducción del Riesgo			



0,00%
AVANCE FINANCIERO



2,35%
AVANCE FÍSICO

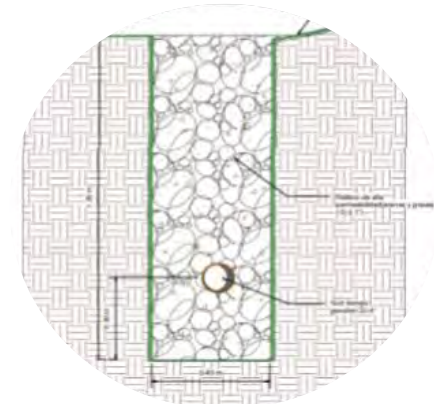

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$12.955.962.914

Valor total del proyecto

\$12.955.962.914

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: CATORCE (14) MESES
 Fecha de suscripción: 14 - JUL - 2021
 Fecha acta de inicio: 25 - OCT - 2021
 Fecha de terminación: 25 - DIC - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de protección y adecuación hidráulica

IMPACTO

Jarillón, Muro en Gaviones y Geo colchones

1.600 Población beneficiada


Estado Actual:

Se continúa con la etapa de construcción correspondiente a las actividades de movimiento de tierras y se detienen las actividades de estructura mientras se da pista para poder ejecutarlas. Se continúa con las actividades de Movimiento de tierras de los ítems 2.1. excavación de cortes ,canalesy préstamo de río, 2.2 .excavación mecánica en material conglomerado bajo agua de 0 - 4m. 2.3. jarillón, con material granular de río con acarreo MÁX. 100 m (OBRAS DE DESVÍO), Se hace reunión con los representantes de los cultivos, la cantera y la comunidad dado que se presenta un cruce de actividades y de intereses en cuanto a que se están ejecutando obras que afectan el desarrollo normal de las actividades del proyecto.

PERSONAL EN OBRA

TOTAL OBRA E INTERV: 5		TOTAL PROYECTADO: 15	
LOCAL: 5 – 100%		FORÁNEO: 0 – 0%	
Calificados 5 100%	No Calificados:0 0%	Calificados 0 0%	No Calificados 0 0%

<p>Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1046-2021 Valor: \$ 12.108.385.414,00</p> <hr/> <p>Nombre del Contratista: CONSORCIO CARACOLI</p>	<p>Contrato de Interventoría 9677-PPAL001-1286-2021 Valor: \$847,577,500,00</p> <hr/> <p>Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES VILLANUEVA</p>
<p>Supervisor Interventoría UNGRD Tatiana Gil Parales Subdirección para la Reducción del Riesgo</p>	

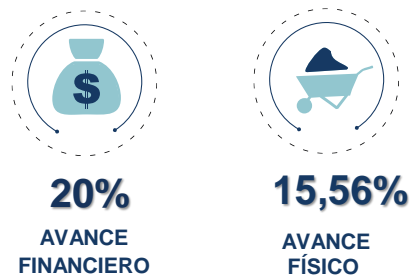

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 35.640.178.999,74
 DPTO CASANARE \$ 4.054.270.702,00
 CORPORINOQUIA \$ 531.349.745,00

Valor total del proyecto
\$ 40.225.799.446,74

EJECUTOR

FNGRDC – UNGRD : Interventoría
 DPTO CASANARE: Obra

Plazo: QUINCE (15) MESES
 Fecha de suscripción: 29 - SEP – 2020
 Fecha acta de inicio: 09 - NOV – 2020
 Fecha de terminación: 09 - AGO - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de protección y estabilización


IMPACTO

Obras de protección en enrocado y geo contenedores.
154.177 Población beneficiada

Estado Actual:
 Solicitud de prórroga del convenio por 18 meses radicada en Fiduprevisora, pendiente por parte de la gobernación de Casanare el proceso de inicio de contratación de obra.

PERSONAL EN OBRA			
TOTAL OBRA E INTERV: 115		TOTAL PROYECTADO: 115	
LOCAL: 92 – 80%		FORÁNEO: 23 – 20%	
Calificados 33 36%	No Calificados 59 64%	Calificados 7 30%	No Calificados 16 70%

Contrato de Obra Pendiente inicio proceso de contratación por parte de la Gobernación de Casanare	Contrato de Interventoría Pendiente Contratación de obra ----- Pendiente de inicio de proceso por parte de la UNGRD
Supervisor Interventoría UNGRD-FGRDC-CORPORINOQUIA Camilla Barreto– UNGRD Guillermo Pérez – FGRDC Dolia Gámez - CORPORINOQUIA	

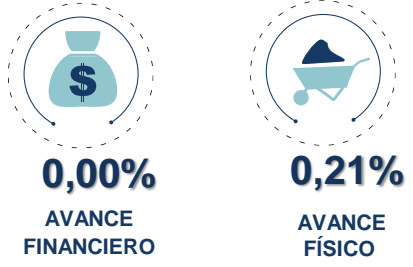

2.

SEGUIMIENTO PROYECTOS EN CONTRATACIÓN

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 19.426.668.381,35

Valor total del proyecto

\$ 19.426.668.381,35

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundación

IMPACTO

Construcción de 1 dique de 1.449 m

2.219 Población beneficiada



DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN de un dique en terraplén y geotubos en el área urbana, el cual tiene una altura de terraplén de 3.0 m y una longitud de 1449 m, así mismo lo componente tres geotubos elaborados en geotextil encapsulado en forma de bolsa, de alta resistencia mecánica. Cada uno con una altura de 1.60 m y un área de 6.05 m² que se ubicará en la parte inferior del terraplén. Para el sector de Santa Helena del Cusiva se construirá mediante la aplicación de seis 6 geotubos de 1.57 m de altura y un área de 7.43 m² cada uno, conformados de forma escalonada en el terreno según especificación del diseño, la cual estará sobre una longitud 310 m al margen del cauce del río



ESTADO

En estructuración



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 10.299.243.014

Valor total del proyecto

\$ 10.299.243.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: CUATRO (4) MESES



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundación

IMPACTO

Construcción de 2 diques de 250 m y 350 m

7.486 Población beneficiada



DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN de dos diques en tierra armada con altura de 4.5 m, cimentados a 1.50 m y una base 6.25m, los cuales tienen longitudes de 250.00 m y 350.00 m respectivamente. Por otra parte, se recomienda desde la parte hidráulica una remoción de sedimentos en el lecho del cauce, para que se desarrolle el mantenimiento de la sección hidráulica, mejorando las condiciones del canal natural y redirección del flujo, reduciendo esfuerzos cortantes que se generen en la margen derecha que ocasionan socavación lateral.



ESTADO

En estructuración



El futuro
de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 21.568.563.206

Valor total del proyecto

\$ 21.568.563.206

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: DIECINUEVE (19) MESES



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundación y protección de orilla

IMPACTO


5 Km de dique en material granular

1.200 Población beneficiada



DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN de 5 km de dique en material granular del río, con gavión y colchoneta reno, en la margen izquierda del Río Pauto. El colchón reno sobre el talud y sobre el cauce tiene un grosor de 0,30 m y se pretende recubrir toda la cara que va a estar expuesta a las aguas del Río Pauto. La longitud del colchón reno en la parte inclinada será de los 5 kilómetros que se pretenden intervenir con esta obra.



ESTADO

En contratación

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 12.000.000.000

Valor total del proyecto

\$ 12.000.000.000

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: DOCE (12) MESES



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundación y protección de orilla


IMPACTO

construcción de un gavión en la corona del dique

9.876 Población beneficiada

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN de obras de protección marginal izquierda del río Upía, mediante la implementación de la construcción de un gavión en la corona del dique, así como actividades de manejo de aguas.



ESTADO

En contratación

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 13.000.000.000

Valor total del proyecto

\$ 13.000.000.000

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: DOCE (12) MESES



TIPO DE INTERVENCIÓN

Control socavación

IMPACTO

construcción de obras de protección marginal

9.876 Población beneficiada 



DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN de obras de protección marginal izquierda del río Upía en 5 sectores sobre el cauce del río Upía usando roca suelta. Perfilado de talud con recubrimiento de colchón o geoesteras. Reforzamiento de la estructura con bolsacretos en la parte inferior funcionando como lastre antisocavación. Construcción de gavión en la corona del dique para manejo de aguas. Construcción de jarillón aguas arriba para controlar caudal.



ESTADO

En estructuración



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N°9677-PPAL001-1101 - 2020
RIO CRAVO SUR**



OBJETO

CONSTRUCCIÓN de obras de control estructural para la estabilización y protección de la margen derecha del rio Cravo Sur.



VALOR CONVENIO

\$ 40.225.799.446,74



PLAZO DE EJECUCIÓN

15 meses



FECHA DE INICIO / FECHA FINALIZACIÓN

9-11-20 / 9-02-22



ENTIDADES Y APORTES DE LAS PARTES

ENTIDAD APORTANTE	ACTIVIDAD	VALOR APORTE	VALOR TOTAL
FONDO NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	obra	\$ 33.644.129.668,74	\$ 35.640.178.999,74
	interventoría	\$ 1.996.049.331,00	
DEPARTAMENTO DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	obra	\$ 3.352.057.657,00	\$ 4.054.270.702,00
	revisión, actualización, ajuste de diseño	\$ 382.213.045,00	
	compensaciones ambientales	\$ 320.000.000,00	
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA	trámites, licencias y permisos ambientales	\$ 161.349.745,00	\$ 531.349.745,00
	documentos y estudio de impacto ambiental	\$ 370.000.000,00	



DESCRIPCIÓN

El **rio Cravo Sur** es potencialmente susceptible a sufrir fenómenos de **EROSIÓN Y SOCAVACIÓN** lateral con capacidad de comprometer la estabilidad del talud que define la terraza alta donde se asienta la ciudad de Yopal.




SOLUCIÓN


- **CONTROLAR** los fenómenos de erosión y migración lateral de la margen derecha con intervenciones de tipo estructural sobre la base del talud donde se ubica el casco urbano del municipio de Yopal en el sector Parque la Iguana y sector Calle octava, hasta urbanización El Paraíso.




***El proyecto no incluye construcción de malecón turístico.**



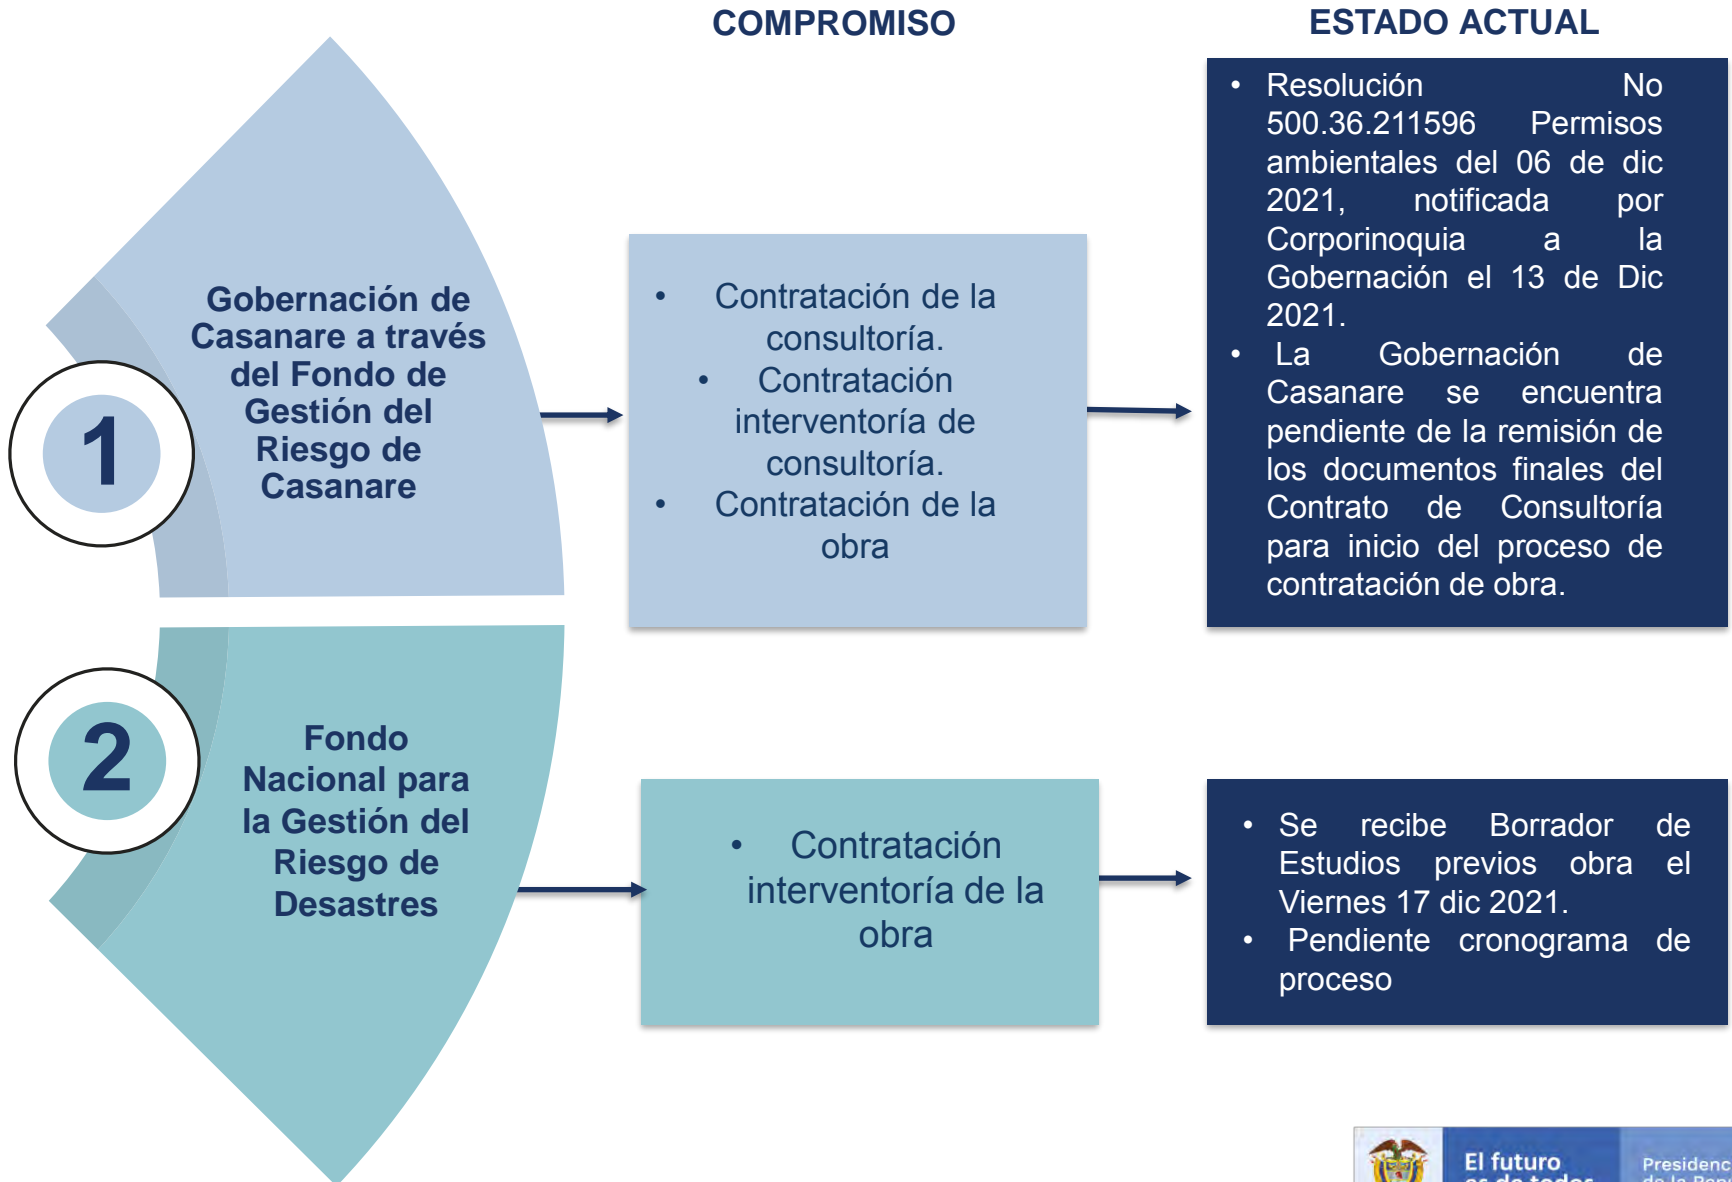

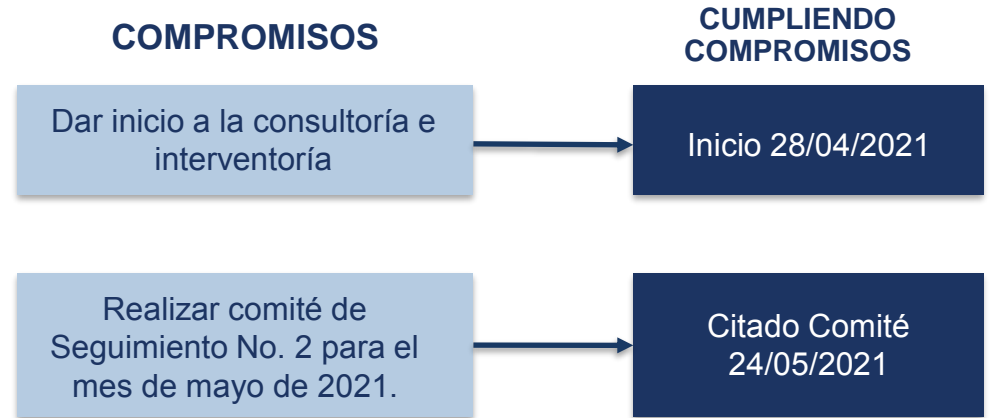


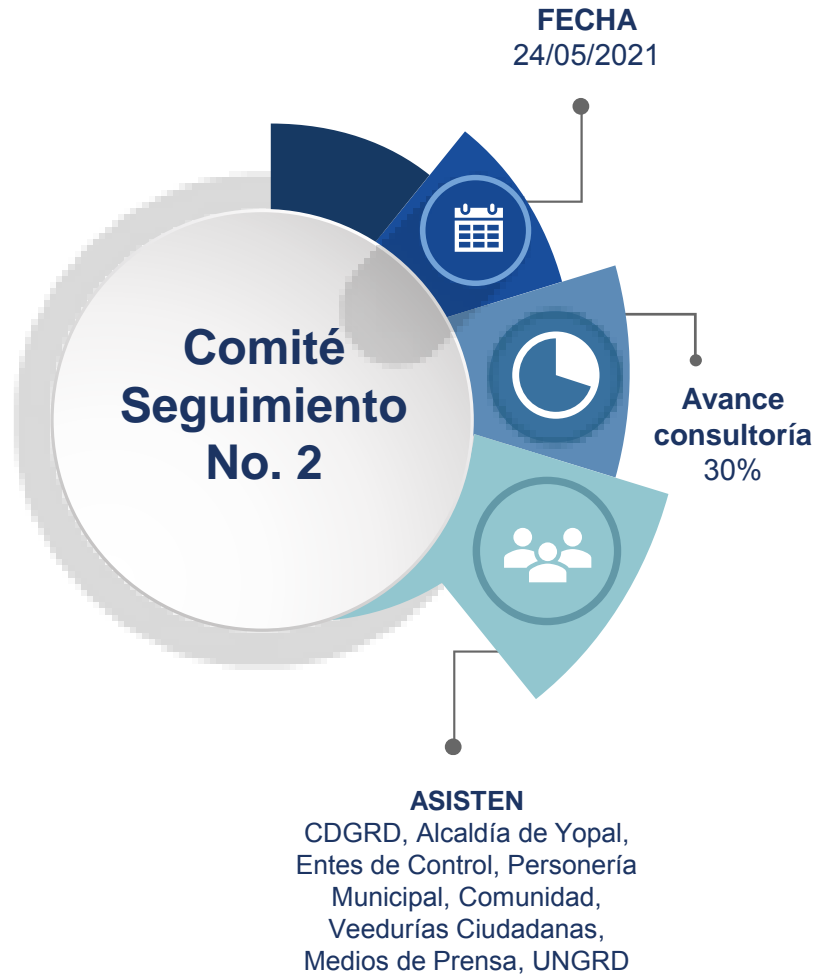

COMPROMISOS

CUMPLIENDO COMPROMISOS

Presentar acta de reunión de fecha 23/04/2021, recolección de firmas, Responsable CDGRD	Acta remitida
CMGRD municipio de Yopal, declaratoria de calamidad pública para obras provisionales de mitigación el plan debe ser analizado por el municipio, se reitera esta solicitud realizada desde el 23 de abril.	Compromiso del Municipio de Yopal.
Creación del link desde la página de la UNGRD, donde se cargarán las presentaciones del comité, responsable UNGRD.	<p>Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/proyectos-os-infraestructura.aspx</p> <p>Se recibe oficio No 3104-2-00703 el 07 de agosto 2021 por parte de Minambiente en donde dan traslado a la Corporación y a la Gobernación. Las entidades dieron respuesta informando que el único proyecto que se ejecuta en el Sector La Iguana es el Convenio ejecutado con la UNGRD.</p>
Confirmación de alcance proyecto de Minambiente de entrevista dada en Yopal, responsable UNGRD.	Acompañamiento a mesa técnica convocada por Alcaldía de Yopal en el mes de julio de 2021.
Disposición de la UNGRD a prestar acompañamiento y asesorías de alertas tempranas al municipio, debe ser gestionada por el municipio de Yopal.	Cumplimiento a Comité, se realiza Virtual por protocolos de Bioseguridad.
Comité N.º 3 de seguimiento, propuesto para el 24/06/2021 - Responsable CDGRD.	Cumplimiento a Comité, se realiza Virtual por protocolos de Bioseguridad.
Creación de link reunión virtual para comité Nº3 – Responsable CDGRD.	

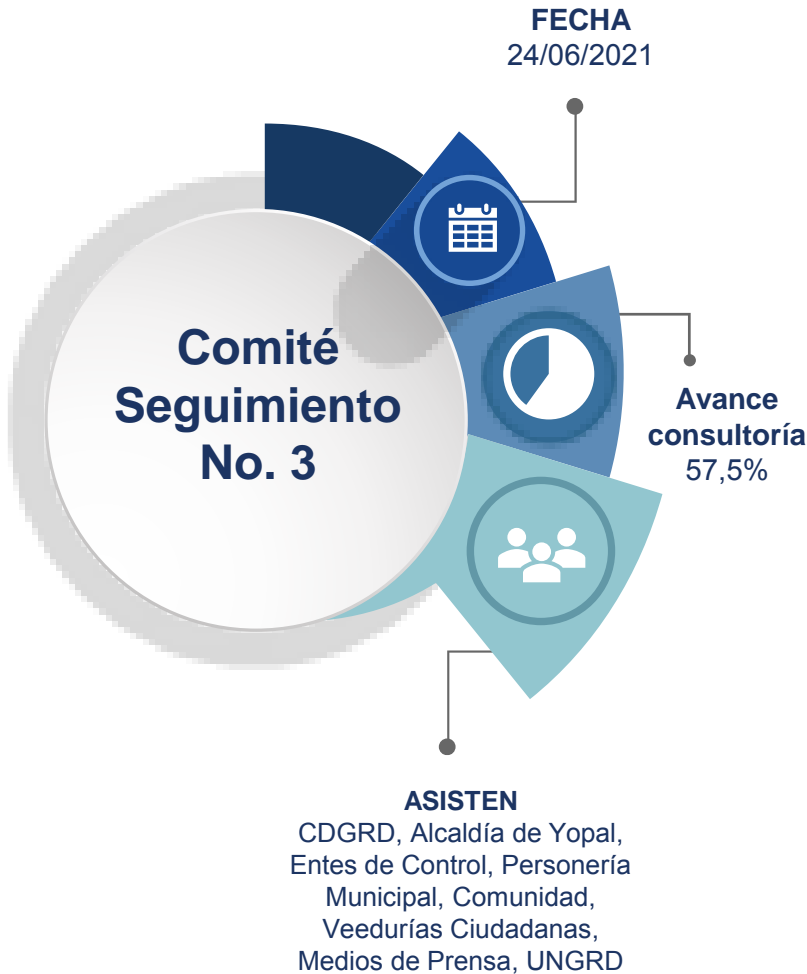

COMPROMISOS

CUMPLIENDO COMPROMISOS

Seguir con las intervenciones correctivas de las obras existentes temporales en el río Cravo Sur.

Desde CDGRD y Municipio de Yopal se vienen haciendo intervenciones con maquinaria para sostenimiento de las estructuras actuales de protección.

Informar sobre los recursos a invertir en la restauración de fauna y flora que corresponde a las compensaciones que se deben generar por parte de Corporinoquia.

El proyecto resultado de la consultoría se radicó en oficinas de la Corporación el 10/09/2021, a la fecha aun no se recibe por parte de la Corporación la tasación de la inversión y actividades a ejecutar.

Adelantar reunión para la implementación de Sistema de Alertas tempranas por parte de Alcaldía Yopal, con acompañamiento de CDGRD y UNGRD.

La reunión programada para el 17/08/2021 fue cancelada por parte de la Alcaldía de Yopal.

Por parte de la UNGRD, una vez se tengan las fechas de esas mesas técnicas con la alcaldía y gobernación, se estará presente tanto con la subdirección de conocimiento y manejo de desastres para apoyar las áreas competentes en realizar de manera integral el sistema de alerta temprana.

La UNGRD ha solicitado en reiteradas ocasiones el reinicio de mesas técnicas.

Reiterar a Minambiente y hacer las gestiones pertinentes para que den respuesta al oficio por parte de la UNGRD que fue enviado en días anteriores y que informen cuáles son las acciones que van adelantar en el sector de la Iguana y sus alrededores.

Se recibe oficio No 3104-2-00703 el 07/08/2021 por parte de Minambiente en donde dan traslado a la Corporación y a la Gobernación.
 Las entidades dieron respuesta informando que el único proyecto que se ejecuta en el Sector La Iguana es el Convenio ejecutado con la UNGRD.




COMPROMISOS

CUMPLIENDO COMPROMISOS

Realizar socializaciones con la comunidad en el momento de la ejecución de obras.	→	La UNGRD estará pendiente del cumplimiento de éste trámite por parte del contratista y del gobierno departamental.
Compartir presupuesto de obras producto de la consultoría	→	El presupuesto será socializado por parte de CDGRD como supervisor del contrato de Consultoría e Interventoría a la Consultoría al momento de entrega.
Considerar alternativa de diseño de la veeduría respecto a uso de geobolsas.	→	En el desarrollo de la Consultoría se ha integrado propuestas de veedurías.
Entrega de consultoría 27/08/2021 y radicación en Corporinoquia para proceder con proceso de obra	→	Se radicó en la Corporación 10/SEP/21. Resolución Permisos ambientales 06/DIC/21
Reiterar solicitud Min ambiente, con el fin de conocer proyecto parque La Iguana – Municipio de Yopal tiene proyecto de Jardín Botánico – Guillermo Pérez de CDGRD se compromete a confirmar información del proyecto con alcaldía	→	Se recibe oficio No 3104-2-00703 el 07/08/2021 por parte de Minambiente en donde dan traslado a la Corporación y a la Gobernación. Las entidades dieron respuesta informando que el único proyecto que se ejecuta en el Sector La Iguana es el Convenio ejecutado con la UNGRD.



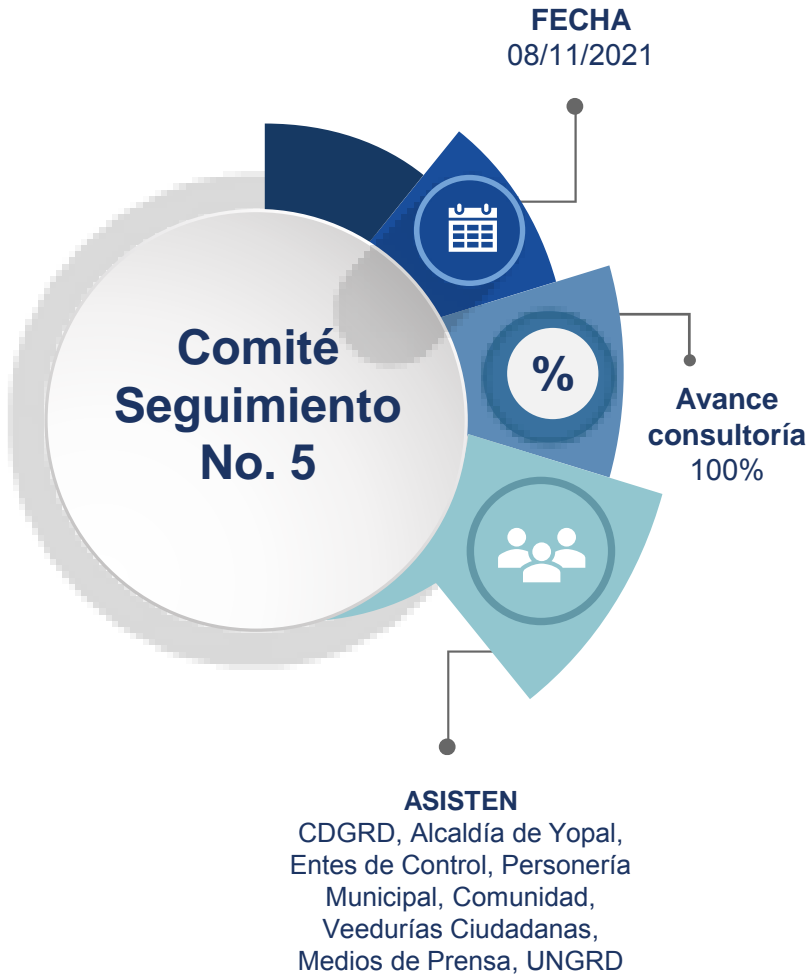


COMPROMISOS

CUMPLIENDO COMPROMISOS

Asistencia por parte de Planeación a los comités de seguimiento del convenio.	Se realiza la invitación al comité de seguimiento
Realizar mesa de trabajo POT (semana del 16 al 19 de noviembre de 2021, por confirmar fecha)	Se realiza la invitación al comité de seguimiento
Presentar paquete de consultoría a la veeduría, que incluya: diseños, cálculos de diseños, presupuesto, estudio de Impacto Ambiental.	CUMPLIDO Reunión realizada el 17 de noviembre 2021
Presentar diseños previo inicio de obra a la comunidad y veeduría de obra	PENDIENTE
Continuar con las intervenciones por parte del CDGRD de Casanare para protección de obras actuales con maquinaria, e intervenir el sector del Ápice que queda por fuera del convenio actual.	La Gobernación reporta inicio intervención en el sector Ápice el día 07 de diciembre, intervención se encuentra en ejecución
Adelantar prórroga al convenio, dado que se vence en febrero de 2022.	En tramite en Fidupervisora
Corporinoquía adelantar revisiones de radicados y adelantar mesas técnicas para mayor celeridad del proceso..	CUMPLIDO
Elaborar cronograma de permisos y de inicio de obra, a presentar a comunidad en la semana del 16 al 19 de noviembre de 2021.	Pendiente Cronograma Definitivo por parte de Gobernación



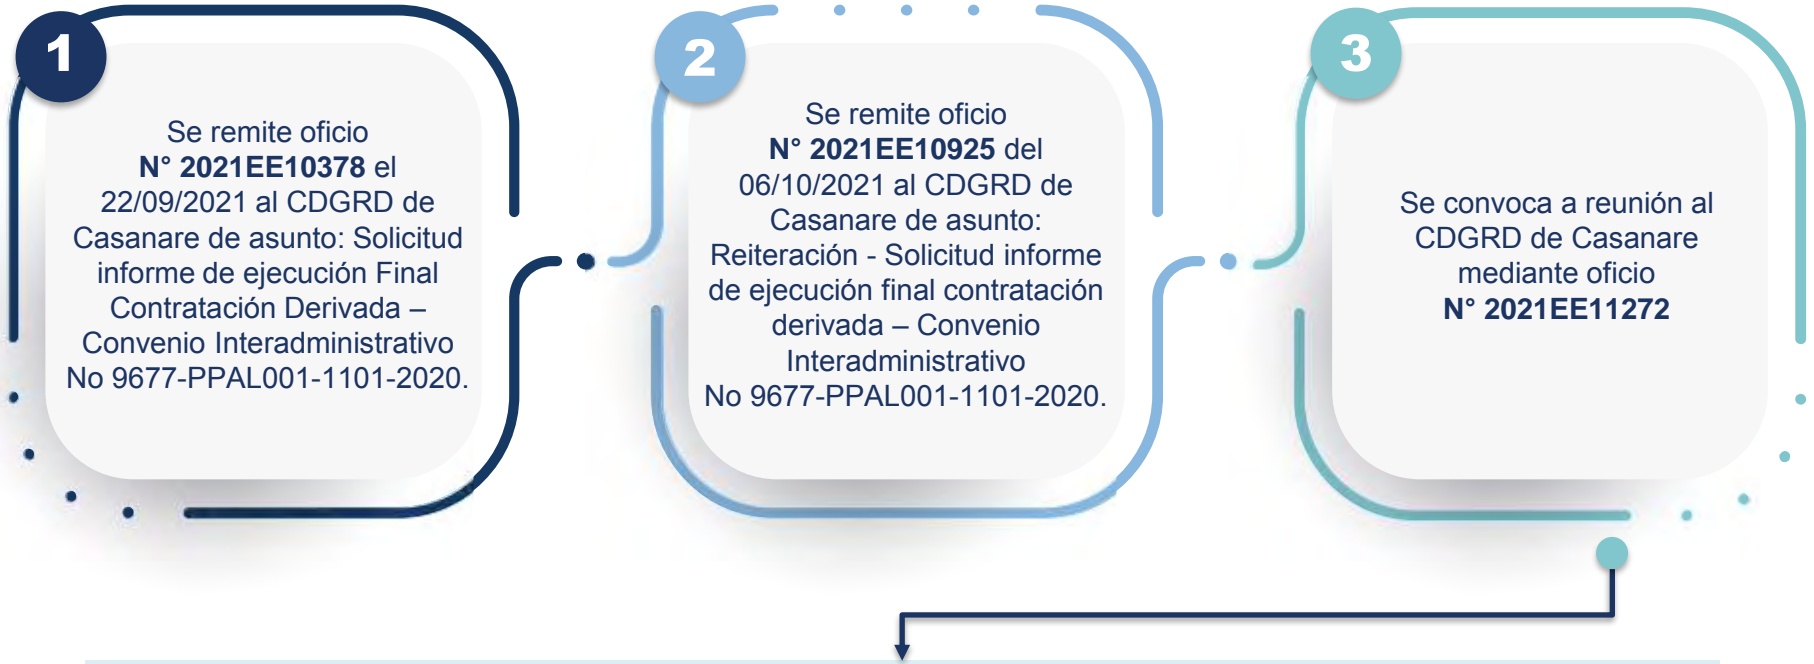

.. El Acta de Inicio del convenio fue suscrita por las partes el 09/11/2020 y presenta fecha de finalización del 09/02/2022; es decir nos quedan 04 meses de ejecución del convenio y aun no se ha iniciado por parte de la Gobernación de Casanare el proceso de contratación de la obra.

Cabe resaltar, que se ha requerido a la supervisión designada por parte de la Gobernación, mediante los oficios 2021EE10378 y 2021EE10925 remitidos los días 22 de septiembre y 06 de octubre del 2021 respectivamente; la remisión del informe final de ejecución de la contratación derivada, con sus respectivos anexos correspondientes a la ejecución del contrato de consultoría; así como el producto final resultado del contrato de Consultoría; de igual manera, se ha requerido informar la fecha de inicio programada del proceso de selección para el contratista de obra, requerimientos que a la fecha no han obtenido respuesta.

COMPROMISOS				
TEMA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	ESTADO
1	Remisión de oficios solicitando información de subsanaciones a Consultoría e interventoría, con copia a la UNGRD	CDGRD Casanare	29/10/21	CUMPLIDO
2	Convocatoria de Reunión de socialización de los avances presentados, para el día lunes 08 de noviembre.	CDGRD Casanare	29/10/21	CUMPLIDO
3	Radicación oficio e informe de supervisión de solicitud de prórroga al Convenio	CDGRD Casanare	29/10/21	CUMPLIDO
4	Remisión de oficio dirigido a Corporación Corporinoquia indicando finalización del convenio, y requiriendo la solicitud de prórroga, según compromisos del Convenio	UNGRD	29/10/21	CUMPLIDO
5	Remisión de informe ejecutivo de Supervisión, en donde se determine la ejecución financiera y se anexen los documentos soportes correspondientes.	CDGRD Casanare	29/10/21	SIN CUMPLIR

4

Se realiza reunión el 25 /10/2021, entre UNGRD y CDGRD de Casanare, en donde se establecen los siguientes compromisos.

COMPROMISOS				
TEMA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	ESTADO
1	Estado Permisos ambientales	CDGRD Casanare/Corporinoquia	N/A	La Corporación reporta que se encuentra subsanados todos los documentos, y que se emite Resolución No 536211596 de fecha 06 de diciembre. CUMPLIDO
2	Elaboración de Cronograma, Proceso Contractual obra (Compromiso mesa técnica del 08 de noviembre 21)	CDGRD Casanare	14/12/21	Se remite Cronograma, sin definir fechas, pendiente Cronograma definitivo.
3	Intervención sector Ápice (Compromiso mesa técnica del 08 de noviembre 21)	CDGRD Casanare	16/11/21	La Gobernación reporta inicio intervención en el sector Ápice el día 07 de diciembre, intervención se encuentra en ejecución.
4	Remisión de documentos precontractuales de obra, para que la UNGRD inicie estructuración del proceso de contratación de la interventoría	CDGRD Casanare	15/12/21	Se recibe borrador de estudios previos. Pendiente cronograma de proceso de contratación Obra

5

Se realiza reunión el 13/12/2021, entre UNGRD, CDGRD de Casanare, y Corporinoquia en donde se establecen los siguientes compromisos.

6

Se encuentra en proceso
trámite de prórroga al
Convenio por un término
de dieciocho (18) meses

7

Fecha de finalización
Convenio 09/02/2022

Nueva fecha de finalización
09/08/2023

Estado:
En tramite en Fiduprevisora

Gracias

