

SEGUIMIENTO OBRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN MOCOA

Agosto 11 de 2021



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

1.

SEGUIMIENTO OBRAS DE MITIGACIÓN, VÍAS Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN

\$175.603 millones



Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento ejecución
18 de obra	18	100%
13 de interventoría	13	100%

Estamos ejecutando **57** intervenciones en total

OBRAS DE VÍAS Y ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL OBRAS DE VÍA Y ALCANTARILLADO

\$39.525 millones




Total de contratos	Ejecución	% en Perfeccionamiento ejecución
13 de obra	13	100%
4 de interventoría	4	100%

1.1

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MITIGACIÓN EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS DE MITIGACIÓN

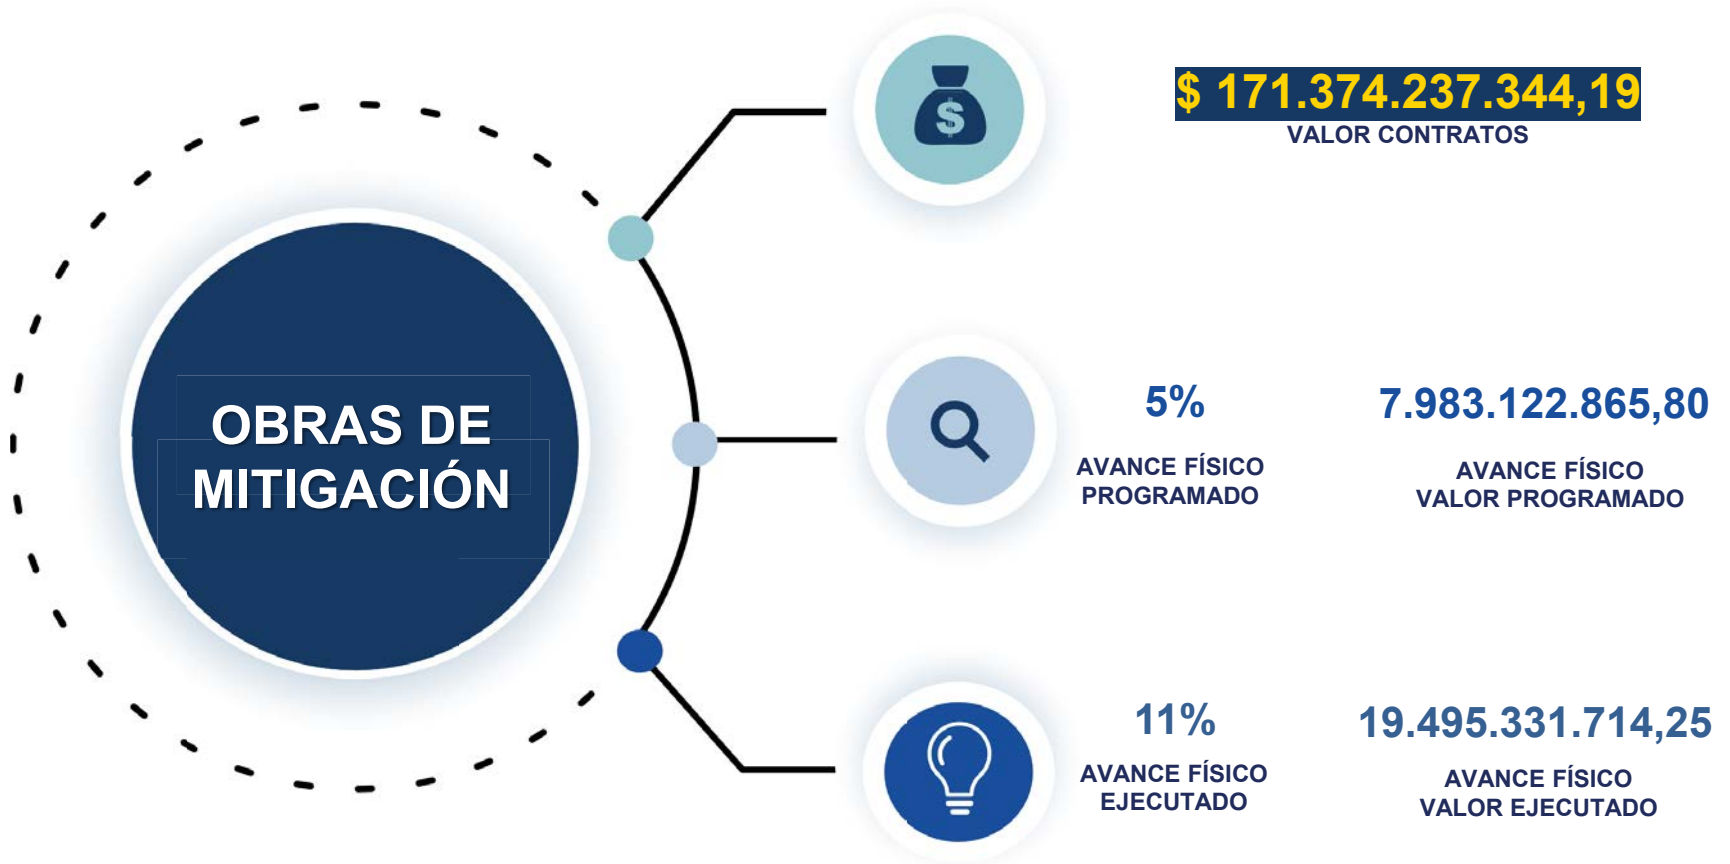

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.201.825.861

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 15 - MAR - 2019

Fecha acta de inicio: 26 - JUN - 2019

Fecha de finalización actualizada por suspensión:

12 - AGO – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de muro de contención
77.20 ml Pantalla inclinada **457 m3**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 24

Total Projectado: 26

Local 24

100%

Foráneo 0

0%

Calificados 14

58%

No Calificados 10


42%

Calificados 0

0%

No Calificados 0

0%

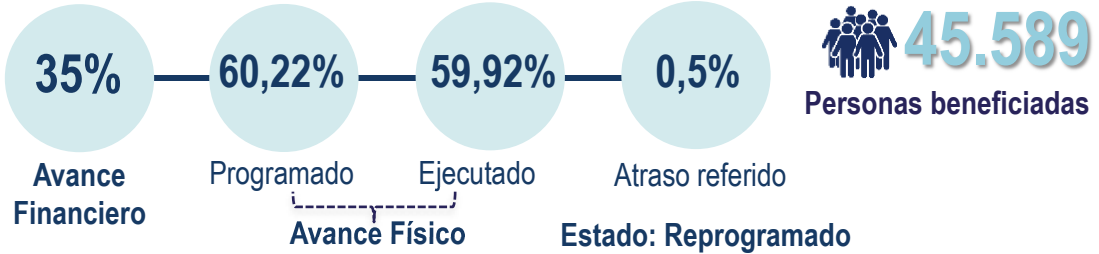

Contrato de Obra
No. 063 del 2019
Valor: \$ 3.841.235.901

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-261-2019
Valor: \$ 360.589.960

Nombre del Contratista:
Virgilio Bravo Sosa

Nombre de la Interventoría:
Yahara Maritza Viveros Ortiz

Supervisor UNGRD

Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Anclajes



Perforación para anclajes

ALCANCE

- Muro de contención - Río Sangoyaco
- Pantalla inclinada – Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 32.844.159.281,86

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 14 - SEP - 2020
 Fecha acta de inicio: 15 - DIC - 2020
 Fecha de finalización actualizada: 14 - JUN - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación


IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 1 Jarillón de **1050 ml**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 122
 Total Projectado: 140

Local 90 74%	Calificados 36 40%
	No Calificados 54 60%
Foráneo 32 26%	Calificados 26 81%
	No Calificados 6 19%

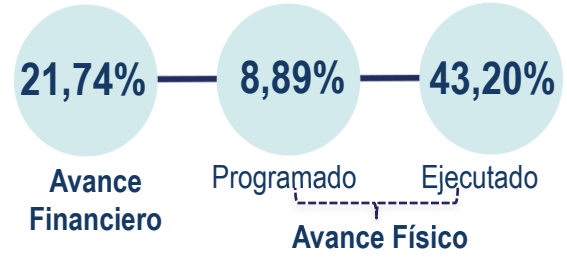

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-977-2020 Valor: \$ 30.418.456.852,86	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1365-2020 Valor: \$ 2.425.702.429,00
Nombre del Contratista: INGECON SA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER JARILLON 2020
Supervisor UNGRD Ing. Luis Eduardo Torres – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Jarillón 1 - Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 4.706.751.939,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: **CATORCE (14) MESES**
Fecha de suscripción: 01 – OCT - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 31
Total Projectado: 34

Local 26
84%


Foráneo 5
16%

Calificados 17
65%

No Calificados 9
35%

Calificados 5
100%

No Calificados 0
0%

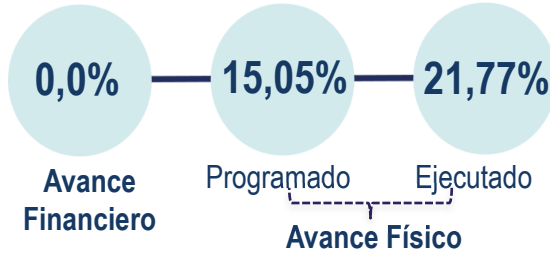

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1025-2020
Valor: \$4.302.041.377,00

Nombre del Contratista:
CONSORCIO RECUPERACIÓN
MOCOA LH 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00
(valor para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD

Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



Se reprograma y no se reporta avance físico debido a que se adelantan actividades de recuperación después del evento del pasado 21/07/2021



Descolmatación y recuperación del jarillón de protección del muro 6



ALCANCE

- Muro 6 - Río Mulato
- Espolón 1 - Río Mulato
- Espolón 2 - Río Mulato
- Azud 8 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 6.115.409.901,98

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CATORCE (14) MESES
Fecha de suscripción: 16 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 12 – FEB - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - ABR - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 19
Total Projectado: 22

Local 11
58%


Foráneo 8
42%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 1
13%

No Calificados 7
87%

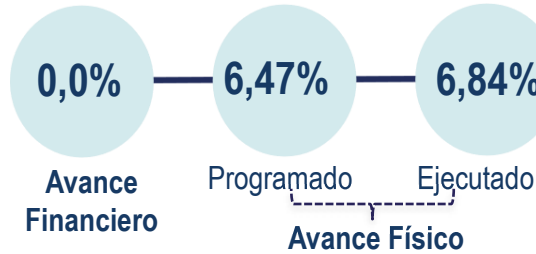

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-980-2020
Valor: \$ 5.710.699.339,98

Nombre del Contratista:
HAROLD MUÑOZ MUÑOZ

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-139-2020
Valor: \$ 404.710.562,00

(valor para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO HECAD VIAL

Supervisor UNGRD

Ing. Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

- Azud 9 - Río Mulato
- Azud 10 - Río Mulato
- Muro 7 - Río Mulato



Excavación mecánica para instalación de gabiones Muro 7 – Río Mulato



Construcción de gabiones Muro 7 - Río Mulato

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 7.488.477.539,43

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 13 – ENE - 2021

Fecha acta de inicio: 08 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 07 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

CONSTRUCCIÓN de 2 diques

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 26

Total Projectado: 35

Local 18

69%

Calificados 14

78%

No Calificados 4

22%

Foráneo 8

31%

Calificados 8

100%

No Calificados 0

0%

0,0%

Avance Financiero

0,16%

Programado

0,05%

Ejecutado

68,75%

Atraso referido



45.589

Personas beneficiadas

Avance Físico



Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1334-2020
Valor: \$ 6.924.254.899,43

Nombre del Contratista:
CONSORCIO RIO
MULATO.

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-141-2021
Valor: \$ 564.222.640,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
RÍO MULATO

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Dique Abierto 1 - Río Mulato
- Dique Abierto 2 - Río Mulato

6 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO 1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO

ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 11.015.788.965,85

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECISEIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 04 – SEP - 2020
Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 08 - JUL - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de dique, muros y azud.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 14 Total Projectado: 40	Local 12 86%	Calificados 8 67%
		No Calificados 4 33%
	Foráneo 2 14%	Calificados 2 100%
		No Calificados 0 0%

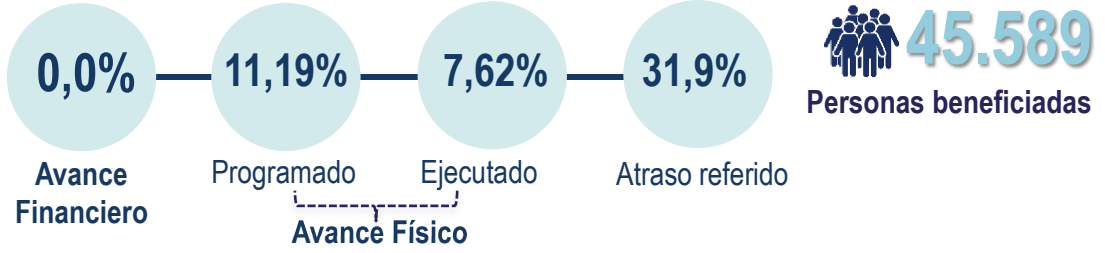

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-988-2020 Valor: \$ 10.192.609.812,85	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-116-2021 Valor: \$ 823.179.153,00
Nombre del Contratista: CDF INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERDIQUE 2020
Supervisor UNGRD Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa	



- ALCANCE**
- Dique Abierto 3
 - Muro 1
 - Azud 05
 - Muro 2
 - Azud 04
 - Muro 3

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 12.263.393.477,06

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 24 – FEB - 2021

Fecha acta de inicio: 09 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 08 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **10** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de muros, azud y obras de drenaje

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 16
Total Projectado: 45

Local 12
75%


Foráneo 4
25%

Calificados 6
50%

No Calificados 6
50%

Calificados 4
100%

No Calificados
0%

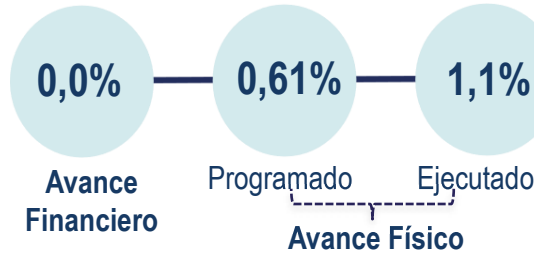

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-201-2021
Valor: \$ 11.334.163.511,06

Nombre del Contratista:
CONSORCIO OBRAS DE
PROTECCION 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-344-2021
Valor: \$ 929.229.966,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO MUROS
MOCOA

Supervisor UNGRD

Geo. Nelson Romero Suarez – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Azud 06
- Muro 4
- Azud 07
- Muro 5
- Muro 09
- Azud 11
- Muro 8
- Muro 10
- Azud 12
- Obras de drenaje



ACTORES E INVERSIÓN


FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto
\$ 7.204.019.704,53

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 29 – ENE - 2021
Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 27 Total Projectado: 35	Local 20 74%	Calificados 7 35%
		No Calificados 13 65%
	Foráneo 7 26%	Calificados 5 71%
		No Calificados 2 29%

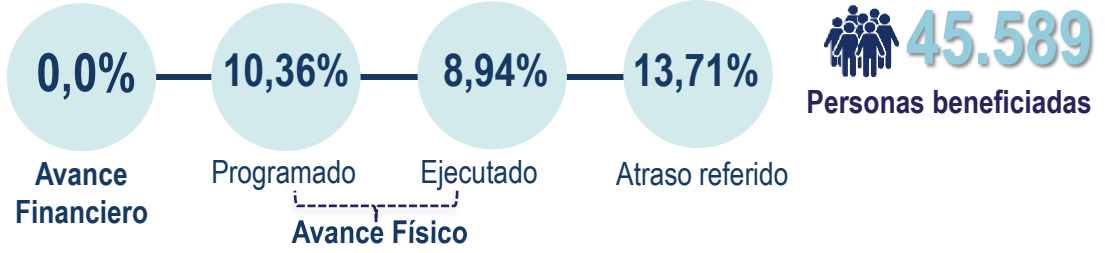

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1388-2020 Valor: \$ 6.667.715.826,33 ----- Nombre del Contratista: CONSORCIO DIQUE 1	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-345-2021 Valor: \$ 536.303.878,1967 (para este contrato) ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Formaleta Dentellón



Armado Acero Dentellón



ALCANCE • Dique Abierto 1 - Q. Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 6.827.896.668,28

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – ENE- 2021

Fecha acta de inicio: 12 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 11 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de dique abierto.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 21
Total Projectado: 35

Local 11
52%

Foráneo 10
48%

Calificados 6

55%

No Calificados 5

45%

Calificados 6

60%

No Calificados 4

40%

0,0%

Avance
Financiero

5,65%

Programado

9,74%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1023-2020
Valor: \$ 6.319.593.302,48

Nombre del Contratista:
CONSORCIO MURO RIO
MOCOA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-345-2021
Valor: \$ 508.303.365,8033
(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
MOCOA 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Carlos Mario Arteaga – Reconstrucción Mocoa



Excavación de Zarpa y aleta.



Evacuación de agua mediante bombeo



ALCANCE

- Dique Abierto 2 Sector Quebrada Taruca

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 5.707.351.594,38

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 19 – NOV - 2020

Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 5
Total Projectado:35

Local: 3
60%

Foráneo: 2
40%

Calificados: 3

100%

No Calificados 0


0%

Calificados : 2

100%

No Calificados 0

0%

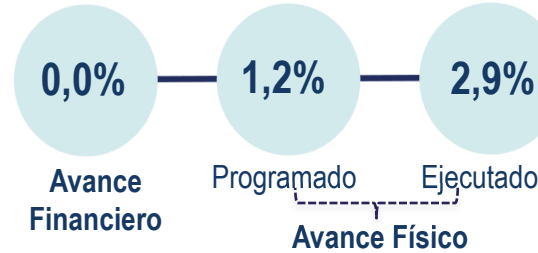

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1119-2020
Valor: \$ 5.280.966.838,95

Nombre del Contratista:
A&A CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 426.384.755,43

(para este contrato)
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Inicio Excavaciones Azud 11



Labores de SST en obra



ALCANCE

- Azud 11
- Muro 04
- Muro 05

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 16.651.641.771,25

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 02 – OCT - 2020

Fecha acta de inicio: 16 – MAR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 15 - SEP - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **6** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón, azud y muros.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 45

Local: 4
50%

Foráneo: 4
50%

Calificados: 4

100%

No Calificados 0

0%

Calificados : 3

75%

No Calificados 1

25%

0,0%

Avance
Financiero

4,5%

Programado

5,2%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1064-2020
Valor: \$ 15.407.631.114,68

Nombre del Contratista:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS
RIO SANGOYACO 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-154-2021
Valor: \$ 1.244.010.656,57

(para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORES
DDA MOCOCA

Supervisor UNGRD

Ing. Robinson Lemus - Reconstrucción Mocoa



Excavación Azud 12



Almacenamiento Materiales



ALCANCE

- Jarillón 02 (200 m)
- Azud 12
- Muro 06
- Azud 13
- Azud 14
- Muro 07

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 26.536.775.722,39

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 05 – FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 28 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 27 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de Jarillón y espolones.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 10
Total Projectado: 61

Local 6
60%


Foráneo 4
40%

Calificados 3
50%

No Calificados 3
50%

Calificados 4
100%

No Calificados 0
0%

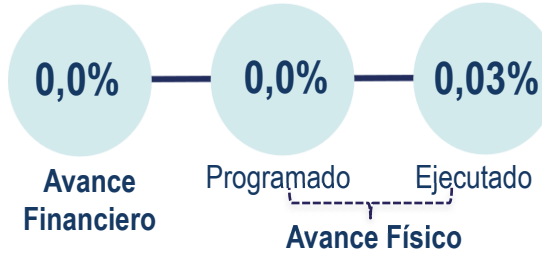

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1382-2020
Valor: \$ 24.574.127.979,39

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO
MOCOA 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-205-2021
Valor: \$ 1.962.647.743,00

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERDRAGADOS MOCOA

Supervisor UNGRD

Ing. Luis Eduardo Torres - Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

- Jarillón
- Espolones



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.943.285.850,62

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
 Fecha de suscripción: 09 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 03 – MAY - 2021
 Fecha de finalización actualizada: 02 - NOV - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1** intervención
CONSTRUCCIÓN de azud.

Estado Actual:

Porcentajes actualizados según reprogramación de obra aprobada por interventoría después de las crecientes súbitas presentadas en julio.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 34
 Total Projectado: 37

Local: 19
50%

Foráneo: 19
50%

Calificados: 11
58%

No Calificados 8
42%

Calificados : 18
95%

No Calificados 1
5%

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-311-2021
 Valor: \$ 2.723.478.287,36


Nombre del Contratista:
 CONSORCIO MIRAVALLE

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-110-2021
 Valor: \$ 219.807.563,26

(para este contrato)
 Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTERVENTORIA
 PUTUMAYO 2020

Supervisor UNGRD

Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa

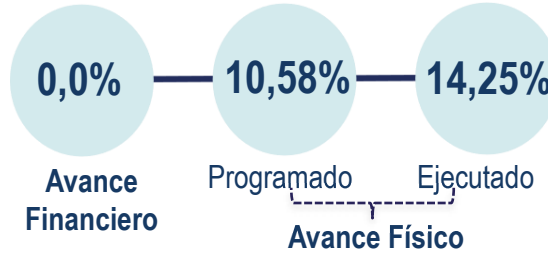

45.589
 Personas beneficiadas



Visita técnica



Jarillón de protección.

ALCANCE

• Azud 10, Sector Río Sangoyaco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.096.212.362,12

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 21 – DIC - 2020

Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **2** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique abierto y muro de protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 12

Total Projectado: 30

Local: 6
50%

Foráneo: 6
50%

Calificados: 6
100%

No Calificados 0
0%

Calificados : 6
100%

No Calificados 0
0%

0,0%

Avance
Financiero

4,3%

Programado

4,98%

Ejecutado

Avance Físico

45.589

Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1330-2020 Valor: \$ 1.938.876.092,45 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 157.336.269,67 (para este contrato) Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Limpeza y desmonte del área para Muro 09



Delimitación y señalización Azud 15



ALCANCE

- Azud 15
- Muro 09



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 6.705.288.187,44

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de suscripción: 08 – MAR - 2021
Fecha acta de inicio: 15 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada: 14 - OCT - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **3** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de dique, azud y muro protección.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 4
Total Projectado: 30

Local 0
0%

Foráneo 4
100%

Calificados 0
0%

No Calificados 0
0%

Calificados 4
100%

No Calificados 0
0%



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-323-2021 Valor: \$ 6.202.006.626,11	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-133-2021 Valor: \$ 503.281.561,33 (para este contrato)
Nombre del Contratista: CONSORCIO EVI5	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER – MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Robinson Lemus Clavijo - Reconstrucción Mocoa	



Pausadas Actividades Campo por PREDIAL



Modificación a diseños por prediales



ALCANCE

- Azud 16 y 17
- Muro 10



El futuro es de todos

Presidencia de la República

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 8.981.109.127

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES



Fecha de suscripción: Adquisición de pólizas por parte del consorcio.

Fecha acta de inicio: Adquisición de pólizas por parte del consorcio.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones **CONSTRUCCIÓN** de muros y azud.

Estado Actual:

En espera de aprobación de pólizas por parte de Fiduprevisora.

45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1342-2020 Valor: \$ 8.307.462.027	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-098-2021 Valor: \$ 673.647.100
Nombre del Contratista: CONSORCIO AZUD MOCOCA 520	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA MUROS MOCOCA 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	



Ubicación diques azud 08 y Muro 01 (Río Sangoyaco)



ALCANCE

- Azud 03
- Azud 04
- Azud 07
- Azud 08
- Muro 01

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 8.470.387.014

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 23- JUN- 2021

Fecha acta de inicio: Pendiente por cambio de R.L

Fecha de finalización actualizada: 14 - ENE - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras estabilización y recuperación

IMPACTO

Este contrato desarrollará **5** intervenciones
CONSTRUCCIÓN de azud y muros.

Estado Actual:

Pendiente de cambio de Representante Legal por Fiduprevisora.

Se adelanta elaboración de **PMT, PMA, PGS.**

45.589
Personas beneficiadas



*Ubicación Dique azud 6 y Muro 2 Q. Taruca
Ubicación Muro 3- Río Sangoyaco*

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-639-2021 Valor: \$ 7.838.331.969 <hr/> Nombre del Contratista: CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-110-2021 Valor: \$ 632.055.045 (para este contrato) <hr/> Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA PUTUMAYO 2020
Supervisor UNGRD Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Azud 09 y muro 03, Sector Río Sangoyaco.
- Azud 05, azud 06 y muro 02 sector Quebrada Taruca.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.816.288.237,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 13 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: Se está a la espera de aclaración con Corpoamazonía para dar inicio.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de drenaje

IMPACTO

Este contrato desarrollará diferentes intervenciones para el manejo de aguas.

Estado Actual:

En espera de respuesta por parte de Corpoamazonía sobre aclaración de los estudios y diseños entregados, a la fecha se han realizado 7 solicitudes formales, el último oficio se radicó el día **28/07/2021** con copia a Procuraduría y a Contraloría. Pendiente por parte de Fidupervisora perfeccionamiento del contrato de obra de acuerdo a la corrección de pólizas enviadas por el contratista desde **14/07/2021**.

 **45.589**
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-183-2021
Valor: \$ 4.452.771.492,00

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-743-2021
Valor: \$ 363.516.745,00

Nombre del Contratista:
CONSTRUVAL
INGENIERÍA S.A.S.

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INGENIERÍA DE
MITIGACIÓN

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

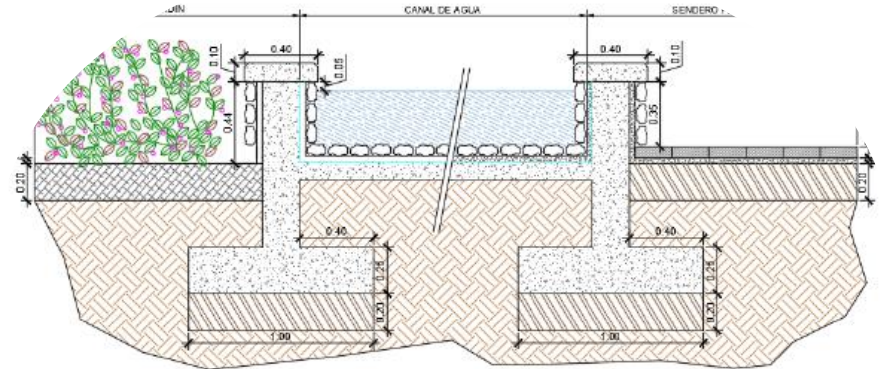


Figura 4-4. Esquema canal.

Detalle de canal

Construcción:

- Cunetas
- Zanjas de Coronación
- Estructuración de Disipación

- Espejos de agua
- Canales y vertederos



ALCANCE

1.2

SEGUIMIENTO A VÍAS Y ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN

AVANCE TOTAL DE OBRAS VÍAS Y ALCANTARILLADO



1 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO BARRIOS JARDINES DE BABILONIA, PRIMERO DE ENERO, VENECIA, OBRERO II ETAPA, SAN ANDRÉS Y CENTRO POBLADO PEPINO

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 8.840.532.147

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: DIEZ (10) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 17 – JUN - 2021
Fecha de finalización actualizada: 16 - ABR - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de vías en **7 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 26	Local 5 45%	Calificados 4 80%
		No Calificados 1 20%
	Foráneo 6 55%	Calificados 6 100%
		No Calificados 0 0%

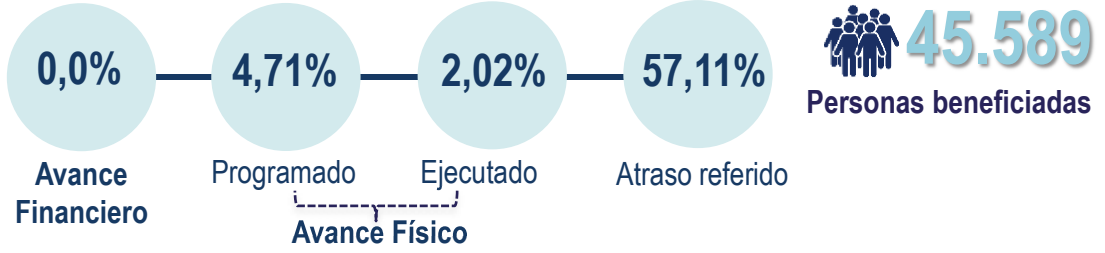

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-366-2021 Valor: \$ 8.272.681.997	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-555-2021 Valor: \$ 567.850.150
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS MOCOA 040	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER VIAS
Supervisor UNGRD Ing. Carlos M. Arteaga – Reconstrucción Mocoa	



Actas Vecindad 1ro Enero



Localización y replanteo obrero II

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Jardines de Babilonia – La Unión.

- Calle 1A sur entre Cementerio y Carrera 8 vía Pasto.
- Barrio Primero de Enero.
- Barrio Venecia.
- Barrio Obrero II Etapa.
- Barrio San Andrés.
- Centro Poblado el Pepino.

2 CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$1.348.270.441

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CUATRO (4) MESES

Fecha de suscripción: 05 – MAR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada por suspensión: 18 - OCT – 2021


TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundaciones y canalización en tubería de aguas lluvias y sanitarias

IMPACTO

Se realizará intervención en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 24 Total Projectado: 25	Local 22 92%	Calificados 12 17%
		No Calificados 10 83%
	Foráneo 2 8%	Calificados 0 0%
		No Calificados 2 100%

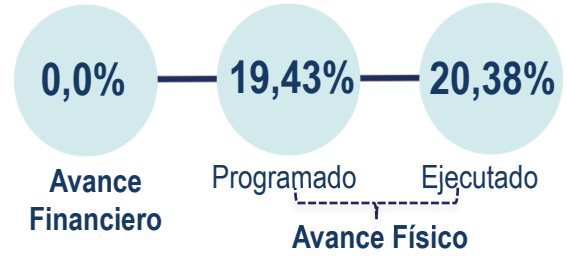

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-378-2021 Valor: \$ 1.258.851.707	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.396.558
Nombre del Contratista: JAVIER GUSTAVO OSPINA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de cámaras de inspección y sumideros para red pluvial barrio El Carmen



Instalación de tubería para red sanitaria barrio Prado Norte – Bajo Cañaveral

ALCANCE

- Control de inundaciones, optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario:
- Barrio el Carmen
 - Barrio Bajo Cañaveral y Prado Norte.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA

Valor total del proyecto

\$ 2.485.717.595

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 13 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 19 – JUL – 2021
Fecha de finalización : 18 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 vías** en **2** sectores

Estado Actual:
Se realizó socialización el **04/08/2021** en el sector de Piñayaco, se adelantó actas de vecindad del barrio Piñayaco, pendiente por parte de la Secretaría de Tránsito aprobación de PMT.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-399-2021 Valor: \$ 2.320.900.325	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 164.817.270
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOMADAS PUTUMAYO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mococa	



Socialización con la comunidad del proyecto barrio Piñayaco

 **45.589**
Personas beneficiadas



 **ALCANCE**

- Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:
- Barrio Piñayaco Z4 - 2ª.
 - Barrio Piñayaco Z4 - 2B.
 - Barrio Piñayaco Z4 – 3.
 - Barrio Piñayaco Z4 – 4.
 - Barrio Peñón Z5 – 1.
 - Barrio Peñón Z5 - 2B.
 - Barrio Peñón Z5 – 3.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.089.926.762

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
 Fecha de suscripción: 19 – MAR – 2021
 Fecha acta de inicio: 27 – ABR – 2021
 Fecha de finalización actualizada: 26 - OCT – 2021



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación 6 VÍAS en 1 SECTOR

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 10
 Total Projectado: 25

**Local 8
 80%**

**Foráneo 2
 20%**

Calificados 3
38%

No Calificados 5
62%

Calificados 2
100%

No Calificados 0
0%


Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-407-2021
 Valor: \$ 1.017.658.395

Nombre del Contratista:
 ALEX ALBERTO CALVACHE
 MENA

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 72.268.367

Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER
 5HG

Supervisor UNGRD
 Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

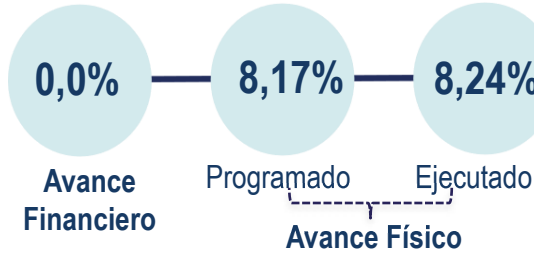

45.589
 Personas beneficiadas

Se realizó reprogramación y plan de contingencia



Instalación de geotextil y pedraplén

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio El Dorado Z4-14
- Barrio El Dorado Z4-15
- Barrio El Dorado Z4-16
- Barrio El Dorado Z4-17
- Barrio El Dorado Z4-18
- Barrio El Dorado Z4-19

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 3.025.192.404

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 07 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 06 – JUL - 2021
Fecha de finalización actualizada: 05 - ENE - 2022




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **7 VÍAS** en **2 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 11 Total Projectado: 25	Local 11 100%	Calificados 7 63%
		No Calificados 4 37%
	Foráneo 0 0%	Calificados 0 0%
		No Calificados 0 0%

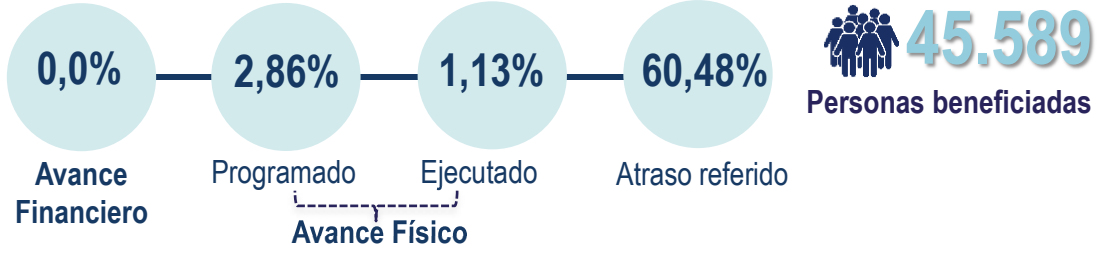

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-492-2021 Valor: \$ 2.824.604.874	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 200.587.530
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS DE MOCOA	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Cajeo de vía, instalación de geotextil y pedraplén

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Condominio Norte Z5-30.

- Condominio Norte Z5-31.
- Barrio Villa Diana Tramo I.
- Barrio Villa Diana Tramo IV.
- Barrio Villa Diana Tramo V.
- Barrio Villa Diana Tramo VI.
- Barrio Villa Diana Tramo IX.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA


Valor total del proyecto

\$ 1.291.868.311

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SEIS (6) MESES
 Fecha de suscripción: 24 – MAR - 2021
 Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021
 Fecha de finalización actualizada por suspensión: 18 - NOV - 2021




TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de 1 vía

PERSONAL EN OBRA Total Obra: 15 Total Projectado: 25	Local 14 93%	Calificados 6 43%
		No Calificados 8 57%
	Foráneo 1 7%	Calificados 1 100%
		No Calificados 0 0%

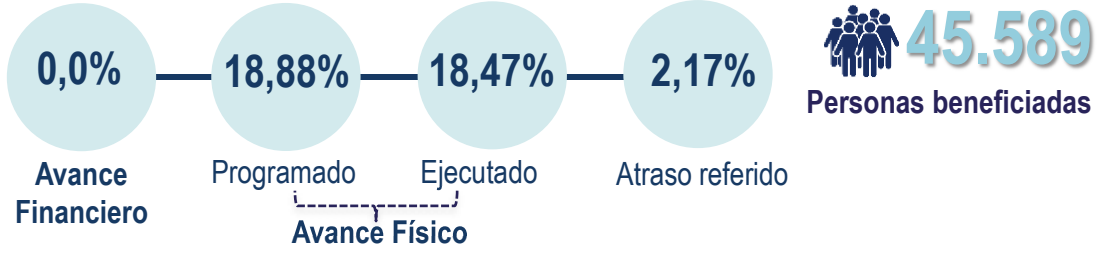

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-518-2021 Valor: \$ 1.206.210.066	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 85.658.245
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL CAIMARON	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Construcción cámara de inspección y sumideros para red pluvial



Instalación de tubería para red de alcantarillado pluvial

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Urbanización Villa Caimarón CII 15 y sector de Quinta Paredes entre Cra 13 y Cra 17.

ALCANCE

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 2.887.755.648

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 08 – ABR - 2021

Fecha acta de inicio: 19 – ABR - 2021

Fecha de finalización actualizada: 18 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación **8 VÍAS** en **3 SECTORES**

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 8
Total Projectado: 25

Local 7
83%

Foráneo 1
17%

Calificados 3

43%

No Calificados 4

57%

Calificados 1

100%

No Calificados 0

0%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-554-2021
Valor: \$ 2.696.280.960


Nombre del Contratista:
CONSORCIO ORC 2020

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-551-2021
Valor: \$ 191.474.688

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD

Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

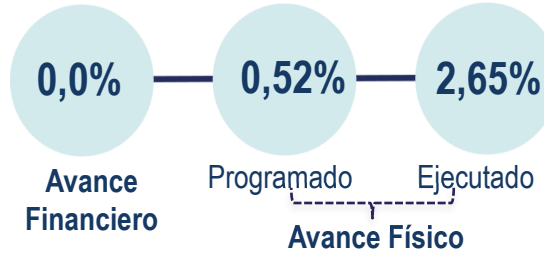

45.589
Personas beneficiadas

Se realizó reprogramación y plan de contingencia



Instalación de tubería para red pluvial



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Barrio Villa Daniela Z4 – 7A.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 7B.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 8.
- Barrio Villa Daniela Z4 – 10.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-27.
- Barrio Jardines de Babilonia Z5-28.
- Urbanización Caimarón Cra 14 entre CII 11 Y CII 12.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$1.342.679.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de suscripción: 19 – ABR - 2021
Fecha acta de inicio: 26 – ABR - 2021
Fecha de finalización actualizada por suspensión:
09 - ENE - 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de 1 vía

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 11

Total Projectado: 25

Local 11
100%


Foráneo 0
0%

Calificados 7
64%

No Calificados 4
36%

Calificados 0
0%

No Calificados 0
0%

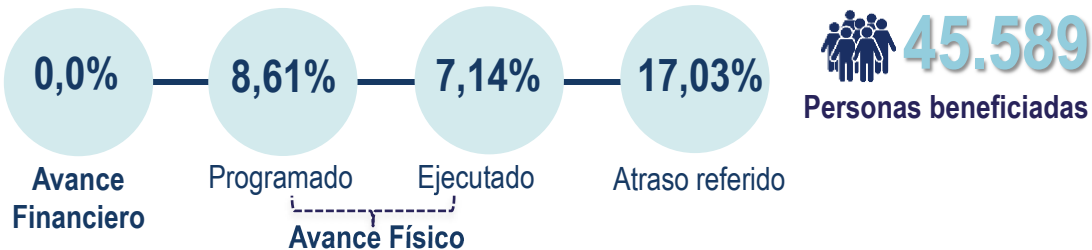

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-636-2021 Valor: \$ 1.253.593.696	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-551-2021 Valor: \$ 89.085.329
Nombre del Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER 5HG
Supervisor UNGRD Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa	



Construcción de cámaras para red pluvial



ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico en los siguientes sectores:

- Anillo Vial Miraflores - La Loma

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR – MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 4.764.101.025

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 10 – MAY – 2021
Fecha acta de inicio: 08 – JUL – 2021
Fecha de Finalización: 07 – MAR -2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **4 SECTORES** intervenciones de vías urbanas.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 30
Total Projectado: 37

Local: 27
90%

Foráneo: 3
10%

Calificados: 15

56%

No Calificados 12

44%

Calificados: 3

100%

No Calificados 0

0%



45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-532-2021
Valor: \$ 4.268.718.305

Nombre del Contratista:
CONSORCIO PAVIMENTOS
MOCOA

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-774-2021
Valor: \$ 495.382.720

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO
INTERPAVIMENTOS EDUPAC

Supervisor UNGRD
Ing. Brenda Karin Peña - Reconstrucción Mocoa



Instalación de alcantarillado Pluvial – Relleno con material seleccionado y Espacio para construcción de Cámara- Barrio Quinta Paredes



Cajeo sector Ciudadela Deportiva



ALCANCE

Ciudadela deportiva entre Cll 12 y Cra 7, y Cra 6 entre Cll 4 barrio Jose Homero y Cll 7 sur urbanización Villa de Leiva 11a y Cll 2 sur entre Cra 2 colinas del sur y Cra 8.

ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
 MUNICIPIO DE MOCOA**

Valor total del proyecto

\$ 1.960.337.973

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra

Plazo: CINCO (5) MESES
 Fecha de suscripción: 29 – ABR – 2021
 Fecha acta de inicio: 06 – JUL – 2021
 Fecha de finalización: 05 – ENE – 2022



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Pavimentación de 1 vía

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 11
 Total Projectado: 25

Local 11
100%


Foráneo 0
0%

Calificados 6
55%

No Calificados 5
45%

Calificados 0
0%

No Calificados 0
0%



45.589
 Personas beneficiadas

Contrato de Obra
 No. 9677-PPAL001-549-2021
 Valor: \$1.830.025.649
 Nombre del Contratista:
 CONSORCIO PAVIMENTOS
 MOAC CONSTRUCCIONES

Contrato de Interventoría
 No. 9677-PPAL001-551-2021
 Valor: \$ 130.312.324
 (Para este contrato)
 Nombre de la Interventoría:
 CONSORCIO INTER 5HG

Supervisor UNGRD
 Ing. Eliana Montes Peña – Reconstrucción Mocoa

ALCANCE

Mejoramiento de las vías urbanas mediante construcción de placa huella:

- Cruce vía nacional Mocoa – Pitalito entrada a vereda Nueva Esperanza



**Limpieza de vía y
 conformación de subrasante**

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 1.365.747.660

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: OCHO (8) MESES
Fecha de suscripción: 18 – JUN - 2021
Fecha acta de inicio: 21 – JUL - 2021
Fecha de finalización: 20 - MAR - 2022

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Interventoría adelanta la revisión de los PMT, PMA, PGS y protocolos de bioseguridad previo al inicio físico de obra. Se realiza reunión informativa del proyecto el **06/08/2021** con la comunidad beneficiaria.



Reunión de información a la comunidad beneficiaria del proyecto

45.589
Personas beneficiadas

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-550-2021
Valor: \$ 1.282.799.166

Nombre del Contratista:
DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-969-2021
Valor: \$ 82.948.494
(Para este contrato)

Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTORIA
PAVIMENTOS 063

Supervisor UNGRD
Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa



ALCANCE

Barrio Chiparos, Zona comprendida en la z5-34a-34b CII barrio la reserva entre vía a Pitalito y límite de zona 5 (a)



ACTORES E INVERSIÓN

**FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOCA**

Valor total del proyecto

\$ 6.644.038.095,94

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Interventoría - Obra



Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 15 – JUN - 2021

Fecha acta de inicio: No cuenta aún con fecha de acta.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

En la revisión de estudios, diseños y presupuesto se determina que el tramo a intervenir no cuenta con alcantarillado sanitario por lo que se adelanta la búsqueda de recursos adicionales.

A fecha todavía no está definido la fuente de financiación de los recursos adicionales ni quien lo ejecutará.


Pendiente el perfeccionamiento del contrato.



Estado inicial de la vía a intervenir

45.589

Personas beneficiadas

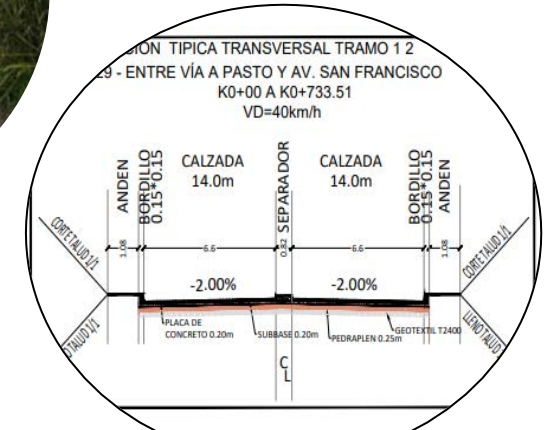

Sección transversal de la estructura de pavimento

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-900-2021 Valor: \$ 6.240.520.933	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-969-2021 Valor: \$ 403.517.162,94
Nombre del Contratista: CONSORCIO VIAS 897	Nombre de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS 063
Supervisor UNGRD Natalia Cárdenas – Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- CII 29 entre vía Pitalito y variante San Francisco

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD – SGR –
MUNICIPIO DE MOCOA

Valor total del proyecto

\$ 2.435.104.449

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD: Obra e interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: 10 – MAY - 2021

Fecha acta de inicio: Modificación de pólizas



TIPO DE INTERVENCIÓN

Mejoramiento de Vías Urbanas

IMPACTO

Este contrato desarrollará **1 SECTOR** intervenciones de vías urbanas.

Estado Actual:

Modificación de pólizas teniendo en cuenta observaciones de Fiduprevisora.



45.589
Personas beneficiadas



Sector a Pavimentar Quinta de las colinas.

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1113-2021 Valor: \$ 2.435.104.449 ----- Nombre del Contratista: MEGACONSTRUCCIONES S.A.S	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-774-2021 Valor: \$ 495.382.720 ----- Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC
Supervisor UNGRD Brenda Karin Peña– Reconstrucción Mocoa	



ALCANCE

- Vía urbana mediante la pavimentación en concreto hidráulico en la urbanización Quintas de la Colina.

2.

SEGUIMIENTO VIVIENDA URBANA Y RURAL

VIVIENDA URBANA SAUCES II

CONTRATOS DE OBRA SAUCES II



TOTAL VIVIENDAS

1.209



VIVIENDAS ENTREGADAS SAUCES I

300

No. viviendas



436

Contratista

CONSORCIO MOCOA 2019

Valor

\$25.732 millones



473

CONSORCIO MOCOA 2019

\$27.915 millones



909

VALOR TOTAL

\$53.647 millones

total de
viviendas

*Avance

Avance financiero



30,17%



0%



30,07%



5%

Estudios y diseños 99.20%, Movimiento de tierras 88 terrazas listas. Interventoría aprobó Plan de Choque 243; Contrato 244 con observaciones. Llegaron a obra 33 toneladas de acero para primeras 72 viviendas. 3 cuadrillas de movimientos de tierras. Citación a Contratista posible incumplimiento fase I.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

HMV ingenieros LTDA

Valor

\$7.049.420.065

Avance financiero

20,05%

CRONOGRAMA

FECHA DE
TERMINACIÓN



DIC 2021



JUL 2022

TOTAL

VIVIENDAS PARA ENTREGAR



390



519

909

PERSONAL
PROYECTADO



82

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Continúa movimiento de tierras 20.664,16 m3 de tierra (incluido expansión).
- Realizada visita interinstitucional al predio SAUCES 2 Minvivienda-UNGRD-Alcaldía-Consorcio-Interventoría, revisión informe emitido por CORPOAMAZÓNÍA.
- Llegada a la obra tubería de alcantarillado fluvial y sanitario para primera fase constructiva y 33 toneladas de acero.
- Terraceo primera fase constructiva. 88 lotes listos para iniciar construcción de vivienda (Cimentación)
- Continúa actividad de obra aprovechamiento forestal para traslado de la línea eléctrica.
- Se recibieron en obra 3 visitas de Contraloría.

Personal	Local	Foráneo	Total
Calificado	5	2	7
No calificado	22	0	12
Total	27	2	29





N° DE
VIVIENDAS



87

Aportes de
FONVIVIENDA



5.764 millones

Valor otorgado por FONVIVIENDA
a través del Convenio No. 9677-
PPAL001-783-2018



AVANCES

- Proceso precontractual: En definición de los insumos técnicos, jurídicos y financieros.

AVANCES

VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO



VIVIENDA RURAL NUCLEADA



\$9.516.549.300 En convenio con **Banco**
\$15.436.450.700 Recursos faltantes

- **Mocoa Disperso:** Se da inicio a la segunda fase de publicación del proceso en el SECOB, se radica el **28/07/2021** en la oficina de gestión contractual el documento técnico ajustado según observación para su publicación en la plataforma de SECOB; una vez se obtenido el link, se dará a conocer para el respectivo seguimiento.

- **Mocoa Nucleada:** De los 216 hogares postulados potenciales para el proyecto de vivienda rural nucleada en la vereda las Planadas de Mocoa, se ha tramitado la documentación del 97% de los potenciales (209 familias) para revisión y validación por parte del **Banco Agrario de Colombia**. (*) y únicamente se encuentra pendiente por parte de la **Alcaldía de Mocoa** la documentación de 7 familias (representan el 3% del total de potenciales), que corresponde a 5 familias de la comunidad Musumurrinakuna que no están de acuerdo en firmar el Formulario No. 7, por cuanto las viviendas no se construirán en el predio que les fue otorgado por la **ANT** ubicado en la vereda el Pepino, y 2 familias que se encuentran en proceso de sustitución.

En cuanto a la subsanación por parte de **SPIA**, no se presentan actuaciones.

En cuanto al proceso de parcelación ya se cuenta con la escritura firmada, posterior a esto se debe registrar la escritura pública en la oficina de instrumentos públicos, para que cada lote salga con la respectiva matrícula inmobiliaria, este proceso dura 5 días. Una vez su surta el mismo, ya se puede realizar la cesión a título gratuito del predio a cada propietario y hacer el tramite de registro.

3.

SEGUIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$11.194 millones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Asistencia técnica

Inversión total del proyecto

\$ 11.194 millones

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría y supervisión

Plazo: VEINTICINCO (25) MESES

Fecha de suscripción: 25 - ABR - 2018

Fecha acta de inicio: 13 - NOV - 2018

Fecha de finalización: 01 - NOV - 2021 (Según trámite de prórroga).



TIPO DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN de infraestructura educativa.

IMPACTO

24 aulas para **960** alumnos 

Estado Actual:

El proyecto ya cuenta con la estructura de concreto de todos los bloques lo que significa una avance del 100%. La estructura metálica de cubierta está instalada al 90%, Las tejas están adquiridas al 100%, puesto que se logró conseguir lo que estaba faltando, esta debe estar llegado a la obra el **18/08/21** para iniciar montaje. Primaria y bachillerato ya cuentan casi al 100% la ventanería, se terminará el próximo lunes. Para la conexión de aguas lluvias se hará entrega de pozo provisional y Aguas Mocoa entregará la conexión definitiva al término de la construcción de los 60m faltantes.

PERSONAL EN OBRA

Total Obra: 52

Local 35
67%

Foráneo 17
33%

Calificados 20
57%

No Calificados 15
43%

Calificados 14
82%

No Calificados 3
18%

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-225-2018
Valor: \$ 10.462.078.032,00

Nombre del Contratista:
Consortio Colegio Mocoa

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-228-2018
Valor: \$732.329.530,00

Nombre de la Interventoría:
INGEVAL S.A.S.

Supervisor UNGRD

Yineth Arinda Cumpido Botello –
Subdirección para la Reducción del Riesgo

10%

Avance
Financiero

82,46%

Programado

77%

Ejecutado

Avance Físico



PROYECTO PLAZA DE MERCADO

INVERSIÓN
\$6.000.000.000

*Provenientes del convenio No. 9677-PPAL001-812-2017 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social para la construcción de la galería y módulos complementarios.




PLAZA DE MERCADO

PERSONAL PROYECTADO: 56



AVANCES

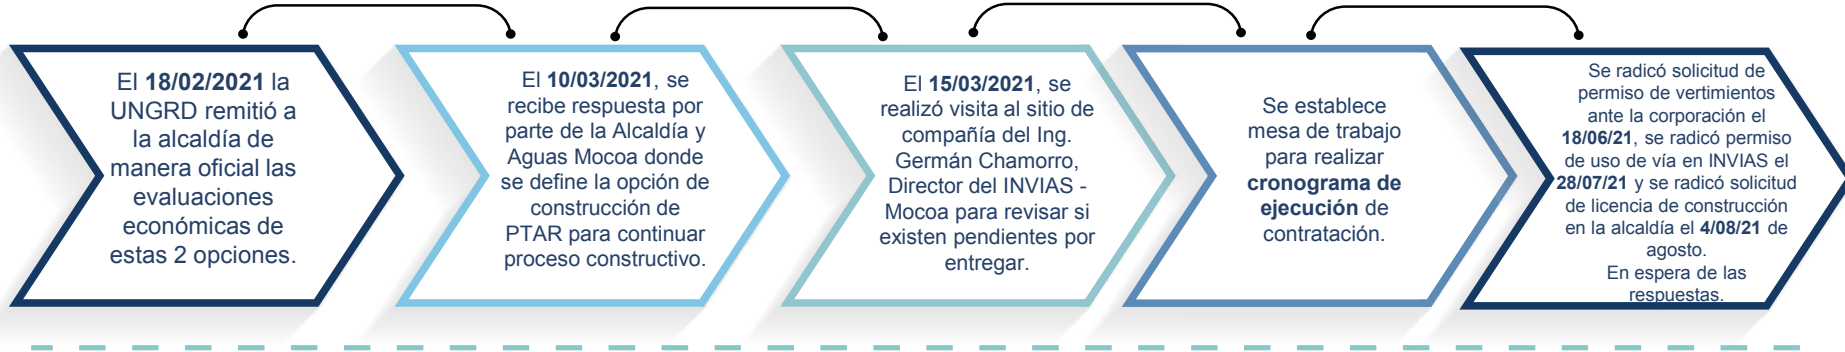

CRONOGRAMA



COMPRA DE PREDIO REUBICACIÓN CENTRO PENITENCIARIO

AVANCES



INVERSIÓN

\$ 1.310.921.000* lote

\$ 80.000.000.000,00 Construcción

* Estos recursos serán gestionados por el **FNGRD** para su adquisición.



RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MOCOCA

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - PUTUMAYO

ETAPA

1

ALCANCE

- Construcción bocatoma de fondo de 300 l/s en concreto de 4000PSI.
- Construcción de desarenador de alta tasa de 104 l/s y optimización existente.
- Construcción PTAP convencional de 107 l/s.
- Tratamiento de lodos de 215 l/s.
- Optimización PTAP existente 107 l/s .
- Construcción de 2 tanques de almacenamiento de 927 m3 y 1.533 m3.
- Suministro e instalación de 16.811 m de tuberías de conducción.
- Suministro e instalación de 12.960 m de tuberías de distribución.
- Suministro e Instalación de 6.104 medidores.

CONTRATISTA	Mario Germán García García
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
CONSULTOR	CDM Smith
FECHA DE INICIO	27-JUN-2017
FECHA FINALIZACIÓN	17-OCT-2020
% AVANCE EJECUTADO	94%
VALOR EJECUTADO	\$22.280.368.732,12



ALCANCE

- Optimización de la planta de tratamiento existente.
- Optimización de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto cemento en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
- Se instalarán micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4". las cuales incluyen cajilla y medidor y suministro e instalación de medidores con cajilla.
- Se realizarán las obras civiles necesarias para realizar la interconexión de las redes existentes con las nuevas redes que permitan prestar el servicio.

ETAPA

2

CONTRATISTA	Aguas Mocoa S.A. E.S.P
INTERVENTOR	Edgar Uribe y CIA S.A.S – EUCO S.A.S
VALOR CONTRATO OBRA	\$2.954.350.397
FECHA INICIO	22-JUN-2021
FECHA FINALIZACIÓN	22-NOV-2021
% PROGRAMADO ETAPA I Y II	7,5%
% EJECUTADO ETAPA I Y II	7,2%
ESTADO	Proyecto en ejecución. Se adelantan actividades de cambio de tubería de asbesto cemento a PVC y empalmes en redes de distribución del proyecto.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

4.

GENERACIÓN DE EMPLEO

GENERACIÓN DE EMPLEO



CONTRATOS EN EJECUCIÓN

57



EMPLEO GENERADO A LA FECHA

582



PERSONAL PROYECTADO

1.029

	28/07/21	11/08/21		28/07/21	11/08/21
MANO DE OBRA LOCAL	367	419	MANO DE OBRA FORÁNEA	144	163
CALIFICADOS	202	223	CALIFICADOS	115	135
NO CALIFICADOS	165	196	NO CALIFICADOS	29	28
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	72%	72%	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	28%	28%

	ACTUALES	PROYECTADOS TOTAL
EMPLEOS INDIRECTOS	1.048	1.852
EMPLEOS INDUCIDOS	233	412
TOTAL EMPLEOS	1.281	2.264

GRACIAS
